


HABILITACION DEPOSITO REGULADOR ACERO VITRIFICADO STAND PIPE 500 M3 EL PESCOZON (INSTALACION ENTRADA, REBOSE, DESAGUE, SALIDA Y BY-PASS)

ID	Task Mod	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	2020			
						Dec	Jan	Feb	Mar
1		HABILITACION DEPOSITO REGULADOR ACERO VITRIFICADO STAND PIPE 500 M3 EL PESCOZON	34 days	Mon 13/01/20	Fri 28/02/20				
2		INICIO	0 days	Mon 13/01/20	Mon 13/01/20				
3		VALLA ANUNCIANDO LA OBRA	1 day	Mon 13/01/20	Mon 13/01/20				
4		CAMPAMENTO	1 day	Tue 14/01/20	Tue 14/01/20				
5		ENTRADA REBOSE SALIDA Y BY-PASS	12 days	Wed 15/01/20	Thu 30/01/20				
6		MOVIMIENTO DE TIERRA	5 days	Fri 31/01/20	Thu 06/02/20				
7		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS	8 days	Fri 07/02/20	Tue 18/02/20				
8		VERJA MALLA CICLONICA	4 days	Wed 19/02/20	Mon 24/02/20				
9		VARIOS	3 days	Tue 25/02/20	Thu 27/02/20				
10		FIN	0 days	Fri 28/02/20	Fri 28/02/20				

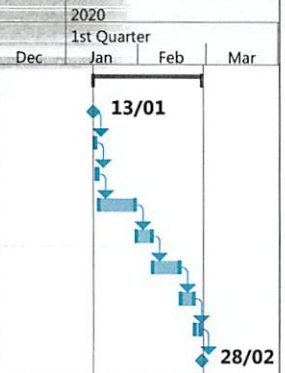

Proyecto: HABILITACION DEPO
 Fecha: Fri 08/11/19

Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual	solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas			
