


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2020				2021				2022				2023	
						T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1		HABILITACION DEPOSITO REGULADOR ACERO VITRIFICADO STAND PIPE 785 días 500 M3 EL PEZCOZON ( INSTALACION ENTRADA, REBOSE, DESAGUE, SALIDA Y BY-PASS), PROVINCIA DUARTE , ZONA III, LOTE VIII.		lun 12/2/19	vie 12/2/22														
2	✈	INICIO	0 días	lun 12/2/19	lun 12/2/19														
3		VALLA ANUNCIANDO LA OBRA 10"x16"IMPRESION FULL COLOR	1 día	lun 12/2/19	lun 12/2/19														
4		INSTALACIONES DEPOSITO VITRIFICADO DE 500 M3 ELEVADO A 13 M	714 días	lun 12/9/19	jue 9/1/22														
5		ENTRADA REBOSE SALIDA Y BY-PASS	35 días	lun 12/9/19	vie 1/24/20														
6		MOVIMIENTO DE TIERRA	200 días	lun 1/27/20	lun 4/11/22														
7		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS	75 días	mar 4/12/22	lun 7/25/22														
8		REMOCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	8 días	mar 7/26/22	jue 8/4/22														
9		DESAGUE EN TUBERIA DE Ø 6" PVC SDR-26 EXISTENTE	20 días	vie 8/5/22	jue 9/1/22														
10		REPARACION DE AVERÍAS	25 días	vie 9/2/22	jue 10/6/22														
11		PUERTA DE MALLA CICLONICA (4 M)	1 día	vie 10/7/22	vie 10/7/22														
12		ACERA PERIMETRAL 0.80 M	5 días	lun 10/10/22	vie 10/14/22														
13		LOGOS Y LETREROS	3 días	lun 10/17/22	mié 10/19/22														
14		CASETA PARA MATERIALES	784 días	mar 12/3/19	vie 12/2/22														
15		GRAVILLA PARA EMBELLECIMIENTO	4 días	jue 10/20/22	mar 10/25/22														
16		LIMPIEZA FINAL	5 días	mié 10/26/22	mar 11/1/22														
17		FIN	0 días	vie 12/2/22	vie 12/2/22														

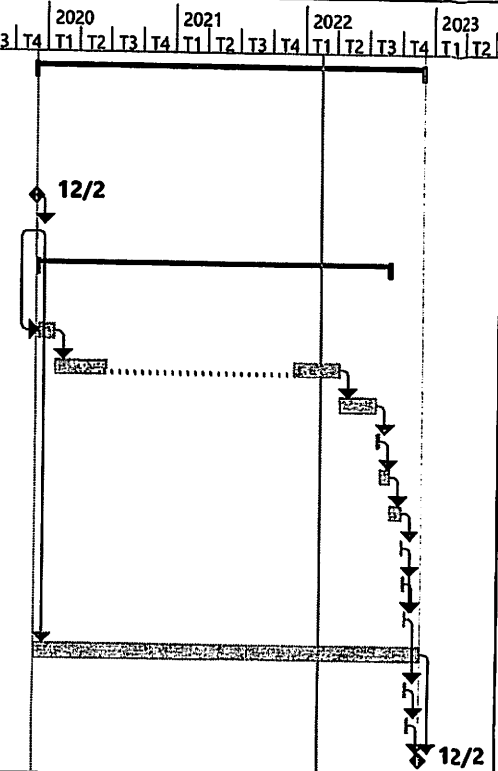

Proyecto: CRONOGRAMA EL PE Fecha: vie 2/18/22	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			
