


Task Name	Duración	Comienzo	Fin	junio		julio			agosto			
				M	F	P	M	F	P	M	F	
1 ELECTRIFICACION PRIMARIA	59 días	lun 5/30/16	jue 8/18/16									
2 Poste HA Pretensado 4C	25 días	lun 6/6/16	vie 7/8/16									
3 Estructura MT 301	13 días	lun 7/11/16	mié 7/27/16									
4 Estructura MT 302	11 días	lun 7/11/16	lun 7/25/16									
5 Estructura MT 305	12 días	lun 7/11/16	mar 7/26/16									
6 Estructura MT 307	9 días	lun 7/11/16	jue 7/21/16									
7 Estructura MT 316	7 días	lun 7/11/16	mar 7/19/16									
8 Estructura HA-100B	15 días	lun 7/11/16	vie 7/29/16									
9 Aterrizaje Completo (PR)	5 días	lun 8/1/16	vie 8/5/16									
10 Alambre AAC No. 4/0	9 días	lun 8/1/16	jue 8/11/16									
11 Alambre AAC No. 2/0	11 días	lun 8/1/16	lun 8/15/16									
12 Alambre AAC No. 1/0	14 días	lun 8/1/16	jue 8/18/16									
13 Desmantelamiento de L	7 días	mié 6/15/16	jue 6/23/16									
14 Hoyo para Postes	12 días	lun 5/30/16	mar 6/14/16									
15 Hoyo para Vientos	9 días	lun 6/13/16	jue 6/23/16									
16 Instalacion de Postes	25 días	lun 6/6/16	vie 7/8/16									
17 Cimentacion de Postes	8 días	lun 6/6/16	mié 6/15/16									
18 Mano de Obra	15 días	lun 7/11/16	vie 7/29/16									
19 Gastos Indirectos	59 días	lun 5/30/16	jue 8/18/16									
20 Imprevistos	59 días	lun 5/30/16	jue 8/18/16									

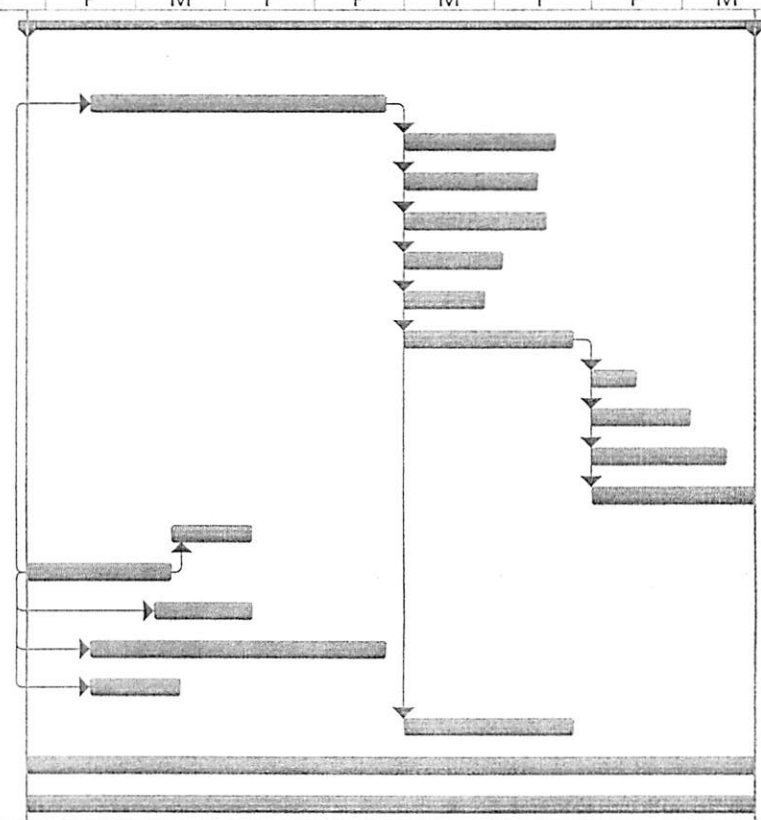

Handwritten signature or initials in blue ink.
