


MEJORAMIENTO ACUEDUCTO MULTIPLE LIMONAL, LA VEREDA BANI


ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	2020									
						Dec	1st Quarter Jan	Feb	Mar	2nd Quarter Apr	May	Jun	3rd Quarter Jul		
1	→	MEJORAMIENTO ACUEDUCTO MULTIPLE LIMONAL, LA VEREDA BANI	106.88 days	Mon 13/01/20	Tue 09/06/20										
2	★	INICIO	1 day	Mon 13/01/20	Mon 13/01/20										
3	→	CAMPAMENTO	1 day	Mon 13/01/20	Tue 14/01/20										
4	→	VALLA ANUNCIANDO LA OBRA	1 day	Tue 14/01/20	Wed 15/01/20										
5	→	EMPALME EN TUBERIA Ø16" EXISTENTE	18 days	Wed 15/01/20	Mon 10/02/20										
6	→	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO A ESTACION RELEVO (BOMBEO EN LINEA)	25 days	Wed 15/01/20	Wed 19/02/20										
7	→	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZO No 4	26 days	Wed 19/02/20	Thu 26/03/20										
8	→	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZO No 5	26 days	Thu 26/03/20	Fri 01/05/20										
9	→	CASETA DE BOMBEO Y GARITA DE OPERADOR	15 days	Fri 01/05/20	Fri 22/05/20										
10	→	LINEA DE IMPULSION	12 days	Fri 22/05/20	Tue 09/06/20										
11	→	FIN	0 days	Tue 09/06/20	Tue 09/06/20										◆ 09/06

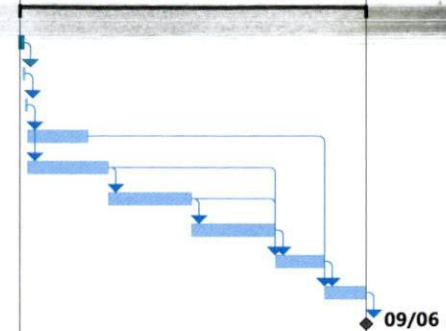

Proyecto: MEJORAMIENTO ACU Fecha: Fri 08/11/19	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo	◆
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite	↓
	Hito	◆	Resumen inactivo	solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual	solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas			

AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO MULTIPLE LIMONAL LA VEREDA, ACUEDUCTO RIO ARRIBA

ID	Task Mod	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	2020					
						er Dec	1st Quarter Jan	Feb	Mar	2nd Quarter Apr	May
1	→	AMP. RED DE DIST. AC. MULT. LIMONAL LA VEREDA, AC. RIO ARRIBA	78 days	Mon 13/01/20	Wed 29/04/20						
2	★	INICIO	0 days	Mon 13/01/20	Mon 13/01/20						
3	→	CAMPAMENTO	1 day	Mon 13/01/20	Mon 13/01/20						
4	→	VALLA ANUNCIANDO LA OBRA	1 day	Tue 14/01/20	Tue 14/01/20						
5	→	EMPALME EN TUBERIA Ø8" EXIST. EN SALIDA DEP. REG. DEL AC. LIMONAL-LA VEREDA	30 days	Wed 15/01/20	Tue 25/02/20						
6	→	AMPLIACION DE LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION	35 days	Wed 26/02/20	Tue 14/04/20						
7	→	ACONDICIONAMIENTO DE UNIDADES EXISTENTES DE ESTACION DE BOMBEO	11 days	Wed 15/04/20	Wed 29/04/20						
8	→	FIN	0 days	Wed 29/04/20	Wed 29/04/20						

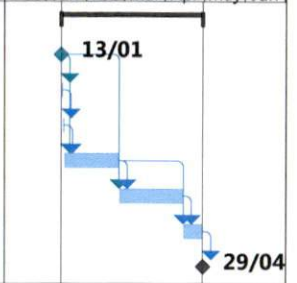

Proyecto: AMPLIACION RED DE Fecha: Fri 08/11/19	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			
