




















Proyecto: monte plata los solar Fecha: jue 25/5/23	Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duracion	solo el comienzo	Hito externo	Progreso manual
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha limite		
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso		

[Handwritten signature]

Proyecto: monte plata los solar
 Fecha: jue 25/5/23

Tarea	 Resumen	 Hitos inactivo	 solo duración	 solo el comienzo	[Hito externo		Progreso manual	
División	 Resumen del proyecto	 Resumen inactivo	 Informe de resumen manual	 solo fin]	Fecha límite			
Hito	 Tarea inactiva	 Tarea manual	 Resumen manual	 Tareas externas		Progreso			

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 febrero 2023 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 marzo 2023 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 abril 2023 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 mayo 2023 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18


◆ 29/1

[Handwritten signature]

Proyecto: monte plata los solar
Fecha: jue 25/5/23


Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Progreso manual
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso	

[Handwritten signature]

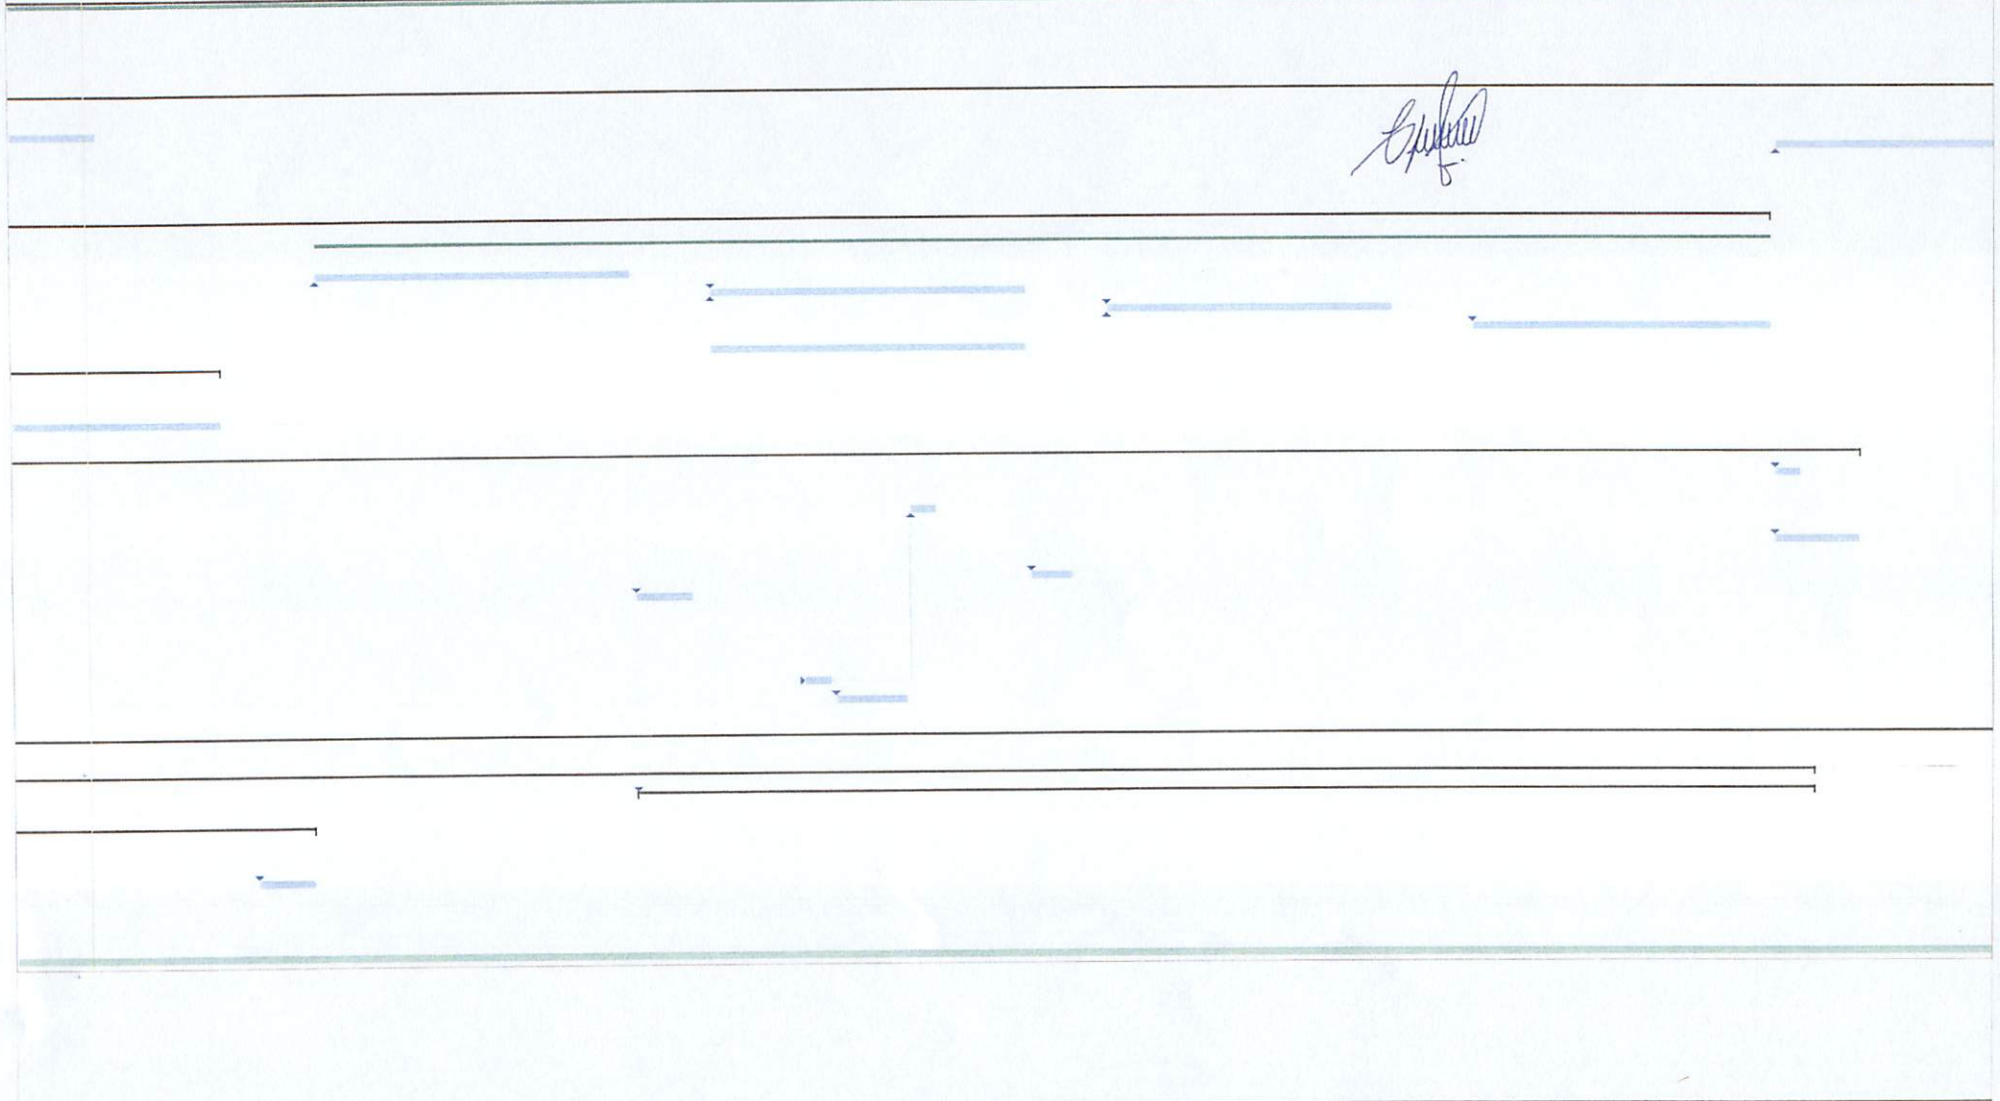

Proyecto: monte plata los solar Fecha: jue 25/5/23	Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Progreso manual
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite		
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso		

[Handwritten signature]



Proyecto: monte plata los solar Fecha: jue 25/5/23	Tarea División Hito	Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva	Hito inactivo Resumen inactivo Tarea manual	solo duración Informe de resumen manual Resumen manual	solo el comienzo solo fin Tareas externas	Hitos externos Fecha límite Progreso	Progreso manual
---	---------------------------	---	---	--	---	--	-----------------

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	
1	OBRA DE TOMA Y ESTACION BOMBEO GUANUMA	1016.88 días	mar 16/11/21	jue 30/1/25	91%	
2	PRELIMINARES	620.63 días	mar 16/11/21	mié 8/11/23	100%	
36	CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA Y ESTACION DE BOMBEO	752.25 días	vie 23/9/22	jue 30/1/25	86%	
37	OBRA DE TOMA Y DIQUE	735.25 días	vie 23/9/22	lun 13/1/25	97%	
61	FIN DE OBRA TOMA Y DIQUE	0 días	lun 13/1/25	lun 13/1/25	0%	13/1
62	TOMA LATERAL Y CANAL DE CAPTACION	282.88 días	sáb 3/12/22	lun 30/10/23	100%	
70	FIN TOMA LATERAL Y CANA DEL CAPTACION	0 días	vie 3/1/25	vie 3/1/25	0%	3/1
71	EDIFICACIONES	542.75 días	mar 30/5/23	jue 30/1/25	71%	
78	FIN EDIFICACIONES	0 días	jue 30/1/25	jue 30/1/25	0%	30/1
79	ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO	457.05 días	mié 30/8/23	lun 27/1/25	51%	
86	FIN ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO	0 días	lun 27/1/25	lun 27/1/25	0%	27/1
87	CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL	30 días	mié 11/10/23	mié 29/1/25	27%	
88	FIN DE CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA Y ESTACION DE BOMBEO	0 días	jue 30/1/25	jue 30/1/25	0%	30/1



Proyecto: Cronograma OT EB G Fecha: mar 28/11/23	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Hito de línea base	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite		Resumen de línea base	
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas		Progreso	
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Línea base			

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Semestre 1, 2022			Semestre 2, 2022			Semestre 1, 2023			Semestre 2, 2023			Semestre 1, 2024			Semestre 2, 2024			Semestre 1, 2025					
					D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N
1	REHABILITACIÓN ACUEDUCTO GUANUMA-LOS BOTADOS	918.38 días	mar 25/1/22	vie 6/12/24																								
2	PRELIMINARES	872.38 días	mar 25/1/22	jue 17/10/24																								
3	Recepción del anticipo	1.13 días	mar 25/1/22	mar 25/1/22																								
4	Firma de acta de Inicio	1.13 días	mar 8/2/22	mar 8/2/22																								
5	Otros	29 días	mar 31/5/22	vie 1/7/22																								
8	INICIO DE LA OBRA	0 días	vie 8/7/22	vie 8/7/22																								
9	MOVILIZACION	37.13 días	vie 8/7/22	jue 18/8/22																								
10	PRESENTACIONES AL INGENIERO SUPERVISOR (SUBMITTALS)	538.5 días	mar 14/2/23	mié 16/10/24																								
22	PROCURAS CLAVE	489.13 días	vie 14/4/23	jue 17/10/24																								
34	TRABAJOS CONTRACTUALES	749.63 días	vie 8/7/22	lun 11/11/24																								
35	PRELIMINARES	53.88 días	vie 8/7/22	mar 6/9/22																								
38	PLANTA DE TRATAMIENTO	608.13 días	mar 13/12/22	lun 11/11/24																								
39	Movimiento de Tierra y Replanteos	18.63 días	mar 13/12/22	mié 11/1/23																								
40	OBRAS CIVILES	578.75 días	mié 14/12/22	jue 10/10/24																								
41	PLANTA	578 días	mié 14/12/22	mié 9/10/24																								
48	CASA DE QUIMICOS	441.13 días	mié 31/5/23	jue 10/10/24																								
55	CASETA DE BOMBAS	346.75 días	vie 6/1/23	mar 13/2/24																								
62	CASETA DE GENERADOR	22.63 días	mar 2/5/23	jue 25/5/23																								
64	CASETA DE CLORO	271.25 días	mar 4/4/23	mar 13/2/24																								
69	CASA DEL OPERADOR	298.5 días	sáb 28/1/23	jue 11/1/24																								
77	FIN DE OBRAS CIVILES	0 días	mar 8/10/24	mar 8/10/24																								
78	MONTAJE MECANICO	466.38 días	jue 18/5/23	jue 24/10/24																								
89	FIN MONTAJE MECANICO	0 días	jue 24/10/24	jue 24/10/24																								
90	INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTRIFICACION	394.25 días	jue 27/7/23	mar 15/10/24																								
95	FIN ELECTRIFICACION	0 días	mar 15/10/24	mar 15/10/24																								
96	PUESTA EN MARCHA	15 días	jue 24/10/24	lun 11/11/24																								
98	AREA EXTERIOR Y CUBIERTA METALICA	471.38 días	jue 18/5/23	mié 30/10/24																								
105	FIN PLANTA DE TRATAMIENTO	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24																								
106	FIN TRABAJOS CONTRACTUALES	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24																								
107	ADICIONALES	380 días	jue 5/10/23	vie 6/12/24																								
108	ILUMINACION EXTERIOR DE PLANTA	21.13 días	mar 12/12/23	vie 12/1/24																								
109	HORMIGON PROYECTADO	25 días	sáb 19/10/24	vie 15/11/24																								
110	CUBIERTA DE HORMIGON	380 días	jue 5/10/23	vie 6/12/24																								
118	TUBERIA DE BY PASS A CISTERNA (TUBERIA/VALVULAS Y REGISTROS)	20 días	mié 9/10/24	mié 30/10/24																								
119	SISTEMA DE CCTV/VIDEO VIGILANCIA	10 días	mar 15/10/24	vie 25/10/24																								

Proyecto: ACUEDUCTO GUANUMA
Fecha: jue 22/2/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Hito de línea base
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite		Resumen de línea base
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas		Progreso
Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica		Progreso manual
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Línea base		

btd
