

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesor | Semestre 2, 2019 | | | | | | | | |
|----|---------------|--|----------|-------------|-------------|------------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | A | M | J | J | A | S | O | N | |
| 16 | → | CONSTRUCCION DE LA DESCARGA | 7 días | sáb 22/6/19 | lun 1/7/19 | 15 | | | | | | | | | |
| 17 | → | ELECTRIFICACION CASETA DE BOMBEO | 3 días | lun 1/7/19 | jue 4/7/19 | 16 | | | | | | | | | |
| 18 | → | EQUIPAMIENTO POZO No. 2, LAS GUARANAS NUEVO | 18 días | jue 4/7/19 | jue 25/7/19 | | | | | | | | | | |
| 19 | → | REHABILITACION Y ELECTRIFICACION POZO | 7 días | sáb 13/7/19 | lun 22/7/19 | | | | | | | | | | |
| 20 | → | ELECTROBOMBA TIPO TURBINA VERTICAL, CAPAZ DE ENTREGAR 550 G.P.M. A 368 PIES TDH, 1800 RPM COMPLETA(BOMBA, 70 PIES DE COLUMNA+TAZONES, EJES, COUPLINGS DE COLUMNAS Y DE EJES Y CABEZAL DE DESCARGA) MOVIDA POR MOTOR ELECTRICO DE EJE HUECO VERTICAL DE 75 H.P. | 7 días | sáb 13/7/19 | lun 22/7/19 | 24CC | | | | | | | | | |
| 21 | → | MANO DE OBRA INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO | 7 días | sáb 13/7/19 | lun 22/7/19 | 24CC | | | | | | | | | |
| 22 | → | ELECTRIFICACION PRIMARIA | 7 días | jue 4/7/19 | vie 12/7/19 | 17 | | | | | | | | | |
| 23 | → | ELECTRIFICACION SECUNDARIA | 1 día | vie 12/7/19 | sáb 13/7/19 | 22 | | | | | | | | | |
| 24 | → | CONSTRUCCION DE LA DESCARGA | 7 días | sáb 13/7/19 | lun 22/7/19 | 23 | | | | | | | | | |
| 25 | → | ELECTRIFICACION CASETA DE BOMBEO | 3 días | lun 22/7/19 | jue 25/7/19 | 24 | | | | | | | | | |
| 26 | → | EQUIPAMIENTO POZO No. 6, LAS GUARANAS NUEVO | 18 días | jue 25/7/19 | jue 15/8/19 | | | | | | | | | | |
| 27 | → | REHABILITACION Y ELECTRIFICACION POZO | 7 días | sáb 3/8/19 | lun 12/8/19 | | | | | | | | | | |
| 28 | → | ELECTROBOMBA TIPO TURBINA VERTICAL, CAPAZ DE ENTREGAR 550 G.P.M. A 368 PIES TDH, 1800 RPM COMPLETA(BOMBA, 70 PIES DE COLUMNA+TAZONES, EJES, COUPLINGS DE COLUMNAS Y DE EJES Y CABEZAL DE DESCARGA) MOVIDA POR MOTOR ELECTRICO DE EJE HUECO VERTICAL DE 75 H.P. | 7 días | sáb 3/8/19 | lun 12/8/19 | 32CC | | | | | | | | | |
| 29 | → | MANO DE OBRA INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO | 7 días | sáb 3/8/19 | lun 12/8/19 | 32CC | | | | | | | | | |
| 30 | → | ELECTRIFICACION PRIMARIA | 7 días | jue 25/7/19 | vie 2/8/19 | 25 | | | | | | | | | |
| 31 | → | ELECTRIFICACION SECUNDARIA | 1 día | vie 2/8/19 | sáb 3/8/19 | 30 | | | | | | | | | |



21

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesc | Semestre 2, 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|----------|--------------|--------------|-----------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | A | M | J | J | A | S | O | N | | | | | | | | |
| 32 | → | CONSTRUCCION DE LA DESCARGA | 7 días | sáb 3/8/19 | lun 12/8/19 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | → | ELECTRIFICACION CASETA DE BOMBEO | 3 días | lun 12/8/19 | jue 15/8/19 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | → | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS EN TUBERIAS EXISTENTES | 38 días | jue 22/8/19 | lun 7/10/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | → | LÍNEA DE IMPULSIÓNØ16" PVC | 10 días | jue 22/8/19 | mar 3/9/19 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | → | LÍNEA DE IMPULSIÓNØ12" PVC | 5 días | mar 3/9/19 | lun 9/9/19 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | → | LÍNEA DE IMPULSIÓNØ8" PVC | 5 días | lun 9/9/19 | sáb 14/9/19 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | → | LÍNEA DE IMPULSIÓNØ8" PVC PARA ABASTECER CUCA, LOS LIMONES Y CAOBETE. | 3 días | sáb 14/9/19 | mié 18/9/19 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | → | CONSTRUCCION REGISTROS | 15 días | mié 18/9/19 | lun 7/10/19 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | → | VARIOS | 144 día: | lun 13/5/19 | jue 31/10/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | → | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES | 1 día | lun 14/10/19 | mar 15/10/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | → | DEMOLICION DE CONTENES Y ACERAS | 1 día | lun 14/10/19 | mar 15/10/19 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | → | REPOSICION DE CONTENES Y ACERAS | 4 días | mar 15/10/19 | sáb 19/10/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | → | ACERAS A=0.80M | 4 días | mar 15/10/19 | sáb 19/10/19 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | → | CONTENES | 4 días | mar 15/10/19 | sáb 19/10/19 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | → | ROTURA Y REPOSICION DE ASFALTO | 49 días | jue 15/8/19 | lun 14/10/19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | → | CORTE DE ASFALTO CON DISCO 6" | 4 días | jue 15/8/19 | mié 21/8/19 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | → | REMOCION DE CARPETA ASFALTICA 6" | 4 días | jue 15/8/19 | mié 21/8/19 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | → | BOTE MATERIAL ASFALTICO EXTRAIDO CON CAMION D=5 KM | 1.5 días | mié 21/8/19 | jue 22/8/19 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | → | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO D=15 KM | 1.5 días | lun 7/10/19 | mié 9/10/19 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | → | COMPACTACION MATERIAL DE BASE | 2 días | mié 9/10/19 | vie 11/10/19 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | → | REPOSICION CARPETA ASFALTICA 4" | 2 días | vie 11/10/19 | lun 14/10/19 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | → | TRANSPORTE DE ASFALTO DIST APROX. 45 KM | 2 días | vie 11/10/19 | lun 14/10/19 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | → | SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (INC. CONO PARA AVISOS, CINTA PLASTICA, LETRERO) | 1 día | vie 11/10/19 | sáb 12/10/19 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | |




22

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesc | Semestre 2, 2019 | | | | | | | | |
|----|---------------|--|----------|--------------|--------------|-----------|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | A | M | J | J | A | S | O | N | |
| 55 | → | LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA | 1 día | sáb 12/10/19 | lun 14/10/19 | 54 | | | | | | | | | |
| 56 | → | REPARACION DE AVERIAS EN TUBERIAS EXIST. | 10 días | sáb 19/10/19 | jue 31/10/19 | 45 | | | | | | | | | |
| 57 | → | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16'X 8'IMPRESIÓN FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DEL PROYECTO Y | 144 días | lun 13/5/19 | jue 31/10/19 | 60CC | | | | | | | | | |
| 58 | → | CAMPAMENTO (INC. ALQ. DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES C/BAÑO MOVIL) | 144 días | lun 13/5/19 | jue 31/10/19 | 60CC | | | | | | | | | |
| 59 | → | GASTOS INDIRECTOS | 1 día | lun 13/5/19 | mar 14/5/19 | | | | | | | | | | |
| 60 | → | AFORO Y LIMPIEZA DE POZOS | 8 días | lun 13/5/19 | mié 22/5/19 | | | | | | | | | | |
| 61 | → | POZO No.2 LAS GUARANAS VIEJO | 2 días | lun 13/5/19 | mié 15/5/19 | | | | | | | | | | |
| 62 | → | POZO No.3 LAS GUARANAS VIEJO | 2 días | mié 15/5/19 | vie 17/5/19 | 61 | | | | | | | | | |
| 63 | → | POZO No. 2, LAS GUARANAS NUEVO | 2 días | vie 17/5/19 | lun 20/5/19 | 62 | | | | | | | | | |
| 64 | → | POZO No. 6, LAS GUARANAS NUEVO | 2 días | lun 20/5/19 | mié 22/5/19 | 63 | | | | | | | | | |
| 65 | → | GASTOS INDIRECTOS POZOS | 1 día | lun 13/5/19 | mar 14/5/19 | 60CC | | | | | | | | | |




[Handwritten signature]

| Id | Modo de | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Prede | Costo | tri 2, 2019 | | tri 3, 2019 | | tri 4, 2019 | |
|----|---------|--|----------|-------------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| | | | | | | | | abr | may | jun | jul | ago | sep |
| 1 | → | EQUIPAMIENTO DE POZOS DE LOS ACUEDUCTOS DE ANGELINA-LAS GUARANAS Y LA MATA. | 144 días | lun 13/5/19 | jue 31/10/19 | | \$20,274,939.11 | | | | | | |
| 2 | → | EQUIPAMIENTO POZO No.2, LAS GUARANAS VIEJO | 18 días | mié 22/5/19 | mié 12/6/19 | | \$2,417,312.95 | | | | | | |
| 3 | → | REHABILITACION Y ELECTRIFICACION POZO | 7 días | vie 31/5/19 | sáb 8/6/19 | | \$1,487,460.00 | | | | | | |
| 4 | → | ELECTROBOMBA TIPO TURBINA VERTICAL, CAPAZ DE ENTREGAR 550 G.P.M. A 368 PIES TDH, 1800 RPM COMPLETA(BOMBA, 70 PIES DE COLUMNA+TAZONES, EJES, COUPLINGS DE COLUMNAS Y DE EJES Y CABEZAL DE DESCARGA) MOVIDA POR MOTOR ELECTRICO DE EJE HUECO VERTICAL DE 75 H.P. | 7 días | vie 31/5/19 | sáb 8/6/19 | 8CC | \$1,412,460.00 | | | | | | |
| 5 | → | MANO DE OBRA INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO | 7 días | vie 31/5/19 | sáb 8/6/19 | 8CC | \$75,000.00 | | | | | | |
| 6 | → | ELECTRIFICACION PRIMARIA | 7 días | mié 22/5/19 | jue 30/5/19 | 64 | \$208,132.68 | | | | | | |
| 7 | → | ELECTRIFICACION SECUNDARIA | 1 día | jue 30/5/19 | vie 31/5/19 | 6 | \$244,145.56 | | | | | | |
| 8 | → | CONSTRUCCION DE LA DESCARGA | 7 días | vie 31/5/19 | sáb 8/6/19 | 7 | \$453,869.18 | | | | | | |
| 9 | → | ELECTRIFICACION CASETA DE BOMBEO | 3 días | sáb 8/6/19 | mié 12/6/19 | 8 | \$23,705.53 | | | | | | |
| 10 | → | EQUIPAMIENTO POZO No. 3, LAS GUARANAS VIEJO | 18 días | mié 12/6/19 | jue 4/7/19 | | \$2,413,054.06 | | | | | | |
| 11 | → | REHABILITACION Y ELECTRIFICACION POZO | 7 días | sáb 22/6/19 | lun 1/7/19 | | \$1,487,460.00 | | | | | | |
| 12 | → | ELECTROBOMBA TIPO TURBINA VERTICAL, CAPAZ DE ENTREGAR 550 G.P.M. A 368 PIES TDH, 1800 RPM COMPLETA(BOMBA, 70 PIES DE COLUMNA+TAZONES, EJES, COUPLINGS DE COLUMNAS Y DE EJES Y CABEZAL DE DESCARGA) MOVIDA POR MOTOR ELECTRICO DE EJE HUECO VERTICAL DE 75 H.P. | 7 días | sáb 22/6/19 | lun 1/7/19 | 16CC | \$1,412,460.00 | | | | | | |
| 13 | → | MANO DE OBRA INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO | 7 días | sáb 22/6/19 | lun 1/7/19 | 16CC | \$75,000.00 | | | | | | |
| 14 | → | ELECTRIFICACION PRIMARIA | 7 días | mié 12/6/19 | vie 21/6/19 | 9 | \$208,132.68 | | | | | | |
| 15 | → | ELECTRIFICACION SECUNDARIA | 1 día | vie 21/6/19 | sáb 22/6/19 | 14 | \$244,145.56 | | | | | | |

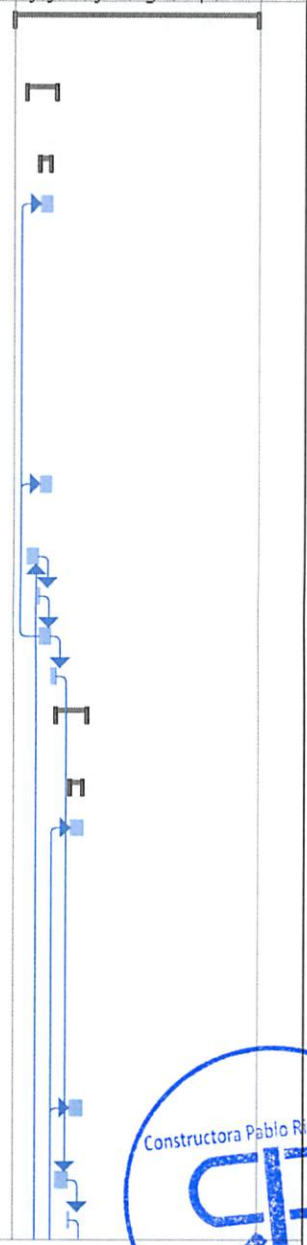

25

| Id | Modo de | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Prede | Costo | tri 2, 2019 | | | tri 3, 2019 | | | tri 4, 2019 | | |
|----|---------|--|----------|-------------|-------------|-------|----------------|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|--|
| | | | | | | | | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | |
| 16 | → | CONSTRUCCION DE LA DESCARGA | 7 días | sáb 22/6/19 | lun 1/7/19 | 15 | \$453,869.18 | | | | | | | | | |
| 17 | → | ELECTRIFICACION CASETA DE BOMBEO | 3 días | lun 1/7/19 | jue 4/7/19 | 16 | \$19,446.64 | | | | | | | | | |
| 18 | → | EQUIPAMIENTO POZO No. 2, LAS GUARANAS NUEVO | 18 días | jue 4/7/19 | jue 25/7/19 | | \$2,413,054.06 | | | | | | | | | |
| 19 | → | REHABILITACION Y ELECTRIFICACION POZO | 7 días | sáb 13/7/19 | lun 22/7/19 | | \$1,487,460.00 | | | | | | | | | |
| 20 | → | ELECTROBOMBA TIPO TURBINA VERTICAL, CAPAZ DE ENTREGAR 550 G.P.M. A 368 PIES TDH, 1800 RPM COMPLETA(BOMBA, 70 PIES DE COLUMNA+TAZONES, EJES, COUPLINGS DE COLUMNAS Y DE EJES Y CABEZAL DE DESCARGA) MOVIDA POR MOTOR ELECTRICO DE EJE HUECO VERTICAL DE 75 H.P. | 7 días | sáb 13/7/19 | lun 22/7/19 | 24CC | \$1,412,460.00 | | | | | | | | | |
| 21 | → | MANO DE OBRA INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO | 7 días | sáb 13/7/19 | lun 22/7/19 | 24CC | \$75,000.00 | | | | | | | | | |
| 22 | → | ELECTRIFICACION PRIMARIA | 7 días | jue 4/7/19 | vie 12/7/19 | 17 | \$208,132.68 | | | | | | | | | |
| 23 | → | ELECTRIFICACION SECUNDARIA | 1 día | vie 12/7/19 | sáb 13/7/19 | 22 | \$244,145.56 | | | | | | | | | |
| 24 | → | CONSTRUCCION DE LA DESCARGA | 7 días | sáb 13/7/19 | lun 22/7/19 | 23 | \$453,869.18 | | | | | | | | | |
| 25 | → | ELECTRIFICACION CASETA DE BOMBEO | 3 días | lun 22/7/19 | jue 25/7/19 | 24 | \$19,446.64 | | | | | | | | | |
| 26 | → | EQUIPAMIENTO POZO No. 6, LAS GUARANAS NUEVO | 18 días | jue 25/7/19 | jue 15/8/19 | | \$2,704,020.30 | | | | | | | | | |
| 27 | → | REHABILITACION Y ELECTRIFICACION POZO | 7 días | sáb 3/8/19 | lun 12/8/19 | | \$1,487,460.00 | | | | | | | | | |
| 28 | → | ELECTROBOMBA TIPO TURBINA VERTICAL, CAPAZ DE ENTREGAR 550 G.P.M. A 368 PIES TDH, 1800 RPM COMPLETA(BOMBA, 70 PIES DE COLUMNA+TAZONES, EJES, COUPLINGS DE COLUMNAS Y DE EJES Y CABEZAL DE DESCARGA) MOVIDA POR MOTOR ELECTRICO DE EJE HUECO VERTICAL DE 75 H.P. | 7 días | sáb 3/8/19 | lun 12/8/19 | 32CC | \$1,412,460.00 | | | | | | | | | |
| 29 | → | MANO DE OBRA INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO | 7 días | sáb 3/8/19 | lun 12/8/19 | 32CC | \$75,000.00 | | | | | | | | | |
| 30 | → | ELECTRIFICACION PRIMARIA | 7 días | jue 25/7/19 | vie 2/8/19 | 25 | \$500,840.03 | | | | | | | | | |
| 31 | → | ELECTRIFICACION SECUNDARIA | 1 día | vie 2/8/19 | sáb 3/8/19 | 30 | \$244,145.56 | | | | | | | | | |



42


| Id | Modo de | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Prede | Costo | tri 2, 2019 | | tri 3, 2019 | | tri 4, 2019 | |
|----|---------|--|----------|--------------|--------------|-------|-----------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| | | | | | | | | abr | may | jun | jul | ago | sep |
| 32 | → | CONSTRUCCION DE LA DESCARGA | 7 días | sáb 3/8/19 | lun 12/8/19 | 31 | \$453,869.18 | | | | | | |
| 33 | → | ELECTRIFICACION CASETA DE BOMBEO | 3 días | lun 12/8/19 | jue 15/8/19 | 32 | \$17,705.53 | | | | | | |
| 34 | → | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS EN TUBERIAS EXISTENTES | 38 días | jue 22/8/19 | lun 7/10/19 | | \$1,138,070.72 | | | | | | |
| 35 | → | LÍNEA DE IMPULSIÓNØ16" PVC | 10 días | jue 22/8/19 | mar 3/9/19 | 49 | \$425,705.71 | | | | | | |
| 36 | → | LÍNEA DE IMPULSIÓNØ12" PVC | 5 días | mar 3/9/19 | lun 9/9/19 | 35 | \$152,320.30 | | | | | | |
| 37 | → | LÍNEA DE IMPULSIÓNØ8" PVC | 5 días | lun 9/9/19 | sáb 14/9/19 | 36 | \$152,320.30 | | | | | | |
| 38 | → | LÍNEA DE IMPULSIÓNØ8" PVC PARA ABASTECER CUCA, LOS LIMONES Y CAOBETE. | 3 días | sáb 14/9/19 | mié 18/9/19 | 37 | \$100,855.19 | | | | | | |
| 39 | → | CONSTRUCCION REGISTROS | 15 días | mié 18/9/19 | lun 7/10/19 | 38 | \$306,869.22 | | | | | | |
| 40 | → | VARIOS | 144 día | lun 13/5/19 | jue 31/10/19 | | \$2,043,215.32 | | | | | | |
| 41 | → | REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES | 1 día | lun 14/10/19 | mar 15/10/19 | | \$43,130.88 | | | | | | |
| 42 | → | DEMOLICION DE CONTENES Y ACERAS | 1 día | lun 14/10/19 | mar 15/10/19 | 55 | \$43,130.88 | | | | | | |
| 43 | → | REPOSICION DE CONTENES Y ACERAS | 4 días | mar 15/10/19 | sáb 19/10/19 | | \$177,244.70 | | | | | | |
| 44 | → | ACERAS A=0.80M | 4 días | mar 15/10/19 | sáb 19/10/19 | 42 | \$64,799.90 | | | | | | |
| 45 | → | CONTENES | 4 días | mar 15/10/19 | sáb 19/10/19 | 44CC | \$112,444.80 | | | | | | |
| 46 | → | ROTURA Y REPOSICION DE ASFALTO | 49 días | jue 15/8/19 | lun 14/10/19 | | \$1,469,546.19 | | | | | | |
| 47 | → | CORTE DE ASFALTO CON DISCO 6" | 4 días | jue 15/8/19 | mié 21/8/19 | 33 | \$31,162.24 | | | | | | |
| 48 | → | REMOCION DE CARPETA ASFALTICA 6" | 4 días | jue 15/8/19 | mié 21/8/19 | 47CC | \$62,560.00 | | | | | | |
| 49 | → | BOTE MATERIAL ASFALTICO EXTRAIDO CON CAMION D=5 KM | 1.5 días | mié 21/8/19 | jue 22/8/19 | 48 | \$45,239.63 | | | | | | |
| 50 | → | SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA PARA RELLENO D=15 KM | 1.5 días | lun 7/10/19 | mié 9/10/19 | 39 | \$197,836.80 | | | | | | |
| 51 | → | COMPACTACION MATERIAL DE BASE | 2 días | mié 9/10/19 | vie 11/10/19 | 50 | \$17,075.20 | | | | | | |
| 52 | → | REPOSICION CARPETA ASFALTICA 4" | 2 días | vie 11/10/19 | lun 14/10/19 | 51 | \$942,080.00 | | | | | | |
| 53 | → | TRANSPORTE DE ASFALTO DIST APROX. 45 KM | 2 días | vie 11/10/19 | lun 14/10/19 | 52CC | \$75,712.32 | | | | | | |
| 54 | → | SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (INC. CONO PARA AVISOS, CINTA PLASTICA, LETRERO) | 1 día | vie 11/10/19 | sáb 12/10/19 | 52CC | \$58,880.00 | | | | | | |



tz

[Handwritten signature]

| Id | Modo de | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Prede | Costo | tri 2, 2019 | | tri 3, 2019 | | | tri 4, 2019 | | |
|----|---------|--|----------|--------------|--------------|-------|----------------|-------------|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| | | | | | | | | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov |
| 55 | → | LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA | 1 día | sáb 12/10/19 | lun 14/10/19 | 54 | \$39,000.00 | | | | | | | | |
| 56 | → | REPARACION DE AVERIAS EN TUBERIAS EXIST. | 10 días | sáb 19/10/19 | jue 31/10/19 | 45 | \$273,293.55 | | | | | | | | |
| 57 | → | VALLA ANUNCIANDO OBRA 16´X 8´IMPRESIÓN FULL COLOR CONTENIENDO LOGO DE INAPA, NOMBRE DEL PROYECTO Y | 144 días | lun 13/5/19 | jue 31/10/19 | 60CC | \$30,000.00 | | | | | | | | |
| 58 | → | CAMPAMENTO (INC. ALQ. DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES C/BAÑO MOVIL) | 144 días | lun 13/5/19 | jue 31/10/19 | 60CC | \$50,000.00 | | | | | | | | |
| 59 | → | GASTOS INDIRECTOS | 1 día | lun 13/5/19 | mar 14/5/19 | | \$6,419,947.70 | | | | | | | | |
| 60 | → | AFORO Y LIMPIEZA DE POZOS | 8 días | lun 13/5/19 | mié 22/5/19 | | \$726,264.00 | | | | | | | | |
| 61 | → | POZO No.2 LAS GUARANAS VIEJO | 2 días | lun 13/5/19 | mié 15/5/19 | | \$154,000.00 | | | | | | | | |
| 62 | → | POZO No.3 LAS GUARANAS VIEJO | 2 días | mié 15/5/19 | vie 17/5/19 | 61 | \$154,000.00 | | | | | | | | |
| 63 | → | POZO No. 2, LAS GUARANAS NUEVO | 2 días | vie 17/5/19 | lun 20/5/19 | 62 | \$154,000.00 | | | | | | | | |
| 64 | → | POZO No. 6, LAS GUARANAS NUEVO | 2 días | lun 20/5/19 | mié 22/5/19 | 63 | \$154,000.00 | | | | | | | | |
| 65 | → | GASTOS INDIRECTOS POZOS | 1 día | lun 13/5/19 | mar 14/5/19 | | \$110,264.00 | | | | | | | | |

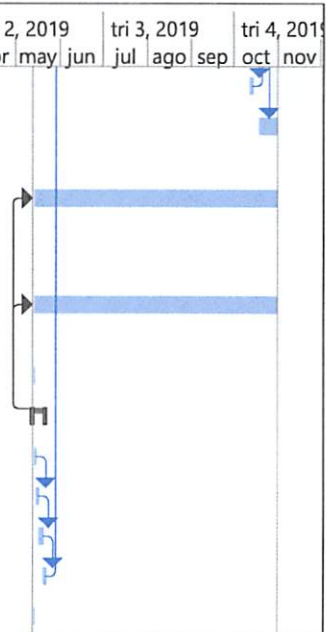

82



[Handwritten signature]
