



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

DAJABON
9 de octubre de 2023

**INFORME TECNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE CUB. NO 2
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 07/08/2023 A 29/09/2023**

Referencia : **Obra:** AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I.
- LOTE A - LINEA MATRIZ SECTOR PARTIDO ARRIBA. (LOTE 1)
Contrato: 2022-096
Contratista: ING. YESELIS RAQUEL JIMENES DE ALMONTE
Provincia: DAJABON

Anexo : - Reporte Cubicacion No.2

I) DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construccion de los siguientes elementos:

- Linea de Distribucion

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Se concluye esta segunda etapa de trabajo con la colocación de 676.90 mts en tubería PVC-SDR 26 Ø de 3 más la colocación de 948.95 mts en tubería PVC-SDR 26 Ø de 4 y sus correspondientes movimientos de tierras con el corte, remoción y bote de carpeta asfáltica más el asiento o colchón de arena para soportar y amortiguar la tubería y el tránsito vehicular sobre la misma. También se incluye el suministro y colocación de piezas especiales.

Esta obra alcanza un avance de ejecucion 57.32%

Para fin de su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente

Ing. Rubén Darío Sánchez Robles
Supervisor



FOTOS:





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

DAJABON
9 de noviembre de 2023

**INFORME TECNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE CUB. NO 2
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 07/08/2023 A 29/09/2023**

Referencia : **Obra:** AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I.
- LOTE B - LINEA MATRIZ SECTOR PARTIDO. (LOTE 2)
Contrato: 2022-097
Contratista: ING. EDGAR TEOFILO DE LA CRUZ CHOVEL.
Provincia: DAJABON

Anexo : - Reporte Cubicacion No.2

I) DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Línea de Distribución

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Se concluye esta segunda etapa de trabajo con la colocación de 295.50 mts en tubería PVC-SDR 26 Ø de 6, la colocación de 568.63 mts en tubería PVC-SDR 26 Ø de 4 más la colocación de 568.63 mts en tubería PVC-SDR 26 Ø de 3 y sus correspondientes movimientos de tierras con el corte, remoción y bote de carpeta asfáltica más el asiento o colchón de arena para soportar y amortiguar la tubería y el tránsito vehicular sobre la misma. También se incluye el suministro y colocación de piezas especiales.

Esta obra tiene un avance de ejecución de 43.70%

Para fin de su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente


Ing. Rubén Darío Sánchez Robles
Supervisor



FOTOS:





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

DAJABON
14 de noviembre de 2023

**INFORME TECNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE CUB. NO 3
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 07/09/2023 A 10/10/2023**

Referencia : **Obra:** AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I.
- LOTE C - LINEA MATRIZ SECTOR PARTIDO ARRIBA. (LOTE 3)

Contrato: 2022-098
Contratista: CONSTRUCTORES, ARQUITECTOS E INGENIEROS CONARING.
Provincia: DAJABON

Anexo : - Reporte Cubicacion No.3

I) DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construccion de los siguientes elementos:

- LÍNEA MATRIZ SECTOR PARTIDO ARRIBA

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Se concluye esta tercera etapa de trabajo con la colocación de 69.60 mts de tubería PVC SDR 26 \varnothing de 16", la ejecucion de la correspondiente prueba hidrostática y el suministro y colocacion del asfalto.

Esta obra alcanza un avance de ejecucion de un 82.82%

Para fin de su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente

Ing. Rubén Darío Sánchez Robles
Supervisor



FOTOS:





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

DAJABON
18/09/2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA
REPORTE CUB. NO 2
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 04/08/2023 A 15/09/2023

Referencia : **Obra:** AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I.
- LOTE D - RED DE DISTRIBUCION SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCIA. (LOTE 4)

Contrato: 2022-099

Contratista: ING. LEONARDO ANTONIO CASTILLO CONTRERAS.

Provincia: DAJABON

Anexo : - Reporte Cubicacion No.2

I) DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construccion de los siguientes elementos:

- Red De Distribución Sectores Partido Arriba Y Villa García

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En el periodo correspondiente se está cubicando la colocación de 1,522.00 mts Tubería Ø6" PVC SDR-26 y 1,350.55 mts Tubería Ø3" PVC SDR-26 y sus movimientos de tierra correspondientes, también se incluye el levantamiento de adicionales de reparaciones de servicios existentes, cruces de puentes y alcantarillas y material de mina para relleno de zanjas. Esta obra alcanza un avance de ejecución de un 63.04%.

Para fin de su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente


Ing. Rubén Darío Sánchez Robles
Supervisor



FOTOS:





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARRILLADOS
(INAPA)
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

DAJABON
2 de octubre de 2023

INFORME TECNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE CUB. NO 2
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 07/09/2023 A 02/10/2023

Referencia : **Obra:** AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I.
- LOTE G - RED DE DISTRIBUCION SECTOR PARTIDO (LOTE 7)

Contrato: 2022-102

Contratista: ING. RAMON MIGUEL ANGEL CAMPOS GUZMAN.

Provincia: DAJABON

Anexo : - Reporte Cubicacion No.2

I) DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construccion de los siguientes elementos:

- Línea de Distribucion

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Se concluye esta segunda etapa de trabajo con la colocación de 417.6 mts en tubería PVC-SDR 26 Ø de 6 más la colocación de 754 mts en tubería PVC-SDR 26 Ø de 3 y sus correspondientes movimientos de tierras con el corte, remoción y bote de carpeta asfáltica más el asiento o colchón de arena para soportar y amortiguar la tubería y el tránsito vehicular sobre la misma. También se incluye el suministro y colocación de piezas especiales.

Para fin de su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente

Ing. Rubén Darío Sánchez Robles
Supervisor



FOTOS:





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Dajabón

05 de noviembre del 2023

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 2**

PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 08/08/2023 a 15/09/2023

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón, Zona I, Lote F- Red De Distribución Sectores partido y la Piña.
Contrato: 101 / 2022
Contratista: Ing. Yafreisy encarnación Sebastián
Provincia: Dajabón \

Anexo : - Reporte de Cubicación No.2
-Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Red de Distribución Sectores Partido y la Piña

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En el periodo correspondiente se está cubicando el suministro de : 376.85 mts de Tubería Ø12” PVC SDR-26 C/J. G., 661.20 mts de Tubería Ø8” PVC SDR-26 C/J. G y 1,825.02 mts de Tubería Ø4” PVC SDR-26 C/J. G. y sus movimiento de tierra correspondiente.

Esta obra alcanza un avance de ejecución de un 57.34%

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Ing. Ruben Sanchez Robles
Supervisor



Anexos Lote F:





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

DAJABON
14 de noviembre de 2023

INFORME TECNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE CUB. NO 2
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 07/09/2023 A 01/10/2023

Referencia : **Obra:** AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I.
- LOTE L - RED DE DISTRIBUCION SECTOR LOS BABOSOS (LOTE 12)

Contrato: 2022-107
Contratista: ING. MARITZA JOSEFA ADONIS TEJEDA.
Provincia: DAJABON

Anexo : - Reporte Cubicacion No.2

I) DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construccion de los siguientes elementos:

- Linea de Distribucion

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Se concluye esta segunda etapa de trabajo con el suministro y la colocación de 100 tubos de PVC-SDR 26 Ø de 3" con sus respectivos movimientos de tierras y suministros de colchón de arena más material clasificado de mina para el relleno superior de la zanja.

Se incluye también la colocación de 8 acometidas y el suministro del hidrante y la ejecucion de la prueba hidrostática.

Esta obra alcanza un avance de ejecucion de un 84.29%


Para fin de su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente

Ing. Rubén Darío Sánchez Robles
Supervisor



FOTOS:

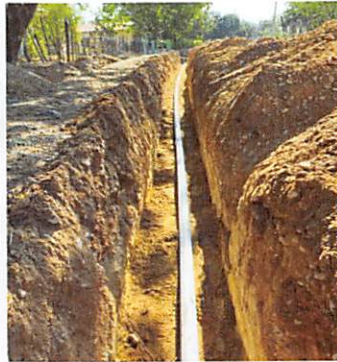



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

DAJABON
14 de noviembre de 2023

**INFORME TECNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE CUB. NO 2
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 07/09/2023 A 10/11/2023**

Referencia : **Obra:** AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I.
NO. SNIP 14766 - LOTE M - RED DE DISTRIBUCION SECTOR SANGRE LINDA.

Contrato: 2022-109

Contratista: ING. CARLOS JULIO PEREZ LOPEZ.

Provincia: DAJABON

Anexo : - Reporte Cubicacion No.2

I) DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construccion de los siguientes elementos:

- Línea de Distribucion

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Se concluye esta segunda etapa de trabajo con el suministro y la colocación de 82 tubos de PVC-SDR 26 Ø de 3" y 43 tubos de PVC-SDR 26 Ø de 6" con sus respectivos movimientos de tierras y suministros de colchón de arena más material clasificado de mina para el relleno superior de la zanja.

Se incluye también la colocación de 20 acometidas y las piezas especiales.

Esta obra alcanza un avance de ejecucion de un 53.00%


Para fin de su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente

Ing. Rubén Darío Sánchez Robles
Supervisor



FOTOS:

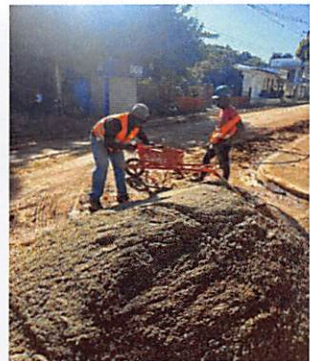



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

DAJABON
30 de octubre de 2023

**INFORME TECNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE CUBICACION NO 2
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 07/08/2023 A 29/09/2023**

Referencia : **Obra:** AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I.
NO. SNIP 14766 - LOTE N - RED DE DISTRIBUCION SECTOR LA GORRA.

Contrato: 2022-110

Contratista: ING. IGNACIO BOLIVAR RUIZ

Provincia: DAJABON

Anexo : - Reporte Cubicacion No.2 + Adicionales No.1

I) DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construccion de los siguientes elementos:

- Línea de Conduccion

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Se concluye esta segunda etapa de trabajo con la colocación de 125.76 mts en tubería PVC-SDR 26 Ø de 8 más la colocación de 852.94 mts en tubería PVC-SDR 26 Ø de 3 y sus correspondientes movimientos de tierras con el corte, remoción y bote de carpeta asfáltica más el asiento o colchón de arena para soportar y amortiguar la tubería y el tránsito vehicular sobre la misma. También se incluye el suministro y colocación de piezas especiales.

Adicional a esto se incluyen los cruces de alcantarillas que no fueron contemplados en el presupuesto.

Para fin de su conocimiento y fines correspondientes.

Esta obra alcanza un avance de ejecucion de un 36.04%

Atentamente

Ing. Rubén Darío Sánchez Robles
Supervisor



FOTOS:





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Dajabón
12 de junio del 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 3
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 12/6/2023 A 13/7/2023

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón, Lote O- Red De Distribución Sector Aminilla, (Lote III).
Contrato: 111 / 2022
Contratista: Ing. Genaro Abreu Henríquez
Provincia: Dajabón \

Anexo : - Reporte de Cubicación No.3

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Línea de conducción

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En el periodo correspondiente se está cubicando el suministro de 1,405.47 mts de Tubería Ø8" PVC SDR-26 C/J. G. y la colocación de 1,364.53mts Tubería Ø8" PVC SDR-26 C/J. G., con su excavación y movimiento de tierra correspondiente.



Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,


Ing. Gerardo Rafael Aquino P.
Supervisor



Anexos Lote O:

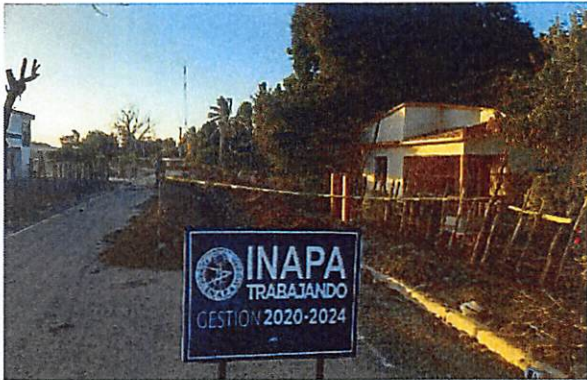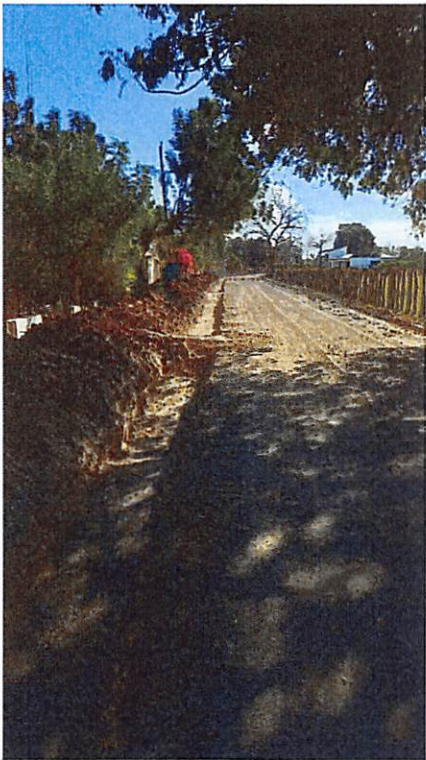



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

8 de noviembre de 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA

REPORTE DE CUB. NO. 2

PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 13/8/2023 A 15/9/2023

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra,
Provincia Dajabon, Zona I. No. Snip 14766 - Lote S - Red De Distribución Sector
Hatico Viejo.
Contrato: 115/ 2022
Contratista: Ing. Benito Mora Sánchez.
Provincia: Dajabón

Anexo : Reporte de Cubicación No.1

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Redes de Distribución (1,183.10 mts de Tubería Ø6" PVC y 1,488.00 mts de Tubería Ø3" PVC)

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En el periodo correspondiente se está cubicando el suministro de 450.49 metros de tubería Ø6" PVC SDR-26 y 159.22 metros de tubería Ø3" PVC SDR-26. Esta obra tiene un avance físico de ejecución de 36.24% ✓

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Ing. Rubén Sánchez

Supervisor Obra





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

DAJABON
18/09/2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA
REPORTE CUB. NO 2
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 04/08/2023 A 15/09/2023

Referencia : **Obra:** AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I.
- LOTE D - RED DE DISTRIBUCION SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCIA. (LOTE 4)

Contrato: 2022-099

Contratista: ING. LEONARDO ANTONIO CASTILLO CONTRERAS.

Provincia: DAJABON

Anexo : - Reporte Cubicacion No.2

I) DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:


- Red De Distribución Sectores Partido Arriba Y Villa García

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En el periodo correspondiente se está cubicando la colocación de 1,522.00 mts Tubería Ø6" PVC SDR-26 y 1,350.55 mts Tubería Ø3" PVC SDR-26 y sus movimientos de tierra correspondientes, también se incluye el levantamiento de adicionales de reparaciones de servicios existentes, cruces de puentes y alcantarillas y material de mina para relleno de zanjas. Esta obra alcanza un avance de ejecución de un 63.04%.

Para fin de su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente


Ing. Rubén Darío Sánchez Robles
Supervisor



FOTOS:





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

8 de noviembre de 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA

REPORTE DE CUB. NO. 2

PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 13/8/2023 A 15/9/2023

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra,
Provincia Dajabon, Zona I. No. Snip 14766 - Lote S - Red De Distribución Sector
Hatico Viejo.
Contrato: 115/ 2022
Contratista: Ing. Benito Mora Sánchez.
Provincia: Dajabón

Anexo : Reporte de Cubicación No.1

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Redes de Distribución (1,183.10 mts de Tubería Ø6" PVC y 1,488.00 mts de Tubería Ø3" PVC)

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En el periodo correspondiente se está cubicando el suministro de 450.49 metros de tubería Ø6" PVC SDR-26 y 159.22 metros de tubería Ø3" PVC SDR-26. Esta obra tiene un avance físico de ejecución de 36.24% ✓

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Ing. Rubén Sánchez

Supervisor Obra





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

DAJABON
14 de noviembre de 2023

**INFORME TECNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE CUB. NO 2
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 07/09/2023 A 10/11/2023**

Referencia : **Obra:** AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I.
NO. SNIP 14766 - LOTE U- LINEA DE CONDUCCION PARTIDO - LA GORRA. LOTE 9 ✓
Contrato: 2022-117 ✓
Contratista: CONSTRUCTORA IWOKA, S.R.L. ✓
Provincia: DAJABON ✓

Anexo : - Reporte Cubicacion No.2

I) DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construccion de los siguientes elementos:

- Linea de Distribucion

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Se concluye esta segunda etapa de trabajo con la colocación del asfalto y pruebas hidrostáticas mas la cubicacion de aumentos de cantidades de las partidas de movimientos de tierras, corte de asfalto y cruces de alcantarillas.

Para fin de su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente

Ing. Rubén Darío Sánchez Robles
Supervisor



FOTOS:





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTILLADOS
(INAPA)
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

DAJABON
9 de octubre de 2023

**INFORME TECNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE CUBICACION NO 2 + ADICIONALES NO 1
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 07-08-2023 A 29-09-2023**

Referencia : **Obra:** AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I.
NO. SNIP 14766- LOTE V- REDES DE BUEN GUSTO

Contrato: 2022-118
Contratista: NUSALEX S.R.L.
Provincia: DAJABON

Anexo : - Reporte Cubicacion No.2 + Adicionales No.1

I) DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construccion de los siguientes elementos:

- Linea de Conduccion
- Linea de Distribucion

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Se concluye esta segunda etapa de trabajo con la colocación de 2,881.95 mts en tubería PVC-SDR 26 y sus correspondientes movimientos de tierras más el asiento o colchón de arena para soportar y amortiguar la tubería y el tránsito vehicular sobre la misma. También se incluye el corte, remoción y bote del asfalto para la línea de conducción, el cual no se encontraba en presupuesto.

Para fin de su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente


Ing. Rubén Darío Sánchez Robles
Supervisor



FOTOS:





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARRILLADOS
(INAPA)
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

DAJABON
2 de octubre de 2023

INFORME TECNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE CUB. NO 2
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 07/09/2023 A 02/10/2023

Referencia : **Obra:** AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I.
- LOTE G - RED DE DISTRIBUCION SECTOR PARTIDO (LOTE 7)

Contrato: 2022-102

Contratista: ING. RAMON MIGUEL ANGEL CAMPOS GUZMAN.

Provincia: DAJABON

Anexo : - Reporte Cubicacion No.2

I) DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construccion de los siguientes elementos:

- Linea de Distribucion

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Se concluye esta segunda etapa de trabajo con la colocación de 417.6 mts en tubería PVC-SDR 26 Ø de 6 más la colocación de 754 mts en tubería PVC-SDR 26 Ø de 3 y sus correspondientes movimientos de tierras con el corte, remoción y bote de carpeta asfáltica más el asiento o colchón de arena para soportar y amortiguar la tubería y el tránsito vehicular sobre la misma. También se incluye el suministro y colocación de piezas especiales.

Para fin de su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente

Ing. Rubén Darío Sánchez Robles
Supervisor



FOTOS:





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

DAJABON
14 de noviembre de 2023

INFORME TECNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE CUB. NO 2
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 07/09/2023 A 10/11/2023

Referencia : **Obra:** AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I.
- LOTE H - RED DE DISTRIBUCION SECTOR PARTIDO. (LOTE 8)

Contrato: 2022-103

Contratista: ING. YANEL JOSE FERNANDEZ PANIAGUA.

Provincia: DAJABON

Anexo : - Reporte Cubicacion No.2

I) DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construccion de los siguientes elementos:

- Linea de Distribucion

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Se concluye esta segunda etapa de trabajo con el suministro y la colocación de 300 tubos de PVC-SDR 26 Ø de 3" con sus respectivos movimientos de tierras y suministros de colchón de arena más material clasificado de mina para el relleno superior de la zanja.

Se incluye también la colocación de 50 acometidas.

Esta obra alcanza un avance de ejecucion de 38.89%


Para fin de su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente

Ing. Rubén Darío Sánchez Robles
Supervisor



FOTOS:

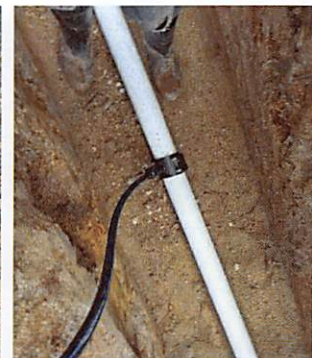



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS

DAJABON
14 de noviembre de 2023

**INFORME TECNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE CUB. NO 2
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 07/09/2023 A 10/10/2023**

Referencia : **Obra:** AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, ZONA I.
- LOTE I - RED DE DISTRIBUCION SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCIA. (LOTE 9)

Contrato: 2022-104

Contratista: ING. ANDRI JESUS RODRIGUEZ MELENDEZ.

Provincia: DAJABON

Anexo : - Reporte Cubicacion No.2

I) DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construccion de los siguientes elementos:

- Línea de Distribucion

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Se concluye esta segunda etapa de trabajo con el suministro y la colocación de 22 tubos de PVC-SDR 26 Ø de 3" y 40 tubos de PVC-SDR 26 Ø de 6" con sus respectivos movimientos de tierras y suministros de colchón de arena.
Se incluye también la colocación de 30 acometidas y la ejecución de las pruebas hidrostáticas.

Esta obra tiene un avance de ejecución de un 78.37%

Para fin de su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente

Ing. Rubén Darío Sánchez Robles
Supervisor



FOTOS:





INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

05 de noviembre de 2023

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 2
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 11/6/2023 A 20/7/2023

Referencia : **Obra:** Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón,
Zona I. - Lote K - Red De Distribución Sector Los Babosos. (Lote 11)

Contrato: 106 / 2022

Contratista: Ing. Cristian Tavarez Gabino

Provincia: Dajabón

Anexo : - Reporte de Cubicación No.2
:- Fotos

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Línea de distribución

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

En el periodo correspondiente se está cubicando el completo suministro material de mina, cruce de puente y campamento. Este proyecto tiene un avance de ejecución de un 98.47%

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Ing. Rubén Sánchez
Supervisor

