


**CRONOGRAMA RESUMIDO AMPLIACIÓN ACUEDUCTO NAVARRETE, OBRA DE TOMA, LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø20 HD, DEPOSITO REGULADOR H.A, SUPERFICIAL 8,000 M3 Y LINEA DE CONDUCCION Ø24 HD -
LOTE I**

Id	Mod de tarea	% completa	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
1		93%	LOTE 1 - AMPLIACIÓN ACUEDUCTO NAVARRETE, OBRA DE TOMA, LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø20 HD, DEPOSITO REGULADOR H.A, SUPERFICIAL 8,000 M3 Y LINEA DE CONDUCCION Ø24 HD	863 días	10-02-23	07-03-26																							
2		100%	Orden de Inicio	0 días	10-02-23	10-02-23																							
3		88%	Campamento	693 días	17-02-23	11-08-25	2CC+6 días																						
4		100%	Fabricacion e Instalacion de Letreros	3 días	21-02-23	23-02-23	3CC+2 días																						
5		89%	A- OBRA DE TOMA - LÍNEA DE ADUCCIÓN - DESARENADOR - CÁRCAMO DE BOMBEO AGUAS CRUDAS	806 días	26-04-23	07-03-26																							
6		100%	A-1 CONSTRUCCION DE COLUMNAS DE GRAVA	14 días	14-06-23	30-06-23																							
7		100%	Construccion de columnas de grava	14 días	14-06-23	30-06-23	3CC+54 días																						
8		100%	A-2 CONSTRUCCION DE PILOTES	74 días	18-09-23	21-12-23																							
9		100%	Elaboración estudio ETB (sondeo SPT)	6 días	18-09-23	25-09-23	7FC+60 días																						
10		100%	Autorización construcción de pilotes INAPA	0 días	02-11-23	02-11-23	9CC																						
11		100%	Armado canastos de pilotes	4 días	02-11-23	08-11-23	10																						
12		100%	Construcción de pilotes (48 unidades)	12 días	08-11-23	23-11-23	11,69,114																						
13		100%	Limpieza y demolición de cabezal de pilotes, colocación de relleno (granzote) y nivelación	7 días	23-11-23	01-12-23	12																						
14		100%	Prueba de integridad PIT	1 día	01-12-23	01-12-23	15CF-2 días																						
15		100%	Preparación de pilotes para prueba	3 días	05-12-23	08-12-23	125																						
16		100%	Prueba de carga en pilotes	4 días	08-12-23	13-12-23	15																						
17		100%	Demolición de cabezal de pilotes luego de prueba PDA	3 días	16-12-23	20-12-23	16																						
18		100%	Limpieza de área	1 día	20-12-23	21-12-23	17																						
19		2%	A-3 CAJUELA DE CAPTACIÓN EN CANAL EXISTENTE	276 días	16-12-24	02-12-25																							
20		60%	PRELIMINARES	201 días	16-12-24	28-08-25																							
21		0%	Eliminación Vertederos improvisados	1 día	28-08-25	28-08-25	22CC+2 días																						
22		0%	Replanteo y control topográfico	1 día	26-08-25	26-08-25	48FC+12 días,23,315																						
23		100%	Construcción de ataguía para delimitación de área de trabajo	3 días	16-12-24	18-12-24	48FC+12 días																						
24		0%	MOVIMIENTO DE TIERRA / PREPARACIÓN DE TERRENO	10 días	26-08-25	06-09-25																							
25		0%	Excavación y bote de material compactado	10 días	26-08-25	06-09-25	22CC																						
26		0%	Relleno compactación c/compactador mecánico	10 días	26-08-25	06-09-25	25CC																						
27		0%	Demolicion con compresor de seccion de muro HA	10 días	26-08-25	06-09-25	25CC																						
28		0%	HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL F'c=280 KG/CM2	36 días	08-09-25	22-10-25																							
29		0%	Losa de cimentacion	8 días	11-09-25	20-09-25	33																						
30		0%	Muros	15 días	22-09-25	09-10-25	29																						
31		0%	Viga de refuerzo	4 días	10-10-25	15-10-25	30																						
32		0%	Losa de techo	10 días	10-10-25	22-10-25	31CC																						

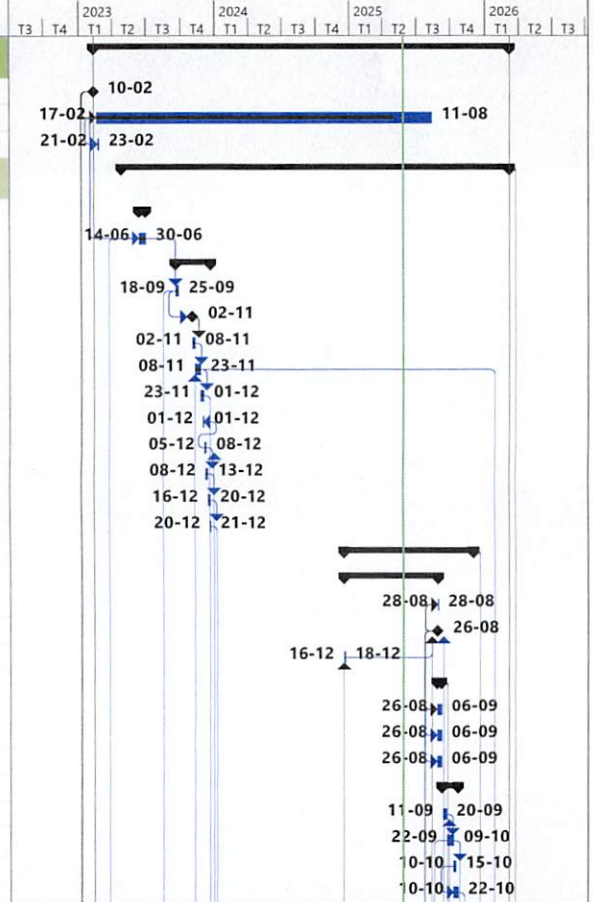

Project: Acueducto Navarrete
Date: 26-05-25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Fecha limite

Progreso

CRONOGRAMA RESUMIDO AMPLIACIÓN ACUEDUCTO NAVARRETE, OBRA DE TOMA, LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø20 HD, DEPOSITO REGULADOR H.A, SUPERFICIAL 8,000 M3 Y LINEA DE CONDUCCION Ø24 HD - LOTE I

Id	Mod de tarea	% de completa	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras																	
								2023				2024				2025				2026				
								T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3
33		0%	Hormigón simple F'c=100kg/cm²	3 días	08-09-25	10-09-25	24																	
34		0%	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE SELLADOR:	22 días	10-10-25	06-11-25																		
35		0%	Fino losa de fondo	2 días	05-11-25	06-11-25	37,38																	
36		0%	Fraguache	2 días	29-10-25	31-10-25	32FC+5 días																	
37		0%	Pañete interior	4 días	30-10-25	04-11-25	36CC+1 día																	
38		0%	Pañete exterior	4 días	30-10-25	04-11-25	36CC+1 día																	
39		0%	Cantos	4 días	30-10-25	04-11-25	37CC																	
40		0%	Fino de techo	2 días	05-11-25	06-11-25	37,38																	
41		0%	Sellador elástico entre cajuela y canal existente	2 días	10-10-25	13-10-25	30																	
42		0%	JUNTA DE GOMA hidrofílica de 9"	8 días	22-09-25	01-10-25	30CC																	
43		0%	PARRILLA HG de 1"x1/4" (1.20X1.00) m	2 días	07-11-25	10-11-25	40																	
44		0%	LIMPIEZA DE FONDO DEL CANAL	2 días	28-08-25	29-08-25	21CC																	
45		0%	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	29 días	26-08-25	01-10-25	22CC																	
46		0%	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA COMPUERTA	10 días	07-11-25	19-11-25	34																	
47		0%	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA	10 días	20-11-25	02-12-25	46																	
48		100%	A-4 LÍNEA DE ADUCCIÓN	17 días	04-04-24	25-04-24																		
49		100%	PRELIMINARES	5 días	17-04-24	23-04-24																		
50		100%	Replanteo y control topografico	5 días	17-04-24	23-04-24	57CC																	
51		100%	MOVIMIENTO DE TIERRA	5 días	17-04-24	23-04-24																		
52		100%	Excavación material compactado c/equipo	5 días	17-04-24	23-04-24	57CC																	
53		100%	Relleno compactacion c/compactador	5 días	17-04-24	23-04-24	57CC																	
54		100%	Bote de material con camión D=5 km	5 días	17-04-24	23-04-24	52CC																	
55		100%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERÍAS:	15 días	04-04-24	23-04-24																		
56		100%	Gestion Compra Materiales de Importacion (tuberia y codo Ø30" Hierro Dúctil)	10 días	04-04-24	17-04-24	57CF																	
57		100%	Colocacion de Tuberia De Ø30" Hierro Dúctil	5 días	17-04-24	23-04-24	119																	
58		100%	PRUEBA HIDROSTATICA	2 días	24-04-24	25-04-24	57																	
59		100%	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA:	5 días	17-04-24	23-04-24																		
60		100%	Codo Ø30"x45º Hierro Ductil	5 días	17-04-24	23-04-24	57CC																	
61		100%	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	5 días	17-04-24	23-04-24	57CC																	
62		100%	A-5 DESARENADOR	392 días	26-04-23	24-09-24																		
63		100%	PRELIMINARES	2 días	26-04-23	28-04-23																		
64		100%	Limpieza del área	2 días	26-04-23	28-04-23	7CC-3 días																	
65		100%	MOVIMIENTO DE TIERRA Y ADECUACIÓN DE TERRENO	5 días	20-09-23	26-09-23																		
66		100%	Excavación de material compactado	3 días	20-09-23	22-09-23	67CC																	

Project: Acueducto Navarrete
Date: 26-05-25

Tarea		Agrupar por síntesis
División		Tarea resumida
Hito		Hito resumido
Resumen		Progreso resumido
Resumen del proyecto		Tareas externas

	Hito externo		solo duración
	Tarea inactiva		Informe de resumen manual
	Hito inactivo		Resumen manual
	Resumen inactivo		solo el comienzo
	Tarea manual		solo fin

	Fecha límite
	Progreso



CRONOGRAMA RESUMIDO AMPLIACIÓN ACUEDUCTO NAVARRETE, OBRA DE TOMA, LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø20 HD, DEPOSITO REGULADOR H.A, SUPERFICIAL 8,000 M3 Y LINEA DE CONDUCCION Ø24 HD - LOTE I

Id	Mod de tarea	% completa	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								T3	T4	2023	T1	T2	T3	T4	2024	T1	T2	T3	T4	2025	T1	T2	T3	T4	2026	T1	T2	T3	T4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
67		100%	Replanteo y control topográfico	3 días	20-09-23	22-09-23	9CC+2 días																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Project: Acueducto Navarrete
Date: 26-05-25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin


Fecha limite

Progreso



CRONOGRAMA RESUMIDO AMPLIACIÓN ACUEDUCTO NAVARRETE, OBRA DE TOMA, LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø20 HD, DEPOSITO REGULADOR H.A, SUPERFICIAL 8,000 M3 Y LINEA DE CONDUCCION Ø24 HD - LOTE I

Id	Mod de tarea	% complet	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras												
								T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2
99	✓	100%	Cantos general	10 días	15-03-24	03-05-24	97CC												
100	✓	100%	Pintura acrílica en muros y losa pasarela (incluye base blanca)	2 días	23-09-24	24-09-24	101												
101	✓	100%	SUMINISTRO E INSTALACION DE:	54.7 días	11-05-24	22-07-24													
102	✓	100%	Barandas en material H.G., Ø1½" en todas las tuberías, tanto verticales como horizontales altura 1.00 m	4 días	11-05-24	22-07-24	98												
103	✓	100%	Escalera interior, tipo gato en H.N. c/protección anticorrosiva y pintura epoxi	5 días	01-07-24	05-07-24	96												
104	✓	100%	Escalera interior, tipo gato con proteccion de caídas en H.N.	5 días	06-07-24	12-07-24	103CC												
105	✓	100%	LIMPIEZA FINAL	219 días	20-09-23	24-09-24	66CC												
106	✓	100%	A-6 ESTACIÓN DE BOMBEO No.1 (CÁRCAMO Y CASETA)	459 días	26-04-23	19-12-24													
107	✓	100%	A-4-1 CÁRCAMO DE BOMBEO	369.5 días	26-04-23	27-08-24													
108	✓	100%	PRELIMINARES	2 días	26-04-23	28-04-23													
109	✓	100%	Limpieza del área (corte y desbroce c/equipo)	2 días	26-04-23	28-04-23	64CC												
110	✓	100%	MOVIMIENTO DE TIERRA / ADECUACIÓN DE TERRENO	5 días	20-09-23	26-09-23													
111	✓	100%	Replanteo y Control Topográfico	3 días	20-09-23	22-09-23	9CC+2 días												
112	✓	100%	Excavación de material compactado	3 días	20-09-23	22-09-23	111CC												
113	✓	100%	Bote de material con camión D=5 km	3 días	20-09-23	22-09-23	112CC												
114	✓	100%	Relleno compactado	2 días	23-09-23	26-09-23	112												
115	✓	100%	HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL F'c=280 KG/CM2	70 días	12-12-23	15-03-24													
116	✓	100%	Zapata de muros	15 días	21-12-23	12-01-24	125,18												
117	✓	100%	Zapatas aisladas para columna C1	5 días	21-12-23	28-12-23	125,18												
118	✓	100%	Losa de fondo 0.25 m	15 días	21-12-23	12-01-24	116CC												
119	✓	100%	Muros 0.35 m	38 días	10-01-24	29-02-24	118FC-20%												
120	✓	100%	Muros 0.20 m - 0.30 qq/m³	8 días	06-02-24	15-02-24	119CC+25%												
121	✓	100%	Columnas C1 (0.45mx0.45m)	38 días	10-01-24	29-02-24	119FF												
122	✓	100%	Viga V2 (0.25mx0.40m)	11 días	02-02-24	15-02-24	119CC+50%												
123	✓	100%	Viga V1 (0.35mx0.70m)	11 días	01-03-24	15-03-24	124FF												
124	✓	100%	Losa de techo del carcamo	11 días	01-03-24	15-03-24	119FC+1 día												
125	✓	100%	Colocación de hormigón simple f'c=100kg/cm²	2 días	12-12-23	13-12-23	13												
126	✓	100%	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE	68.5 días	29-02-24	31-05-24													
127	✓	100%	Fino losa de fondo	1 día	30-05-24	31-05-24	128,124FC+7 días												
128	✓	100%	Pañete interior	11 días	29-02-24	14-03-24	119												
129	✓	100%	Cantos	11 días	29-02-24	14-03-24	128CC												
130	✓	100%	Fino de techo en terraza exterior	3 días	13-05-24	15-05-24	155												
131	✓	100%	APLICACIÓN DE:	62 días	21-12-23	15-03-24													

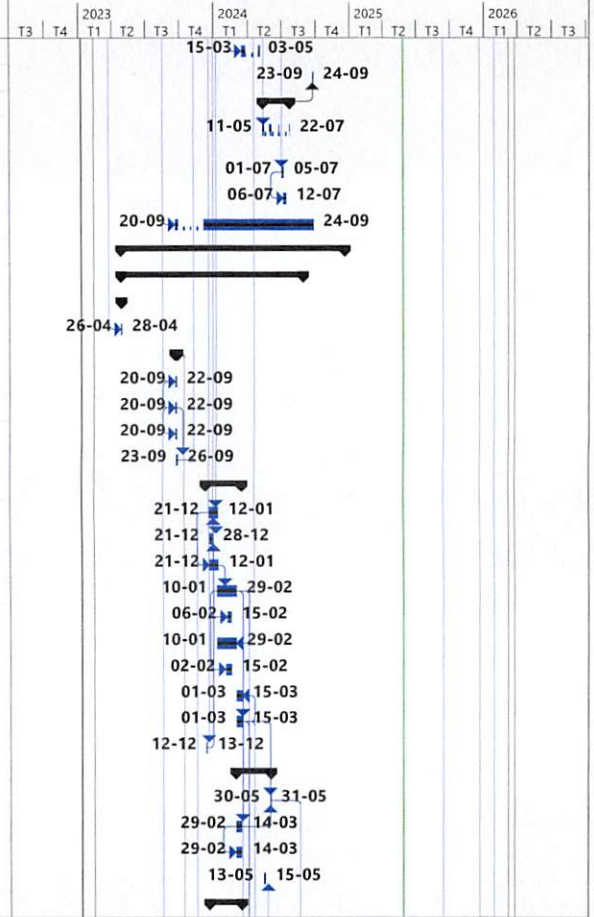

Project: Acueducto Navarrete
Date: 26-05-25

Tarea Agrupar por síntesis
División Tarea resumida
Hito Hito resumido
Resumen Progreso resumido
Resumen del proyecto Tareas externas

Hito externo
 Tarea inactiva
 Hito inactivo
 Resumen inactivo
 Tarea manual

solo duración
 Informe de resumen manual
 Resumen manual
 solo el comienzo
 solo fin

Fecha límite
 Progreso
 C
 J





AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO. INAPA-CCC-LPN-2022-0029

LOTE II Ampliación acueducto Navarrete, planta de tratamiento de filtración rápida de 300 LPS de capacidad y línea de conducción planta tanque Zona V.



Id	REF.	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	
1		AMPLIACIÓN ACUEDUCTO NAVARRETE, PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACION RÁPIDA DE 300 LPS DE CAPACIDAD Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA - TANQUE	435 días	sáb 15/10/22	vie 14/06/24	09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24
2		Anticipo	0 días	sáb 15/10/22	sáb 15/10/22	◆
3		Disposición de los terrenos	0 días	sáb 15/10/22	sáb 15/10/22	◆
4		Disposición de permisos, autorizaciones, licencias y concesiones	0 días	sáb 15/10/22	sáb 15/10/22	◆
5		Acta de inicio de obra	0 días	sáb 15/10/22	sáb 15/10/22	◆
6		Movilización e instalación de campamento de obra	2 mss	lun 17/10/22	vie 09/12/22	
7	A	PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACIÓN RÁPIDA DE 300 LPS DE CAPACIDAD	410 días	lun 21/11/22	vie 14/06/24	
8	I	PLANTA DE TRATAMIENTO	407 días	lun 21/11/22	mar 11/06/24	
9	1	REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	6 días	lun 21/11/22	lun 28/11/22	
10	2	TRABAJOS GENERALES	94 días	mar 13/12/22	vie 21/04/23	
19	3	HORMIGÓN ARMADO INDUSTRIAL F'c=350 KG/CM2 , TERMINACIÓN EN HORMIGÓN VISTO EN:	84 días	lun 24/04/23	jue 17/08/23	
38	4	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE :	10 días	vie 18/08/23	jue 31/08/23	
40	5	INSTALACIONES CANAL DE ENTRADA Y MEZCLA RÁPIDA	3 días	vie 01/09/23	mar 05/09/23	
44	6	FLOCULADORES	4 días	mié 06/09/23	lun 11/09/23	
54	7	SEDIMENTADORES	134 días	mar 12/09/23	vie 15/03/24	
67	8	FILTROS	168 días	mié 11/10/23	vie 31/05/24	
108	9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDESTALES PARA VALVULAS Y COMPUERTAS ACERO INOXIDABLE	27 días	lun 06/05/24	mar 11/06/24	
116	10	PASARELA (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) DE:	68 días	mar 02/01/24	jue 04/04/24	
128	11	TERMINACIÓN EXTERIOR PLANTA	1 día	jue 04/04/24	jue 04/04/24	
130	12	DESAGÜE GENERAL DE LA PLANTA-HASTA TRATAMIENTO DE LODOS	60 días	mar 05/12/23	lun 26/02/24	
148	II	CASA DE QUÍMICOS	278 días	mar 20/12/22	jue 11/01/24	
149	1	PRELIMINARES	1 día	mar 20/12/22	mar 20/12/22	
151	2	MOVIMIENTO DE TIERRA	8 días	mié 21/12/22	vie 30/12/22	
155	3	HORMIGÓN ARMADO F'c= 210 KG/CM² EN:	96 días	lun 02/01/23	lun 15/05/23	
186	4	MUROS BLOQUES	21 días	mar 16/05/23	mar 13/06/23	
191	5	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE	89 días	mié 14/06/23	lun 16/10/23	
209	6	PORTAJES Y VENTANAS	29 días	mar 17/10/23	vie 24/11/23	
217	7	ESCALERAS Y BARANDAS	8 días	lun 27/11/23	mié 06/12/23	
221	8	EQUIPOS	107 días	vie 28/07/23	lun 25/12/23	
231	9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:	4 días	mar 17/10/23	vie 20/10/23	
233	10	GABINETES Y MESETAS	4 días	jue 07/12/23	mar 12/12/23	
238	11	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO	2 días	mié 13/12/23	jue 14/12/23	
249	12	EQUIPAMIENTO DE COCINA	2 días	mié 10/01/24	jue 11/01/24	
252	13	MOBILIARIO	2 días	mié 10/01/24	jue 11/01/24	
267	14	UTENSILIOS PARA LIMPIEZA	0 días	mar 09/01/24	mar 09/01/24	
281	15	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	24 días	jue 07/12/23	mar 09/01/24	
294	16	INSTALACIONES SANITARIAS	13 días	jue 21/12/23	lun 08/01/24	
302	17	INSTALACIÓN DE AGUA Potable (Incluye suministro de tuberías y piezas)	10 días	jue 07/12/23	mié 20/12/23	
303	18	INSTALACIÓN DRENAJE Sanitario (Incluye suministro de tuberías y piezas)	10 días	jue 07/12/23	mié 20/12/23	
304	19	LOGO y letrero INAPA	1 día	mié 10/01/24	mié 10/01/24	
305	III	CASETA DE CLORACIÓN	133 días	lun 16/10/23	jue 18/04/24	
306	1	REPLANTEO	2 días	mar 17/10/23	mié 18/10/23	
307	2	MOVIMIENTO DE TIERRA	4 días	jue 19/10/23	mar 24/10/23	
311	3	HORMIGÓN ARMADO (F'c=240 KG/CM²) EN :	39 días	mié 25/10/23	lun 18/12/23	





Id	REF.	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
554	1	REPLANTEO	1 día	mar 22/08/23	mar 22/08/23
555	2	MOVIMIENTO DE TIERRA	4 días	mar 22/08/23	vie 25/08/23
559	3	HORMIGON ARMADO F'c= 210 KG/CM2 EN:	29 días	lun 28/08/23	jue 05/10/23
569	4	MUROS DE BLOQUES	27 días	mar 22/08/23	mié 27/09/23
572	5	TERMINACION DE SUPERFICIE	74 días	mar 29/08/23	vie 08/12/23
585	6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIA	3 días	lun 11/12/23	mié 13/12/23
595	7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	9 días	lun 11/12/23	jue 21/12/23
603	8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:	5 días	lun 11/12/23	vie 15/12/23
610	VIII	CASETA DE BOMBAS (SOPLADORES)	35 días	lun 11/12/23	vie 26/01/24
611	1	Replanteo	1 día	lun 11/12/23	lun 11/12/23
612	2	MOVIMIENTO DE TIERRA	2 días	lun 11/12/23	mar 12/12/23
616	3	HORMIGÓN ARMADO EN 210 KG/CM2:	18 días	lun 11/12/23	mié 03/01/24
624	4	PISO c/malla electrosoldada e=0,10 m (Incluye pulido)	1 día	lun 11/12/23	lun 11/12/23
625	5	MURO DE BLOQUES	9 días	lun 11/12/23	jue 21/12/23
628	6	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:	19 días	vie 22/12/23	mié 17/01/24
638	7	INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	1 día	jue 18/01/24	jue 18/01/24
642	8	TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	31 días	mié 13/12/23	mié 24/01/24
652	9	ELÉCTRICA	1 día	vie 19/01/24	vie 19/01/24
656	10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS:	31 días	vie 15/12/23	vie 26/01/24
663	11	LOGO y letrero de INAPA	1 día	lun 18/12/23	lun 18/12/23
664	IX	CASA DE CONTROL	27 días	vie 22/12/23	lun 29/01/24
665	1	REPLANTEO	1 día	vie 22/12/23	vie 22/12/23
666	2	MOVIMIENTO DE TIERRA:	2 días	vie 22/12/23	lun 25/12/23
670	3	HORMIGÓN ARMADO EN F'c= 210 KG/CM2 :	27 días	vie 22/12/23	lun 29/01/24
679	4	MURO DE BLOQUES:	6 días	vie 22/12/23	vie 29/12/23
684	5	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:	15 días	lun 01/01/24	vie 19/01/24
693	6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:	1 día	vie 19/01/24	vie 19/01/24
696	7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS:	4 días	vie 19/01/24	mié 24/01/24
702	X	DRENAJE SANITARIO	17 días	lun 22/01/24	mar 13/02/24
703	1	SISTEMA DEPURADOR DE AGUAS RESIDUALES	17 días	lun 22/01/24	mar 13/02/24
704	1.1	REPLANTEO (Unidad Depuradora y tuberías)	1 día	lun 22/01/24	lun 22/01/24
705	1.2	MOVIMIENTO DE TIERRA:	8 días	lun 22/01/24	mié 31/01/24
710	1.3	HORMIGÓN ARMADO F'c= 210 KG/CM2 EN:	17 días	lun 22/01/24	mar 13/02/24
714	1.4	MURO DE BLOQUES:	4 días	lun 22/01/24	jue 25/01/24
716	1.5	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:	5 días	lun 22/01/24	vie 26/01/24
722	1.6	MATERIAL DE FILTRO BIOLÓGICO:	1 día	mar 13/02/24	mar 13/02/24
725	1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE :	8 días	lun 29/01/24	mié 07/02/24
738	1.8	CÁMARA DE INSPECCIÓN (según detalle)	1 día	jue 08/02/24	jue 08/02/24
739	1.9	TRAMPA DE GRASA (según detalle)	1 día	vie 09/02/24	vie 09/02/24
740	1.10	POZO FILTRANTE Ø8" (según detalle)	1 día	lun 12/02/24	lun 12/02/24
741	XI	AGUA POTABLE	10 días	mié 14/02/24	mar 27/02/24
742	1	REPLANTEO	2 días	mié 14/02/24	jue 15/02/24
743	2	MOVIMIENTO DE TIERRA:	8 días	vie 16/02/24	mar 27/02/24
748	3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE :	1 día	mié 21/02/24	mié 21/02/24
752	XII	TERMINACIONES EXTERIORES	114 días	mié 20/09/23	lun 26/02/24
753	1	PAVIMENTO	19 días	mié 20/09/23	lun 16/10/23
758	2	DRENAJE PLUVIAL	5 días	mar 17/10/23	lun 23/10/23

Página 3



INAPA-CCC-LPN-2022-0029

CONSORCIO ACUEDUCTOS DEL CIBAO

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO

INAPA-CCC-LPN-2022-0029

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A
41	Suministro y colocación de tuberías Ø3" PV	12 days	02/04/25	16/04/25																						
42	Reposición de Carpeta Asfáltica	8 days	29/04/25	08/05/25																						
43	Imprimación y colocación de asfalto	8 days	29/04/25	08/05/25																						
44	Limpieza Continua y Final	4 days	08/05/25	14/05/25																						
45	C - LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE DE	33 days	28/01/25	10/03/25																						
46	Preliminares	3 days	28/01/25	31/01/25																						
47	Replanteo	3 days	28/01/25	31/01/25																						
48	Movimiento de tierra	28 days	31/01/25	07/03/25																						
49	Excavación material compacto	5 days	31/01/25	06/02/25																						
50	Suministro y coloc. Asiento de arena	5 days	03/02/25	07/02/25																						
51	Relleno compactado	8 days	26/02/25	07/03/25																						
52	Suministro y colocación de tuberías	10 days	08/02/25	20/02/25																						
53	Suministro y colocación de tuberías Ø8" PV	10 days	08/02/25	20/02/25																						
54	Suministro y Colocación de Valvulas	4 days	20/02/25	26/02/25																						
55	Suministro y Colocación de Valvulas	4 days	20/02/25	26/02/25																						
56	Limpieza Continua y Final	2 days	07/03/25	10/03/25																						
57	D - ESTACIÓN DE BOMBEO No.2 (CÁRC)	126 days	07/03/25	12/08/25																						
58	CÁRCAMO DE BOMBEO	71 days	07/03/25	04/06/25																						
59	Preliminares	5 days	07/03/25	13/03/25																						
60	Limpieza del área	3 days	07/03/25	11/03/25																						
61	Replanteo	2 days	11/03/25	13/03/25																						
62	Movimiento de tierra	43 days	13/03/25	06/05/25																						
63	Excavación material compacto	4 days	13/03/25	19/03/25																						
64	Relleno Compactado	2 days	01/05/25	03/05/25																						
65	Bote de Escombros	2 days	03/05/25	06/05/25																						
66	Hormigón Armado	35 days	19/03/25	01/05/25																						
67	Zapatas	7 days	19/03/25	27/03/25																						
68	Losa de Fondo	7 days	05/04/25	14/04/25																						
69	Muros	7 days	27/03/25	04/04/25																						
70	Columnas	7 days	14/04/25	23/04/25																						
71	Vigas y Losas	7 days	23/04/25	01/05/25																						
72	Terminación de Superficie	20 days	09/05/25	04/06/25																						
73	Fino Losa de fondo	3 days	09/05/25	14/05/25																						
74	Pañete interior	5 days	14/05/25	20/05/25																						
75	Fino de techo	2 days	02/06/25	04/06/25																						
76	CASETA DE BOMBEO SOBRE CISTER	23 days	20/05/25	18/06/25																						
77	Hormigón Armado	6 days	26/05/25	02/06/25																						
78	Muro de Blocks	4 days	20/05/25	24/05/25																						
79	Acera	2 days	09/06/25	11/06/25																						
80	Terminación de Superficie	4 days	04/06/25	09/06/25																						
81	Verja de Malla Ciclónica	3 days	09/06/25	12/06/25																						
82	Portaje	2 days	12/06/25	16/06/25																						
83	Limpieza	2 days	16/06/25	18/06/25																						
84	ELECTRIFICACIÓN ESTACION DE BO	5 days	18/06/25	24/06/25																						
85	GARITA DE VIGILANTE	39 days	24/06/25	12/08/25																						

CONSORCIO ACUEDUCTOS DEL CIBAO



INAPA-CCC-LPN-2022-0029

CONSORCIO ACUEDUCTOS DEL CIBAO

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO

INAPA-CCC-LPN-2022-0029

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	N	D	Half 1, 2025	Half 2, 2025	Half 1, 2026	Half 2, 2026															
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	
131	Suministro y coloc. Asiento de arena	10 days	17/05/25	29/05/25																					
132	Relleno compactado	5 days	03/06/25	09/06/25																					
133	Suministro y colocación de tuberías	12 days	19/05/25	03/06/25																					
134	Suministro y colocación de tuberías Ø8" Ac	7 days	19/05/25	27/05/25																					
135	Suministro y colocación de tuberías Ø6" Ac	5 days	28/05/25	03/06/25																					
136	Reposición de Carpeta Asfáltica	3 days	09/06/25	12/06/25																					
137	Imprimación y colocación de asfalto	3 days	09/06/25	12/06/25																					
138	Limpieza Continua y Final	5 days	12/06/25	19/06/25																					
139	F - DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIE	43 days	09/06/25	01/08/25																					
140	Preliminares	4 days	09/06/25	13/06/25																					
141	Limpieza del área	2 days	09/06/25	11/06/25																					
142	Replanteo	2 days	11/06/25	13/06/25																					
143	Movimiento de tierra	26 days	13/06/25	16/07/25																					
144	Excavación material compacto	1 day	13/06/25	16/06/25																					
145	Relleno Compactado	2 days	11/07/25	14/07/25																					
146	Bote de Escombros	2 days	14/07/25	16/07/25																					
147	Hormigón Armado	21 days	16/06/25	11/07/25																					
148	Zapatatas	4 days	16/06/25	20/06/25																					
149	Losa de Fondo	3 days	26/06/25	30/06/25																					
150	Muros	5 days	20/06/25	26/06/25																					
151	Columnas	4 days	30/06/25	04/07/25																					
152	Vigas y Losas	5 days	04/07/25	11/07/25																					
153	Terminación de Superficie	10 days	21/07/25	01/08/25																					
154	Fino Losa de fondo	2 days	21/07/25	22/07/25																					
155	Pañete interior	4 days	23/07/25	28/07/25																					
156	Fino de techo	2 days	28/07/25	30/07/25																					
157	Pintura	2 days	30/07/25	01/08/25																					
158	Suministro e Instalación de Tuberías en Entrad	4 days	26/06/25	01/07/25																					
159	Acera perimetral	2 days	01/07/25	03/07/25																					
160	Verja en Bloques de 6"	21 days	03/07/25	30/07/25																					
161	Replanteo	1 day	03/07/25	04/07/25																					
162	Movimiento de tierra	16 days	04/07/25	24/07/25																					
163	Excavación material compacto	3 days	04/07/25	09/07/25																					
164	Relleno de reposición	1 day	23/07/25	23/07/25																					
165	Bote de material	1 day	24/07/25	24/07/25																					
166	Hormigón Armado	11 days	09/07/25	22/07/25																					
167	Zapatatas	3 days	09/07/25	12/07/25																					
168	Viga de Amarre SNP	3 days	18/07/25	22/07/25																					
169	Muros	5 days	12/07/25	18/07/25																					
170	Blocks 8" BNP	1 day	12/07/25	14/07/25																					
171	Blocks 6" SNP	4 days	14/07/25	18/07/25																					
172	Terminación de Superficie	4 days	23/07/25	28/07/25																					
173	Fraguache	1 day	23/07/25	23/07/25																					
174	Pañete en vigas y columnas	3 days	24/07/25	28/07/25																					
175	Pintura	2 days	28/07/25	30/07/25																					

Retropala,Camion Volteo[5],Ayudantes[10]

Retropala,Ayudantes[10],Compactador manual[2],Rodillo de mano

Maestro de Plomeria,Plomeros[5]

Maestro de Plomeria,Plomeros[5]

Retropala,Rodillo de mano

Retropala,Ayudantes[4]

Retropala,Ayudantes[4]

Brigada de Topografia

Retroexcavadora

Retropala,Camion Volteo[5],Ayudantes[10]

Retropala,Ayudantes[10],Compactador manual[2],Rodillo de mano

Albañiles[2],Ayudantes[4],Varilleros[4],Carpinteros[2]

Albañiles[2],Ayudantes[4],Varilleros[4],Carpinteros[2]

Albañiles[2],Ayudantes[4],Varilleros[4],Carpinteros[4]

Albañiles[2],Ayudantes[4],Varilleros[4],Carpinteros[4]

Albañiles[2],Ayudantes[4],Varilleros[4],Carpinteros[4]

Albañiles[2],Ayudantes[4],Varilleros[4],Carpinteros[4]

Albañiles[2],Ayudantes[4]

Albañiles[2],Ayudantes[4]

Albañiles[2],Ayudantes[4]

Pintores[2]

Maestro de Plomeria,Plomeros[2],Ayudantes[2]

Albañiles[2],Ayudantes[4]

Brigada de Topografia

Ayudantes[4]

Ayudantes[2],Compactador manual

Camion de 6 m3

Albañiles[2],Ayudantes[4],Varilleros[2],Carpinteros[2]

Albañiles[2],Ayudantes[4],Varilleros[2],Carpinteros[2]

Albañiles[2],Ayudantes[4]

Albañiles[2],Ayudantes[4]

Albañiles[2],Ayudantes[4]

Pintores[2]

COACI

SANTIAGO, R.D.

CONSORCIO ACUEDUCTOS DEL CIBAO




AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO

INAPA-CCC-LPN-2022-0029

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A
176	G - RED DE DISTRIBUCIÓN DE GUANÁE	30 days	14/07/25	20/08/25																						
177	Preliminares	2 days	14/07/25	16/07/25																						
178	Replanteo y marcado de corte	2 days	14/07/25	16/07/25																						
179	Corte y Extracción de Asfalto	6 days	16/07/25	23/07/25																						
180	Corte de asfalto c=2" (ambos lados)	2 days	16/07/25	18/07/25																						
181	Extracción de asfalto c/equipo c=2"	3 days	18/07/25	22/07/25																						
182	Bote de material c/camión (d= de 5 km)	1 day	23/07/25	23/07/25																						
183	Movimiento de tierra	18 days	24/07/25	15/08/25																						
184	Excavación material compacto	8 days	24/07/25	02/08/25																						
185	Suministro y coloc. Asiento de arena	8 days	25/07/25	04/08/25																						
186	Relleno compactado	5 days	08/08/25	15/08/25																						
187	Suministro y colocación de tuberías	11 days	26/07/25	08/08/25																						
188	Suministro y colocación de tuberías Ø4" PV(4 days	4 days	26/07/25	31/07/25																						
189	Suministro y colocación de tuberías Ø3" PV(7 days	7 days	31/07/25	08/08/25																						
190	Reposición de Carpeta Asfáltica	2 days	15/08/25	18/08/25																						
191	Imprimación y colocación de asfalto	2 days	15/08/25	18/08/25																						
192	Limpieza Continua y Final	2 days	18/08/25	20/08/25																						
193	H - DEPÓSITO REGULADOR H.A. SUPER	47 days	15/08/25	13/10/25																						
194	Preliminares	4 days	15/08/25	20/08/25																						
195	Limpieza del área	2 days	15/08/25	18/08/25																						
196	Replanteo	2 days	18/08/25	20/08/25																						
197	Movimiento de tierra	28 days	20/08/25	24/09/25																						
198	Excavación material compacto	1 day	20/08/25	21/08/25																						
199	Relleno Compactado	2 days	19/09/25	22/09/25																						
200	Bote de Escombros	2 days	22/09/25	24/09/25																						
201	Hormigón Armado	23 days	21/08/25	18/09/25																						
202	Zapatatas	4 days	21/08/25	26/08/25																						
203	Losa de Fondo	3 days	04/09/25	08/09/25																						
204	Muros	7 days	26/08/25	04/09/25																						
205	Columnas	4 days	08/09/25	12/09/25																						
206	Vigas y Losas	5 days	12/09/25	18/09/25																						
207	Terminación de Superficie	10 days	27/09/25	10/10/25																						
208	Fino Losa de fondo	2 days	27/09/25	30/09/25																						
209	Pañete interior	4 days	30/09/25	06/10/25																						
210	Fino de techo	2 days	06/10/25	08/10/25																						
211	Pintura	2 days	08/10/25	10/10/25																						
212	Suministro e Instalación de Tuberías en Entrad:	6 days	04/09/25	11/09/25																						
213	Acera perimetral	2 days	11/09/25	13/09/25																						
214	Verja en Bloques de 6"	23 days	15/09/25	13/10/25																						
215	Replanteo	1 day	15/09/25	15/09/25																						
216	Movimiento de tierra	18 days	16/09/25	08/10/25																						
217	Excavación material compacto	5 days	16/09/25	22/09/25																						
218	Relleno de reposición	1 day	06/10/25	07/10/25																						
219	Bote de material	1 day	07/10/25	08/10/25																						
220	Hormigón Armado	11 days	22/09/25	06/10/25																						

José R. Romero



AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO
INAPA-CCC-LPN-2022-0029

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	N	D	J	F	M	A	M	J	Half 1, 2025	Half 2, 2025	J	A	S	O	N	D	Half 1, 2026	Half 2, 2026
221	Zapatas	3 days	22/09/25	25/09/25																		
222	Viga de Amarre SNP	3 days	01/10/25	06/10/25																		
223	Muros	5 days	25/09/25	01/10/25																		
224	Blocks 8" BNP	1 day	25/09/25	26/09/25																		
225	Blocks 6" SNP	4 days	26/09/25	01/10/25																		
226	Terminación de Superficie	4 days	06/10/25	10/10/25																		
227	Fraguache	1 day	06/10/25	07/10/25																		
228	Pañete en vigas y columnas	3 days	07/10/25	10/10/25																		
229	Pintura	2 days	10/10/25	13/10/25																		
230	I - RED DE DISTRIBUCIÓN DE CAÑADA	63 days	03/05/25	21/07/25																		
231	Preliminares	3 days	03/05/25	07/05/25																		
232	Replanteo y marcado de corte	3 days	03/05/25	07/05/25																		
233	Corte y Extracción de Asfalto	14 days	07/05/25	24/05/25																		
234	Corte de asfalto c=2" (ambos lados)	10 days	07/05/25	20/05/25																		
235	Extracción de asfalto c/equipo c=2"	2 days	20/05/25	22/05/25																		
236	Bote de material c/camión (d= 5 km)	2 days	22/05/25	24/05/25																		
237	Movimiento de tierra	41 days	22/05/25	12/07/25																		
238	Excavación material compacto	15 days	22/05/25	10/06/25																		
239	Suministro y coloc. Asiento de arena	15 days	23/05/25	11/06/25																		
240	Relleno compactado	10 days	30/06/25	12/07/25																		
241	Suministro y colocación de tuberías	15 days	11/06/25	30/06/25																		
242	Suministro y colocación de tuberías Ø6" PV	8 days	11/06/25	21/06/25																		
243	Suministro y colocación de tuberías Ø4" PV	2 days	21/06/25	24/06/25																		
244	Suministro y colocación de tuberías Ø3" PV	5 days	24/06/25	30/06/25																		
245	Reposición de Carpeta Asfáltica	4 days	12/07/25	17/07/25																		
246	Imprimación y colocación de asfalto	4 days	12/07/25	17/07/25																		
247	Limpieza Continua y Final	3 days	17/07/25	21/07/25																		
248	J - ESTACIÓN DE RELEVO EN DEPÓSITO	15 days	11/09/25	30/09/25																		
249	Electrificación Primaria y Secundaria	10 days	11/09/25	24/09/25																		
250	Suministro e instalación de bombas y accesorio:	5 days	24/09/25	30/09/25																		
251	K - LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE ESTA	31 days	22/09/25	30/10/25																		
252	Preliminares	2 days	22/09/25	24/09/25																		
253	Replanteo y marcado de corte	2 days	22/09/25	24/09/25																		
254	Corte y Extracción de Asfalto	5 days	24/09/25	30/09/25																		
255	Corte de asfalto c=2" (ambos lados)	2 days	24/09/25	26/09/25																		
256	Extracción de asfalto c/equipo c=2"	2 days	26/09/25	29/09/25																		
257	Bote de material c/camión (d= 5 km)	1 day	29/09/25	30/09/25																		
258	Movimiento de tierra	20 days	30/09/25	24/10/25																		
259	Excavación material compacto	10 days	30/09/25	13/10/25																		
260	Suministro y coloc. Asiento de arena	10 days	01/10/25	14/10/25																		
261	Relleno compactado	5 days	18/10/25	24/10/25																		
262	Suministro y colocación de tuberías	13 days	02/10/25	18/10/25																		
263	Suministro y colocación de tuberías Ø6" Ace	8 days	02/10/25	13/10/25																		
264	Suministro y colocación de tuberías Ø6" PV	5 days	13/10/25	18/10/25																		
265	Reposición de Carpeta Asfáltica	2 days	24/10/25	28/10/25																		

[Handwritten signature]



AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO

INAPA-CCC-LPN-2022-0029

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	N	D	Half 1, 2025	Half 2, 2025	Half 1, 2026	Half 2, 2026			
					J	F	M	A	M	J	J	A	
266	Imprimación y colocación de asfalto	2 days	24/10/25	28/10/25									Retropala, Rodillo de mano
267	Limpieza Continua y Final	2 days	28/10/25	30/10/25									Retropala, Ayudantes[4]
268	L - DEPÓSITO REGULADOR H.A. SUPER	53 days	23/07/25	26/09/25									
269	Preliminares	4 days	23/07/25	28/07/25									
270	Limpieza del área	2 days	23/07/25	24/07/25									
271	Replanteo	2 days	25/07/25	28/07/25									Brigada de Topografia
272	Movimiento de tierra	33 days	28/07/25	06/09/25									
273	Excavación material compacto	2 days	28/07/25	30/07/25									Camion Voltec[10], Retroexcavadora
274	Relleno Compactado	2 days	02/09/25	04/09/25									Retropala, Camion Volteo[5], Ayudantes[10]
275	Bote de Escombros	2 days	04/09/25	06/09/25									Retropala, Ayudantes[10], Compactador manual[2], Rodillo de mano
276	Hormigón Armado	27 days	30/07/25	02/09/25									
277	Zapatas	5 days	30/07/25	05/08/25									Albañiles[2], Ayudantes[4], Varilleros[2]
278	Losa de Fondo	4 days	15/08/25	20/08/25									Albañiles[2], Ayudantes[4], Varilleros[2], Carpinteros[2]
279	Muros	8 days	05/08/25	15/08/25									Albañiles[2], Ayudantes[4], Carpinteros[4], Varilleros[4]
280	Columnas	5 days	20/08/25	26/08/25									Albañiles[2], Ayudantes[4], Carpinteros[4], Varilleros[4]
281	Vigas y Losas	5 days	26/08/25	02/09/25									Albañiles[2], Ayudantes[4], Carpinteros[4], Varilleros[4]
282	Terminación de Superficie	13 days	10/09/25	26/09/25									
283	Fino Losa de fondo	3 days	10/09/25	13/09/25									Albañiles[2], Ayudantes[4]
284	Pañete interior	4 days	15/09/25	18/09/25									Albañiles[2], Ayudantes[4]
285	Fino de techo	3 days	19/09/25	23/09/25									Albañiles[2], Ayudantes[4]
286	Pintura	3 days	23/09/25	26/09/25									Pintores[2]
287	Suministro e Instalación de Tuberías en Entrad:	6 days	15/08/25	22/08/25									Maestro de Plomeria, Plomeros[2]
288	Acera perimetral	2 days	22/08/25	25/08/25									Albañiles[2], Ayudantes[4]
289	Verja en Bloques de 6"	26 days	25/08/25	26/09/25									
290	Replanteo	1 day	25/08/25	26/08/25									Brigada de Topografia
291	Movimiento de tierra	21 days	26/08/25	22/09/25									
292	Excavación material compacto	5 days	26/08/25	02/09/25									Ayudantes[4]
293	Relleno de reposición	1 day	19/09/25	19/09/25									Ayudantes[2], Compactador manual
294	Bote de material	1 day	20/09/25	22/09/25									Camion de 6 m3
295	Hormigón Armado	14 days	02/09/25	18/09/25									
296	Zapatas	4 days	02/09/25	06/09/25									Albañiles[2], Ayudantes[4], Varilleros[2]
297	Viga de Amarre SNP	4 days	15/09/25	18/09/25									Albañiles[2], Ayudantes[4], Varilleros[2], Carpinteros[2]
298	Muros	6 days	06/09/25	13/09/25									
299	Blocks 8" BNP	2 days	06/09/25	09/09/25									Albañiles[2], Ayudantes[4]
300	Blocks 6" SNP	4 days	09/09/25	13/09/25									Albañiles[2], Ayudantes[4]
301	Terminación de Superficie	4 days	19/09/25	24/09/25									
302	Fraguache	1 day	19/09/25	19/09/25									Albañiles[2], Ayudantes[4]
303	Pañete en vigas y columnas	3 days	20/09/25	24/09/25									Albañiles[2], Ayudantes[4]
304	Pintura	2 days	24/09/25	26/09/25									Pintores[2]
305	M - RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA SIERRA	44 days	18/10/25	12/12/25									
306	Preliminares	2 days	18/10/25	21/10/25									
307	Replanteo y marcado de corte	2 days	18/10/25	21/10/25									Brigada de Topografia
308	Corte y Extracción de Asfalto	11 days	21/10/25	04/11/25									
309	Corte de asfalto c=2" (ambos lados)	5 days	21/10/25	28/10/25									Cortadora de Asfalto[2]
310	Extracción de asfalto c/equipo c=2"	4 days	28/10/25	01/11/25									Retropala


Jose R. Romero



AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO

INAPA-CCC-LPN-2022-0029

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	N		D		Half 1, 2025		Half 2, 2025		Half 1, 2026		Half 2, 2026	
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
311	Bote de material c/camión (d= de 5 km)	2 days	01/11/25	04/11/25												
312	Movimiento de tierra	27 days	01/11/25	05/12/25												
313	Excavación material compacto	8 days	01/11/25	11/11/25												
314	Suministro y coloc. Asiento de arena	8 days	03/11/25	12/11/25												
315	Relleno compactado	4 days	01/12/25	05/12/25												
316	Suministro y colocación de tuberías	14 days	13/11/25	01/12/25												
317	Suministro y colocación de tuberías Ø6" PV 3 days		13/11/25	17/11/25												
318	Suministro y colocación de tuberías Ø4" PV 5 days		17/11/25	22/11/25												
319	Suministro y colocación de tuberías Ø3" PV 6 days		22/11/25	01/12/25												
320	Reposición de Carpeta Asfáltica	4 days	05/12/25	10/12/25												
321	Imprimación y colocación de asfalto	4 days	05/12/25	10/12/25												
322	Limpieza Continua y Final	2 days	10/12/25	12/12/25												

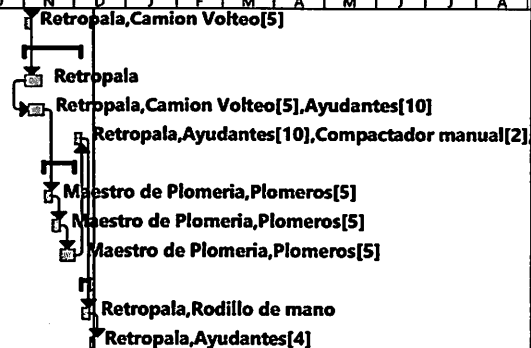

Jose R. Romero

