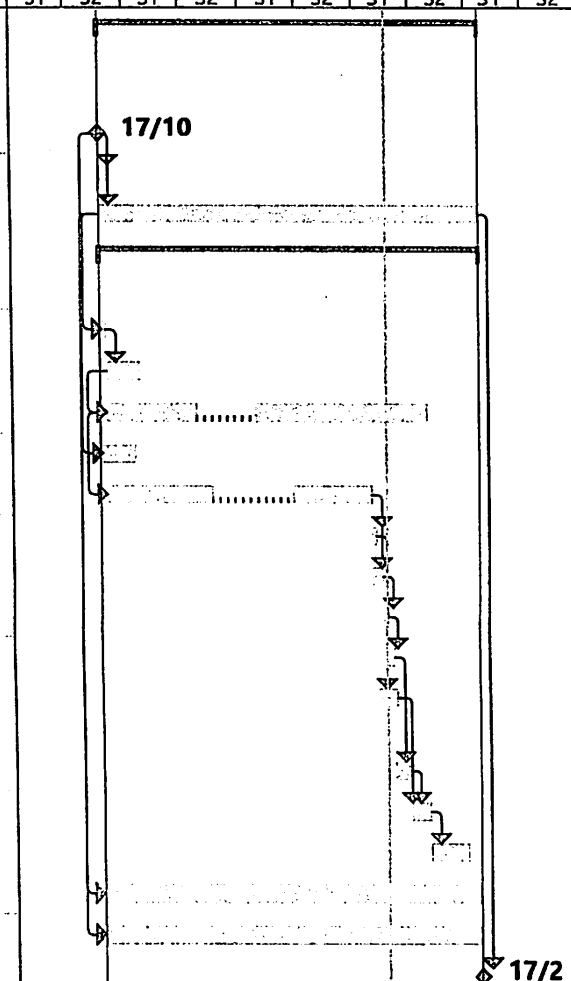


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2022		2023		2024		2025		2026	
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1	AMPLIACION ACUEDUCTO PARTIDO LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, RED DE DISTRIBUCION SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCIA	873 días	lun 17/10/22	mar 17/2/26										
2	INICIO	0 días	lun 17/10/22	lun 17/10/22										
3	VALLAN ANUNCIANDO OBRA	1 día	lun 17/10/22	lun 17/10/22										
4	CAMPAMENTO	873 días	lun 17/10/22	mar 17/2/26										
5	RED DE DISTRIBUCION SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCIA	873 días	lun 17/10/22	mar 17/2/26										
6	PRELIMINAR	10 días	lun 24/10/22	vie 4/11/22										
7	CORTE EXTRACCION Y BOTE DE CARPETA ASFALTICA	75 días	lun 7/11/22	vie 17/2/23										
8	MOVIMIENTO DE TIERRA	600 días	lun 7/11/22	lun 25/8/25										
9	SUMINISTRO DE TUBERIA	75 días	lun 24/10/22	vie 3/2/23										
10	COLOCACION DE TUBERIA	420 días	lun 7/11/22	vie 28/2/25										
11	PRUEBA HIDROSTATICA	10 días	lun 3/3/25	vie 14/3/25										
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES	25 días	lun 3/3/25	vie 4/4/25										
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS	10 días	lun 7/4/25	vie 18/4/25										
14	CRUCES	15 días	lun 21/4/25	vie 9/5/25										
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS DE POLIETILENO	45 días	lun 17/3/25	vie 16/5/25										
16	DEMOLICION DE ACERAS, CONTENES Y BOTE	35 días	lun 12/5/25	vie 27/6/25										
17	REPOSICION DE ACERAS Y CONTENES	45 días	lun 30/6/25	vie 29/8/25										
18	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA	90 días	lun 1/9/25	jue 1/1/26										
19	SEÑALIZACION, CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO	873 días	lun 17/10/22	mar 17/2/26										
20	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	873 días	lun 17/10/22	mar 17/2/26										
21	FIN	0 días	mar 17/2/26	mar 17/2/26										

D.º Leonardo A. Astibac

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2022		2023		2024		2025		2026	
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1	AMPLIACION ACUEDUCTO PARTIDO LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, RED DE DISTRIBUCION SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCIA	873 días	lun 17/10/22	mar 17/2/26										
2	INICIO	0 días	lun 17/10/22	lun 17/10/22										
3	VALLAN ANUNCIANDO OBRA	1 día	lun 17/10/22	lun 17/10/22										
4	CAMPAMENTO	873 días	lun 17/10/22	mar 17/2/26										
5	RED DE DISTRIBUCION SECTORES PARTIDO Y VILLA GARCIA	873 días	lun 17/10/22	mar 17/2/26										
6	PRELIMINAR	10 días	lun 24/10/22	vie 4/11/22										
7	CORTE EXTRACCION Y BOTE DE CARPETA ASFALTICA	75 días	lun 7/11/22	vie 17/2/23										
8	MOVIMIENTO DE TIERRA	600 días	lun 7/11/22	lun 25/8/25										
9	SUMINISTRO DE TUBERIA	75 días	lun 24/10/22	vie 3/2/23										
10	COLOCACION DE TUBERIA	420 días	lun 7/11/22	vie 28/2/25										
11	PRUEBA HIDROSTATICA	10 días	lun 3/3/25	vie 14/3/25										
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES	25 días	lun 3/3/25	vie 4/4/25										
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS	10 días	lun 7/4/25	vie 18/4/25										
14	CRUCES	15 días	lun 21/4/25	vie 9/5/25										
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS DE POLIETILENO	45 días	lun 17/3/25	vie 16/5/25										
16	DEMOLICION DE ACERAS, CONTENES Y BOTE	35 días	lun 12/5/25	vie 27/6/25										
17	REPOSICION DE ACERAS Y CONTENES	45 días	lun 30/6/25	vie 29/8/25										
18	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA	90 días	lun 1/9/25	jue 1/1/26										
19	SEÑALIZACION, CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO	873 días	lun 17/10/22	mar 17/2/26										
20	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	873 días	lun 17/10/22	mar 17/2/26										
21	FIN	0 días	mar 17/2/26	mar 17/2/26										

D^o Leonardo A. Astib

CRONOGRAMA DE OBRA (ADENDA # 4)
AMPLIACION ACUEDUCTO MULT. PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABON, RED DIST. PARTIDO Y VILLA GARCIA (LOTE E)-CONTRATO 100/2022

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	
1	AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA-...PROV.	106 días?	jue 30/5/24	jue 24/10/24	
2	PRESUPUESTO BASE 01/03/2022	169 días	jue 30/5/24	mar 21/1/25	
3	PRELIMINARES	7 días	jue 30/5/24	vie 7/6/24	
4	CORTE, EXTRACC. Y BOTE DE CARPETA ASF.	10 días	lun 3/6/24	vie 14/6/24	
5	MOVIMIENTO DE TIERRA	15 días	vie 7/6/24	jue 27/6/24	
6	SUMINISTRO TUBERIA	11 días	vie 7/6/24	vie 21/6/24	
7	COLOCACION DE TUBERIA	15 días	jue 20/6/24	lun 22/7/24	
8	PRUEBA HIDROSTATICA	17 días	lun 5/8/24	vie 6/9/24	
9	SUMIN. Y COLOC. DE PIEZAS ESPECIALES	11 días	lun 8/7/24	lun 22/7/24	
10	CRUCES	16 días	jue 11/7/24	jue 1/8/24	
11	SUMIN. Y COLOC. DE ACOMETIDAS POLIETILENO	13 días	lun 15/7/24	mié 31/7/24	
12	DEMOLICION ACERA	7 días	lun 3/6/24	mar 11/6/24	
13	REPOSICION ACERA	11 días	lun 10/6/24	lun 24/6/24	
14	REPOSICION CARPETA AFALTICA	15 días	mié 1/1/25	mar 21/1/25	
15	SEÑALIZACION, CONTROL Y MAN. TRANS	36 días	jue 30/5/24	jue 17/10/24	
16	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	33 días	mié 10/7/24	lun 30/12/24	
17	VARIOS (VALLA)	12 días	jue 30/5/24	jue 27/6/24	
18	CAMPAMENTO	30 días	lun 3/6/24	jue 8/8/24	
19	AUMENTO DE CANTIDAD -PRESUP. ACTUALIZADO No. 1 -	20 días	vie 14/6/24	jue 11/7/24	
20	PRELIMINARES	3 días	vie 14/6/24	mar 18/6/24	
21	CORTE Y EXTRACCION DE CARPETA ASFALTICA	15 días	mié 19/6/24	mar 9/7/24	
22	MOVIMIENTO DE TIERRA	18 días	mié 10/7/24	vie 2/8/24	
23	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA	10 días	sáb 21/12/24	jue 2/1/25	
24	SEÑALIZACION, CONTROL Y MAN. TRANS	12 días	lun 29/7/24	mar 13/8/24	
25	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	44 días	mié 7/8/24	lun 18/11/24	
26	NUEVAS PARTIDAS -PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1-	115 días	vie 7/6/24	jue 14/11/24	
27	SUMINISTRO DE TUBERIA	6 días	lun 5/8/24	lun 12/8/24	
28	COLOCACION DE TUBERIA	5 días	lun 12/8/24	vie 16/8/24	
29	PRUEBA HIDROSTATICA	19 días	lun 9/9/24	jue 14/11/24	
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES	8 días	lun 19/8/24	mié 28/8/24	
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS	6 días	sáb 21/9/24	vie 27/9/24	
32	SUMIN. Y COLOC. DE ACOMETIDAS POLIETILENO	5 días	lun 19/8/24	vie 23/8/24	
33	PRELIMINARES (CATEOS EN TUBERIAS 6" PVC)	6 días	vie 7/6/24	vie 14/6/24	
34	MOV.DE TIERRA (EXC. EN ROCA)	8 días	mié 24/7/24	vie 2/8/24	
35	REPOS. DE TUBERIAS ROTAS DURANTE EXCAV.	14 días	vie 28/6/24	vie 1/11/24	
36	DEMOLICION DE: PUENTE BADEN... ENCACHE...	11 días	vie 28/6/24	vie 26/7/24	
37	REPOSICION DE: PUENTE BADEN..ENCACHE..	12 días	lun 29/7/24	mar 13/8/24	
38	AUMENTO DE CANTIDAD-PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 2 -	105 días	lun 26/8/24	vie 17/1/25	
39	CORTE, EXTRACC. Y BOTE DE CARPETA ASF.	7 días	lun 26/8/24	mar 3/9/24	
40	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA	13 días	mié 1/1/25	vie 17/1/25	
41	NUEVAS PARTIDAS-PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 2 -	28 días	mié 14/8/24	vie 20/9/24	
42	CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø 3" ACERO	8 días	lun 19/8/24	mié 28/8/24	
43	CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø 6" ACERO	13 días	vie 30/8/24	mar 17/9/24	
44	REPOSICION DE TUBERIAS EXISTENTES AFECTADAS	5 días	lun 16/9/24	vie 20/9/24	
45	HORM. S. PARA FIJACION DE CAJAS REGISTRADORAS	25 días	jue 21/11/24	mié 25/12/24	
46	PRESUPUESTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO-MAYO-2024				
47	PARTIDAS NO CUBICADAS-FASE A				
48	PARTIDAS CUBICADAS-FASE A				
49	AUMENTO DE CANTIDAD-PRESUPUESTO ACTUALIZADO No.4 -	105 días	mar 20/8/24	lun 13/1/25	
50	CAMPAMENTO	90 días	mar 20/8/24	lun 23/12/24	
51	NUEVAS PARTIDAS (TUBERIA DESAGUES DE 6")	17 días	sáb 21/12/24	lun 13/1/25	
52	GASTOS INDIRECTOS	125 días	jue 1/8/24	mié 22/1/25	



CRONOGRAMA DE TRABAJOS A REALIZAR ADENDA No.03/2024																	
Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón , Zona I ,No. SNIP 14756 - Lote K - Red De Distribución Sector Los Babosos																	
No	Actividad	Fecha de Inicio	Cantidad a realizar	Fecha final	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25
A	RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR LOS BABOSOS																
2.0	CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA (LONG. 1,342.60M)																
2.1	Corte de Asfalto e=2" (2 lados)	Oct-24	2885.20 M	Oct-25													
2.2	Remoción de carpeta Asfáltica	Oct-24	934.62 M²	Oct-25													
2.3	Bote material Asfáltico c/camión (incluye esparcimiento en lugar de botadero)	Oct-24	61.72 M³	Oct-25													
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS DE POLIETILENO (SEGÚN DETALLES DE DISEÑO):																
9.0	ACOMETIDAS URBANAS Y RURALES																
9.1.3	Acometidas Rurales de Ø3"	Oct-24	31.00 Ud	Oct-25													
9.1.4	Acometidas Rurales de Ø4"	Oct-24	19.00 Ud	Oct-25													



Preparado por: Ing. Cristian Tavárez Gabino

Id	i	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2022	2023	2024	2025	2026	
							S1	S2	S1	S2	S1	S2
1			AMPLIACION ACUEDUCTO PARTIDO LA GORRA, PROVINCIA DAJABON, RED DE DISTRIBUCION SECTOR HATICO VIEJO	783 días	jue 13/10/22	lun 13/10/25						
2			INICIO	0 días	jue 13/10/22	jue 13/10/22						
3			VALLAN ANUNCIANDO OBRA	1 día	jue 13/10/22	jue 13/10/22						
4			CAMPAMENTO	783 días	jue 13/10/22	lun 13/10/25						
5			RED DE DISTRIBUCION SECTOR HATICO VIEJO	783 días	jue 13/10/22	lun 13/10/25						
6			PRELIMINAR	10 días	jue 20/10/22	mié 2/11/22						
7			CORTE EXTRACCION Y BOTE DE CARPETA ASFALTICA	90 días	jue 3/11/22	mié 8/3/23						
8			MOVIMIENTO DE TIERRA	600 días	jue 3/11/22	jue 21/8/25						
9			SUMINISTRO DE TUBERIA	75 días	jue 20/10/22	mié 1/2/23						
10			COLOCACION DE TUBERIA	380 días	jue 3/11/22	mié 1/1/25						
11			PRUEBA HIDROSTATICA	10 días	jue 2/1/25	mié 15/1/25						
12			SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES	25 días	jue 2/1/25	mié 5/2/25						
13			CRUCES	15 días	jue 6/2/25	mié 26/2/25						
14			SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDAS DE POLIETILENO	45 días	jue 16/1/25	mié 19/3/25						
15			DEMOLICION DE ACERAS, CONTENES Y BOTE	35 días	jue 27/2/25	mié 16/4/25						
16			REPOSICION DE ACERAS Y CONTENES	35 días	jue 17/4/25	mié 4/6/25						
17			REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA	60 días	jue 5/6/25	mié 27/8/25						
18			SEÑALIZACION, CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO	783 días	jue 13/10/22	lun 13/10/25						
19			LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	783 días	jue 13/10/22	lun 13/10/25						
20			FIN	0 días	lun 13/10/25	lun 13/10/25						

Bejans

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre
1	Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón, Zona I. No. SNIP 14766 - Lote T - Línea de	11/10/24	14/10/25															
2	PRELUMINAR	11/10/24	25/10/24															
3	Replanteo	11/10/24	25/10/24															
4	CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA (L=4,455.00 M)	11/10/24	31/10/24															
5	Corte de Asfalto e=2 (2 lados)	11/10/24	31/10/24															
6	Remoción de carpeta Asfáltica	11/10/24	30/10/24															
7	Bote material Asfáltico c/camión (Incluye esparcimiento en de botadero)	11/10/24	21/10/24															
8	MOVIMIENTO DE TIERRA	11/10/24	11/7/25															
9	Excavación material compacto c/equipo	11/10/24	28/5/25															
10	Asiento de arena (Suministro y colocación)	11/10/24	22/5/25															
11	Suministro de material de mina (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión)	11/10/24	21/5/25															
12	Suministro de material de base (Sujeto aprobación por la supervisión)	11/10/24	11/7/25															
13	Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m	11/10/24	11/7/25															
14	Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero)	11/10/24	11/7/25															
15	SUMINISTRO DE TUBERÍA:	11/10/24	11/7/25															
16	De 08" PVC (SDR-26) c/J. G. + 3% pérdida por campana	11/10/24	11/7/25															
17	COLOCACIÓN DE TUBERÍA:	4/11/24	4/8/25															
18	De 08" PVC (SDR-26) c/J. G.	4/11/24	4/8/25															
19	PRUEBA HIDROSTÁTICA	18/11/24	18/8/25															
20	De 08" PVC (SDR-26) c/J. G.	18/11/24	18/8/25															
21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE:	5/11/24	5/8/25															
22	ACERO SCH-40 (c/protección anticorrosiva):	5/11/24	5/8/25															
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS	5/11/24	5/8/25															
24	Suministro y colocación de válvulas, caja telescópica y registros	5/11/24	5/8/25															
25	CÁMARA PARTIDORA DE PRESIÓN DE H.A. (2.80M x 6.10M x 2.07M) EN TUBERÍA DE 8"	11/11/24	14/4/25															
26	Incluye movimiento de tierra, terminación de superficie, válvulas, cajas telescópicas, piezas, tuberías, juntas mecánicas tipo Dresser y mano de obra) (Según detalle de diseño)	11/11/24	14/4/25															
27	CRUCES:	13/11/24	9/12/24															
28	CRUCE DE PUENTE EN TUBERÍA DE 08" ACERO SCH -40 L=20.00 M (1 UD)	13/11/24	9/12/24															
29	REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	11/10/24	11/9/25															
30	Imprimación sencilla	11/10/24	10/7/25															
31	Suministro y colocación de Asfalto e=2 (Incluye Riego de Adherencia)	12/12/24	11/9/25															
32	Transporte de asfalto, Distancia = 127 km aprox.	11/12/24	10/9/25															
33	SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO	11/10/24	13/10/25															
34	(Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gls pintados amarillo tráfico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelos y casc	11/10/24	13/10/25															

Proyecto: Palacio Barahona Lot Fecha: 3/3/25	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre
35	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	11/10/24	13/10/25															
36	(Incluye obreros, camión y herramientas menores)	11/10/24	13/10/25															
37	VARIOS	14/10/24	14/10/25															
38	VALLA anunciando obra 16' x 10' impresión full color conteniendo logo de INAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1/2"x 1 1/2' y soportes en tubo cuadrado 4"X4"	14/10/24	14/10/25															
39	CAMPAMENTO (Incluye alquiler de casa o solar y caseta de materiales)	14/10/24	14/10/25															

Proyecto: Palacio Barahona Lot
Fecha: 3/3/25

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto



Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración



Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas



Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual



Zony Orrellán

