


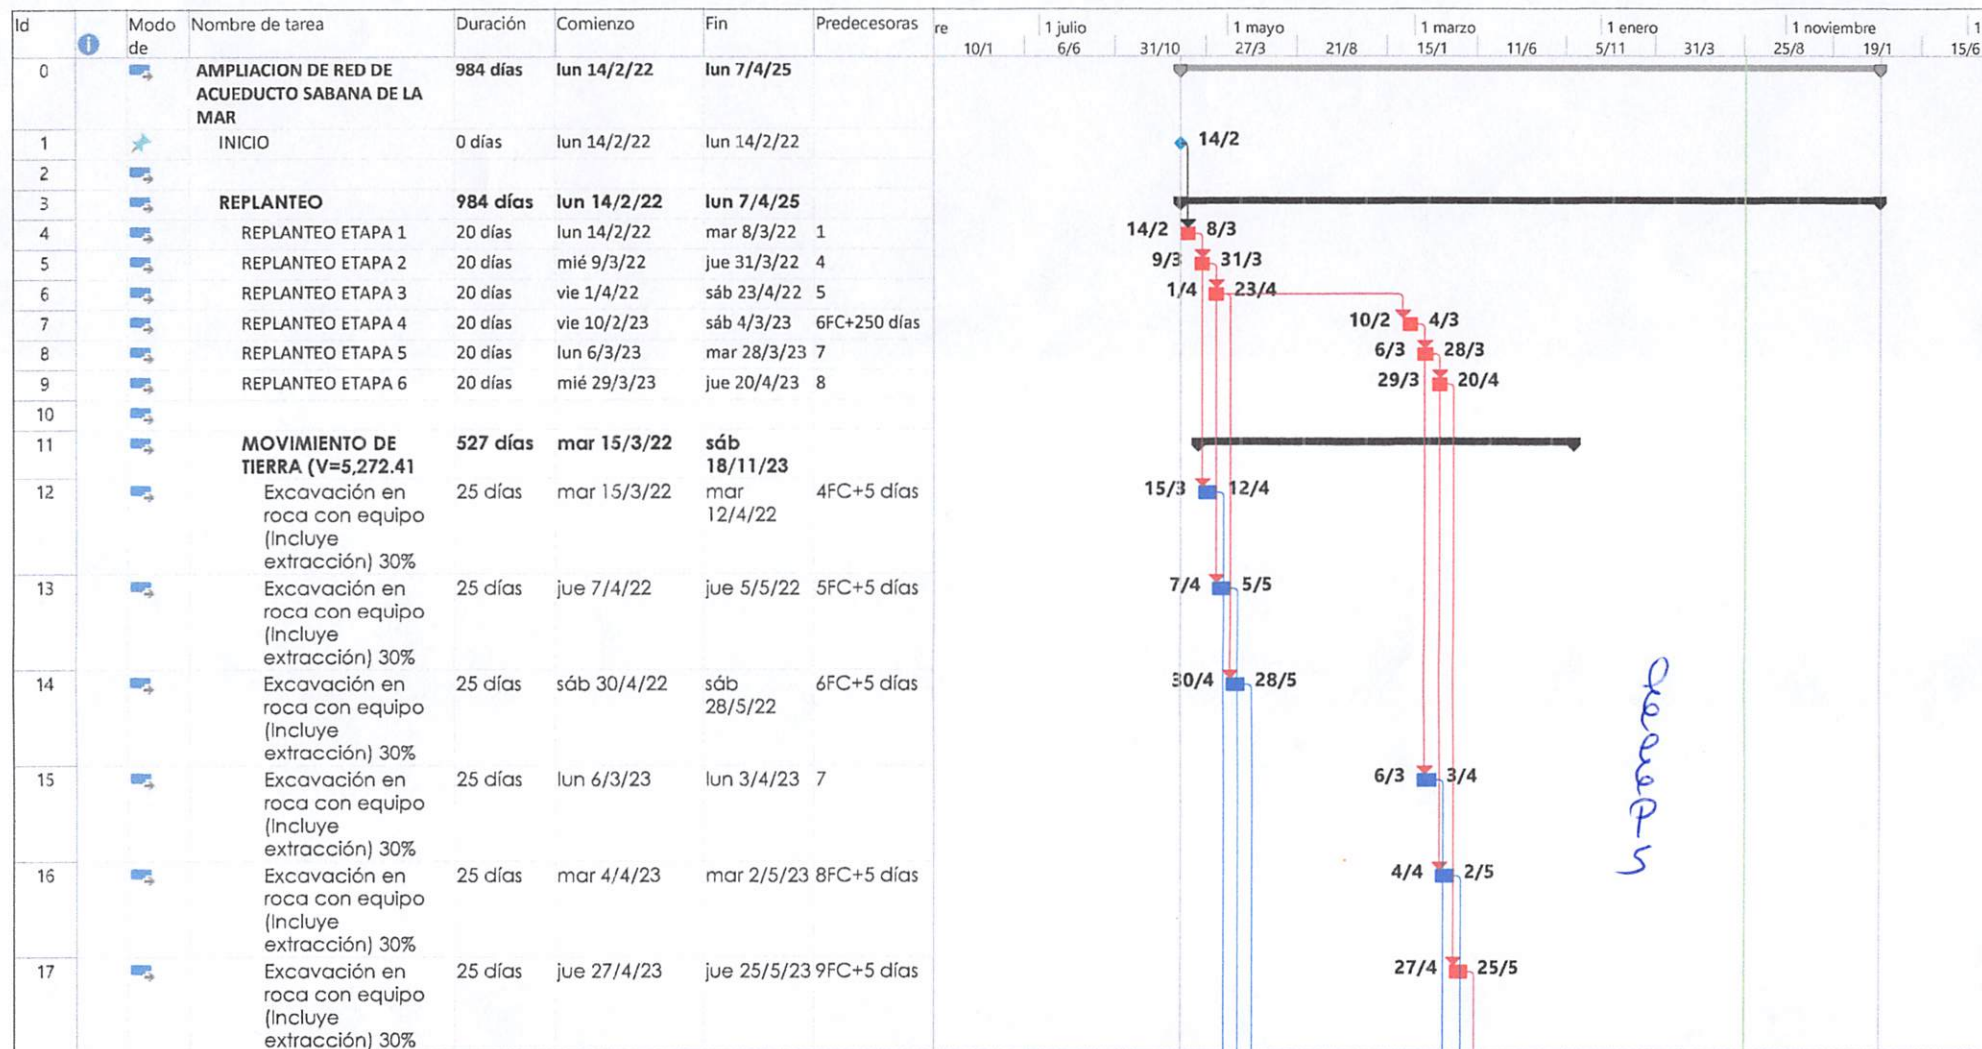


Proyecto: AMPLIACION DE RED Fecha: mié 28/8/24	Tarea		Tarea resumida		Tarea inactiva		Resumen manual	
	División		Tarea crítica resumida		Hito inactivo		solo el comienzo	
	Hito		Hito resumido		Resumen inactivo		solo fin	
	Resumen		Progreso resumido		Tarea manual		Fecha límite	
	Resumen del proyecto		Tareas externas		solo duración		Tarea crítica	
	Agrupar por síntesis		Hito externo		Informe de resumen manual		Progreso	

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	re	1 julio	1 mayo	1 marzo	1 enero	1 noviembre	1
								10/1	6/6	31/10	27/3	21/8	15/1
43		Bote de material con camión d= 13 km, incluye carguio y esparcimiento de material en lugar de bote Etapa 2	15 días	jue 16/6/22	sáb 2/7/22	19FC+5 días							
44		Bote de material con camión d= 13 km, incluye carguio y esparcimiento de material en lugar de bote Etapa 3	15 días	sáb 9/7/22	mar 26/7/22	20FC+5 días							
45		Bote de material con camión d= 13 km, incluye carguio y esparcimiento de material en lugar de bote Etapa 4	15 días	lun 15/5/23	mié 31/5/23	21FC+5 días							
46		Bote de material con camión d= 13 km, incluye carguio y esparcimiento de material en lugar de bote Etapa 5	15 días	mar 13/6/23	jue 29/6/23	22FC+5 días							
47		Bote de material con camión d= 13 km, incluye carguio y esparcimiento de material en lugar de bote Etapa 6	15 días	jue 6/7/23	sáb 22/7/23	23FC+5 días							
48													
49		SUMINISTRO DE TUBERI/372 días	372 días	mar 28/6/22	lun 4/9/23								
50		De Ø 6" PVC SDR-26 C/ J.G. +3% pérdida por campana Etapa 1	7 días	mar 28/6/22	mar 5/7/22	24FC+5 días							
51		De Ø 6" PVC SDR-26 C/ J.G. +3% pérdida por campana Etapa 2	7 días	jue 21/7/22	jue 28/7/22	25FC+5 días							

Proyecto: AMPLIACION DE RED
Fecha: mié 28/8/24

Tarea		Tarea resumida		Tarea inactiva		Resumen manual	
División		Tarea crítica resumida		Hito inactivo		solo el comienzo	
Hito		Hito resumido		Resumen inactivo		solo fin	
Resumen		Progreso resumido		Tarea manual		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Tareas externas		solo duración		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Hito externo		Informe de resumen manual		Progreso	

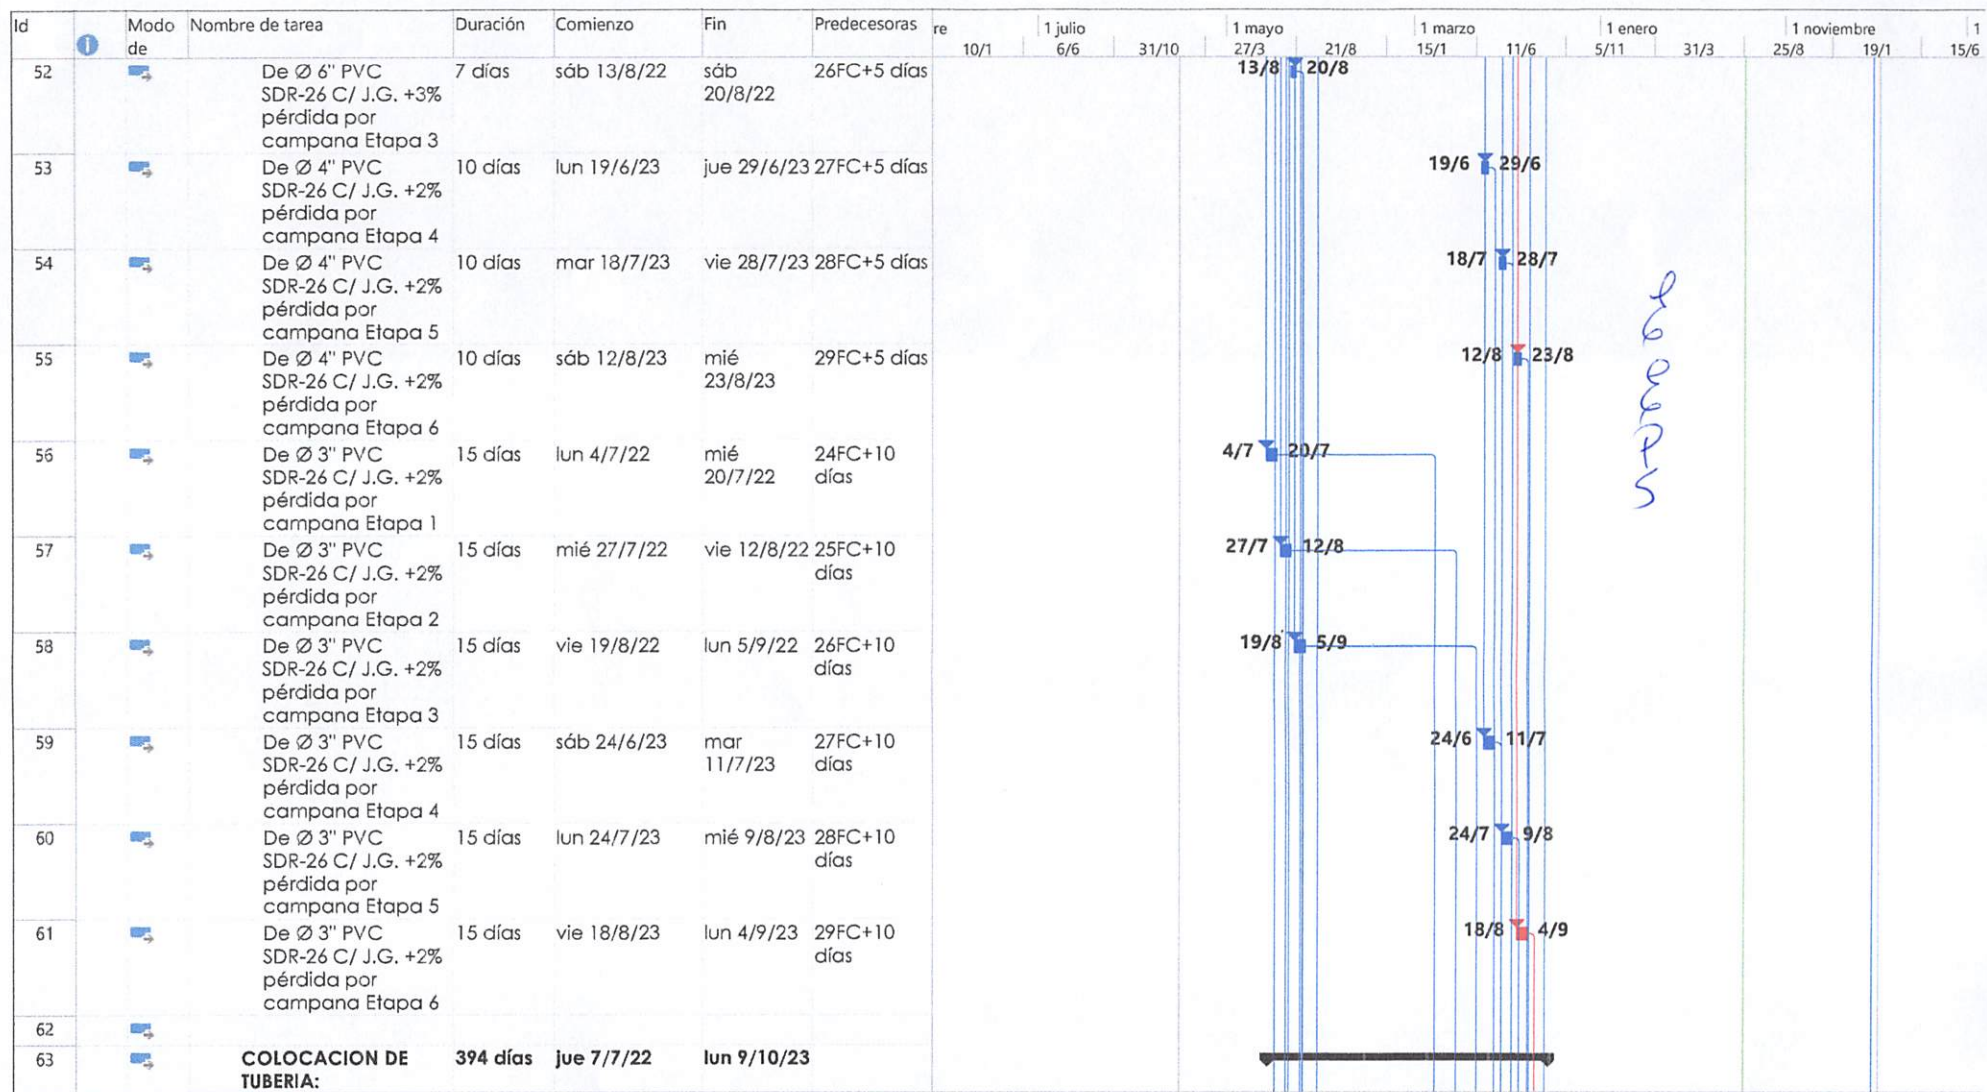

Proyecto: AMPLIACION DE RED
Fecha: mié 28/8/24

Tarea		Tarea resumida		Tarea inactiva		Resumen manual	
División		Tarea crítica resumida		Hito inactivo		solo el comienzo	
Hito		Hito resumido		Resumen inactivo		solo fin	
Resumen		Progreso resumido		Tarea manual		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Tareas externas		solo duración		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Hito externo		Informe de resumen manual		Progreso	

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	re	10/1	1 julio 6/6	31/10	1 mayo 27/3	21/8	1 marzo 15/1	11/6	1 enero 5/11	31/3	1 noviembre 25/8	19/1	15/6
79		Suministro y colocacion de piezas especiales. Incluyen: Tee, Codos, Cruces, Reducciones, Juntas mecanicas	6 días	sáb 21/10/23	vie 27/10/23	75FC+10 días								21/10	27/10				
80																			
81		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS	342 días	lun 3/10/22	sáb 4/11/23														
82		Válvula de compuerta Ø 3" HF platillada completa (150 PSI) (Incluye: Válvula platillada, tornillos, juntas de goma, niple platillado, junta Dresser)	2 días	sáb 28/10/23	lun 30/10/23	79								28/10	30/10				
83		Válvula de compuerta Ø 4" HF platillada completa (150 PSI) (Incluye: Válvula platillada, tornillos, juntas de goma, niple platillado, junta Dresser)	2 días	mié 11/10/23	jue 12/10/23	78								11/10	12/10				
84		Válvula de compuerta Ø 6" HF platillada completa (150 PSI) (Incluye: Válvula platillada, tornillos, juntas de goma, niple platillado, junta Dresser)	2 días	lun 3/10/22	mar 4/10/22	77						3/10	4/10						
85		Caja telescópica para válvulas (Incluye base y	5 días	mar 31/10/23	sáb 4/11/23	84;82;83								31/10	4/11				
86																			
87		PRUEBA HIDROSTATICA 30 días		lun 6/11/23	sáb 9/12/23														


revisar

Proyecto: AMPLIACION DE RED Fecha: mié 28/8/24	Tarea		Tarea resumida		Tarea inactiva		Resumen manual	
	División		Tarea crítica resumida		Hito inactivo		solo el comienzo	
	Hito		Hito resumido		Resumen inactivo		solo fin	
	Resumen		Progreso resumido		Tarea manual		Fecha límite	
	Resumen del proyecto		Tareas externas		solo duración		Tarea crítica	
	Agrupar por síntesis		Hito externo		Informe de resumen manual		Progreso	

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	re	1 julio	1 mayo	1 marzo	1 enero	1 noviembre	1						
								10/1	6/6	31/10	27/3	21/8	15/1	11/6	5/11	31/3	25/8	19/1	15/6
88		Tubería de Ø 3" PVC SDR-26 C/ J.G	30 días	lun 6/11/23	sáb 9/12/23	85						6/11	9/12						
89		Tubería de Ø 4" PVC SDR-26 C/ J.G	25 días	lun 6/11/23	lun 4/12/23	85						6/11	4/12						
90		Tubería de Ø 6" PVC SDR-26 C/ J.G	20 días	lun 6/11/23	mar 28/11/23	85						6/11	28/11						
91																			
92		CRUCE DE ALCANTARILLA Ø 6" ACERO L=3.00 M (1 UD), C/PROTECCION ANTICORROSIVA	6 días	lun 5/6/23	sáb 10/6/23														
93		Suministro de tubería de Ø 6"	1 día	mié 7/6/23	mié 7/6/23	97						7/6	7/6						
94		Codo Ø6"x45 acero SCH-40, con protección anticorrosiva .	1 día	jue 8/6/23	jue 8/6/23	93						8/6	8/6						
95		Junta mecánica tipo dresser Ø6"	1 día	vie 9/6/23	vie 9/6/23	94						9/6	9/6						
96		Anclajes H.S	1 día	sáb 10/6/23	sáb 10/6/23	95						10/6	10/6						
97		Excavación material no clasificado a mano	2 días	lun 5/6/23	mar 6/6/23	65FC+250 días						5/6	6/6						
98		Relleno compactado @	2 días	mié 7/6/23	jue 8/6/23	97						7/6	8/6						
99		Bote de material In Situ (0.32 m3)	1 día	vie 9/6/23	vie 9/6/23	98						9/6	9/6						
100																			
101		CRUCE DE CAÑADA Ø3" ACERO L=6.00 M	7 días	mar 10/10/23	mar 17/10/23														
102		Suministro de tubería Ø3" acero sch-80, c/protección	2 días	mar 10/10/23	mié 11/10/23	75						10/10	11/10						
103		Codos de Ø3" x 45 acero sch-80, c/protección anticorrosiva	1 día	jue 12/10/23	jue 12/10/23	102						12/10	12/10						
104		Junta mecánica tipo dresser Ø3"	1 día	vie 13/10/23	vie 13/10/23	103						13/10	13/10						
105		Anclajes H.S	1 día	sáb 14/10/23	sáb 14/10/23	104						14/10	14/10						

Proyecto: AMPLIACION DE RED
Fecha: mié 28/8/24

Tarea		Tarea resumida		Tarea inactiva		Resumen manual	
División		Tarea crítica resumida		Hito inactivo		solo el comienzo	
Hito		Hito resumido		Resumen inactivo		solo fin	
Resumen		Progreso resumido		Tarea manual		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Tareas externas		solo duración		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Hito externo		Informe de resumen manual		Progreso	

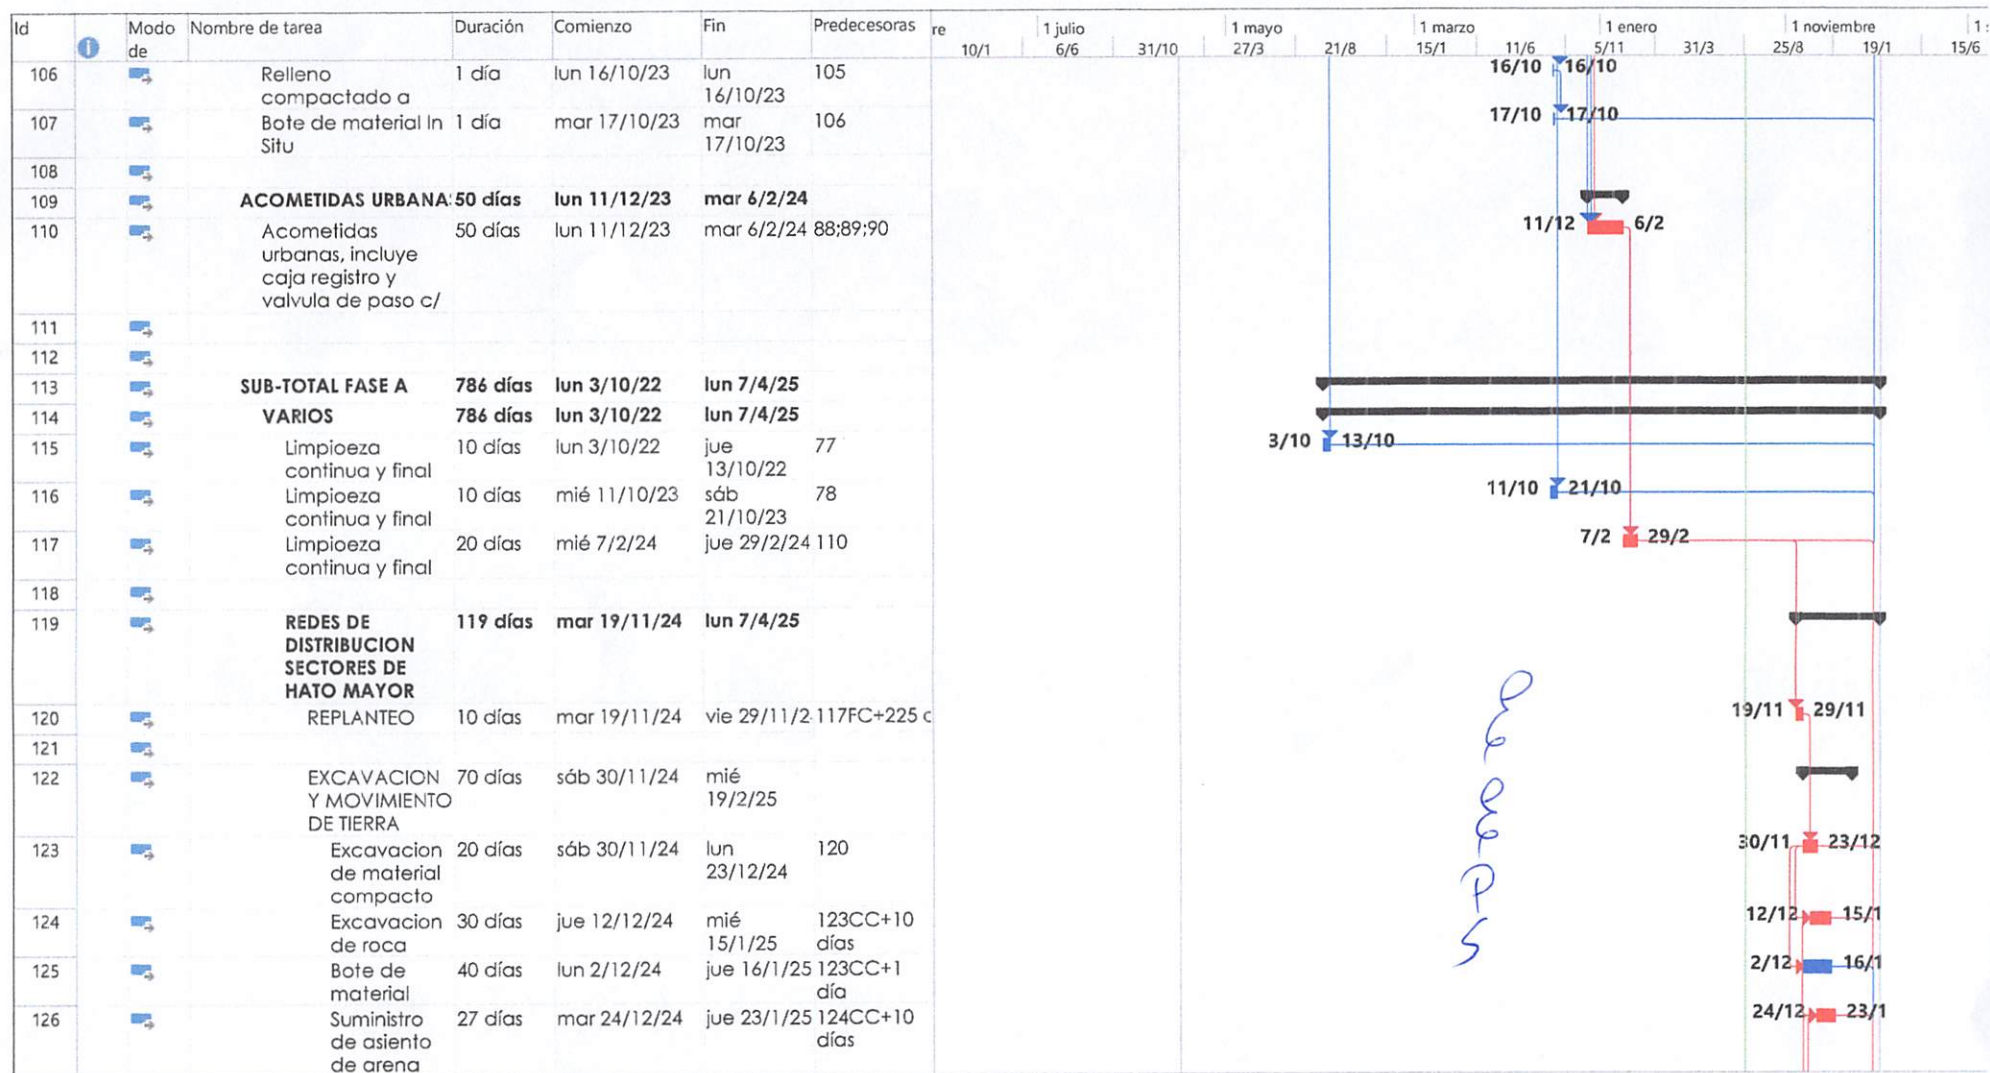

Proyecto: AMPLIACION DE RED
Fecha: mié 28/8/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis

Tarea resumida
Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido
Tareas externas
Hito externo

Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual

Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso

Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Fecha límite
Tarea crítica
Progreso

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	re	1 julio	31/10	1 mayo	21/8	1 marzo	11/6	1 enero	31/3	1 noviembre	1
127		Siministro de material de mina	40 días	mar 31/12/24	vie 14/2/25	131CC+5 días		10/1	6/6							31/12	14/2
128		Compactaci de material de mina	42 días	jue 2/1/25	mié 19/2/25	127CC+2 días										2/1	19/2
129																	
130		COLOCACION DE TUBERIA:	37 días	mié 25/12/24	mié 5/2/25												
131		De Ø 4" PVC SDR-26 C/ J.G. Etapa 5	10 días	mié 25/12/24	sáb 4/1/25	126CC+1 día										25/12	4/1
132		De Ø 3" PVC SDR-26 C/ J.G. Etapa 6	30 días	jue 2/1/25	mié 5/2/25	126CC+8 días										2/1	5/2
133																	
134		PRUEBA HIDROSTATICA	20 días	mié 5/3/25	jue 27/3/25												
135		De Ø 4" PVC SDR-26 C/ J.G. Etapa 5	5 días	mié 5/3/25	lun 10/3/25	147										5/3	10/3
136		De Ø 3" PVC SDR-26 C/ J.G. Etapa 6	15 días	mar 11/3/25	jue 27/3/25	135										11/3	27/3
137																	
138		SUMINISTRO Y COLOCACION DE	20 días	jue 6/2/25	vie 28/2/25												
139		Suministro y colocacion de piezas	20 días	jue 6/2/25	vie 28/2/25	131;132										6/2	28/2
140																	
141		COLOCACION DE	20 días	jue 6/2/25	vie 28/2/25												
142		Suministro y colocacion de acometidas	20 días	jue 6/2/25	vie 28/2/25	131;132										6/2	28/2
143																	
144		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS	3 días	sáb 1/3/25	mar 4/3/25												

6665

Proyecto: AMPLIACION DE RED

Fecha: mié 28/8/24

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Fecha límite

Tarea crítica

Progreso

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	re	1 julio	1 mayo	1 marzo	1 enero	1 noviembre	1 :	
								10/1	6/6	31/10	27/3	21/8	15/1	11/6
145		Válvula de compuerta Ø 3" HF platillada completa (150 PSI) (Incluye: Válvula platillada, tornillos, juntas de goma, niple	1 día	sáb 1/3/25	sáb 1/3/25	142							1/3	1/3
146		Válvula de compuerta Ø 4" HF platillada completa (150 PSI) (Incluye: Válvula platillada, tornillos, juntas de goma, niple	1 día	sáb 1/3/25	sáb 1/3/25	142							1/3	1/3
147		Válvula de compuerta Ø 12" HF platillada completa (150 PSI) (Incluye: Válvula platillada, tornillos, juntas de	1 día	mar 4/3/25	mar 4/3/25	148							4/3	4/3
148		Construcción de registro de válvula de Ø 12"	2 días	sáb 1/3/25	lun 3/3/25	142							1/3	1/3
149														
150		LIMPIEZA FINAL	8 días	vie 28/3/25	lun 7/4/25									
151		Limpieza final etapa 4	8 días	vie 28/3/25	sáb 5/4/25	135;136							28/3	5/4

P-15

Proyecto: AMPLIACION DE RED
Fecha: mié 28/8/24

Tarea		Tarea resumida		Tarea inactiva		Resumen manual	
División		Tarea crítica resumida		Hito inactivo		solo el comienzo	
Hito		Hito resumido		Resumen inactivo		solo fin	
Resumen		Progreso resumido		Tarea manual		Fecha límite	
Resumen del proyecto		Tareas externas		solo duración		Tarea crítica	
Agrupar por síntesis		Hito externo		Informe de resumen manual		Progreso	

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	re	1 julio	1 mayo	1 marzo	1 enero	1 noviembre	1 :
								10/1	6/6	31/10	27/3	21/8	15/1
152													
153		FIN	0 días	lun 7/4/25	lun 7/4/25	30;31;32;33;34							5/4

Emmanuel

Proyecto: AMPLIACION DE RED Fecha: mié 28/8/24	Tarea		Tarea resumida		Tarea inactiva		Resumen manual	
	División		Tarea crítica resumida		Hito inactivo		solo el comienzo	
	Hito		Hito resumido		Resumen inactivo		solo fin	
	Resumen		Progreso resumido		Tarea manual		Fecha límite	
	Resumen del proyecto		Tareas externas		solo duración		Tarea crítica	
	Agrupar por síntesis		Hito externo		Informe de resumen manual		Progreso	
