


RECONSTRUCCIÓN CRUCE DE RÍO NIGUA DE LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø20" ACERO (SCH-20) CAMPO DE POZO ACUEDUCTO DE HAINA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2020				
					Sep	4th Quarter Oct	Nov	Dec	1st Quarter Jan
1	RECONSTRUCCIÓN CRUCE DE RÍO NIGUA DE LÍNEA DE IMP Ø20" ACERO (SCH-20) CAMPO DE POZO AC DE HAINA	66 days?	Tue 01/10/19	Tue 31/12/19					
2	INICIO	0 days	Tue 01/10/19	Tue 01/10/19					
3	VALLA ANUNCIANDO OBRA	1 day?	Tue 01/10/19	Tue 01/10/19					
4	CAMPAMENTO	1 day?	Wed 02/10/19	Wed 02/10/19					
5	CONSTRUCCION CRUCE DE RIO NIGUA EN TUBERIA Ø20" ACERO (D/REG. VALV. 20" EXIST. H/TUB. 20 EXIST.)	64 days	Thu 03/10/19	Tue 31/12/19					
6	TRABAJOS PRELIMINARES	5 days	Thu 03/10/19	Wed 09/10/19					
7	MURO DE GAVIONES	8 days	Thu 03/10/19	Mon 14/10/19					
8	MOVIMIENTO DE TIERRA	50 days	Tue 15/10/19	Mon 23/12/19					
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE Ø20" ACERO SCH-20 S/COSTURA	48 days	Thu 17/10/19	Mon 23/12/19					
10	CONSTRUCCION DE ANCLAJES	45 days	Thu 17/10/19	Wed 18/12/19					
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS	5 days	Tue 24/12/19	Mon 30/12/19					
12	PRUEBAS HIDROTASTICA	1 day	Tue 31/12/19	Tue 31/12/19					
13	FIN	0 days	Tue 31/12/19	Tue 31/12/19					

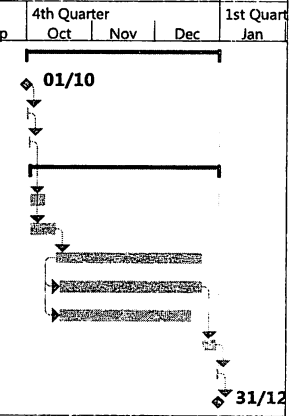

Project: CRONOGRAMA RIO NI	Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
	Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
	Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
	Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			
