


REDES VILLA GUERRERO

REDES VILLA GUERRERO COMPRENDIDA (INAPA) ENTR.....	468 días	18 /01/2022 -18/07/2023	\$6,804,338.77
Replanteo	145 días	19/01/2022 -07/07/2022	\$37,233.20
Replanteo Y Control topografico para tuberías de 4"	145 días	19/01/2022 -07/07/2022	\$37,233.20
Movimiento de tierra	463 días	24/01/2022 -18/07/2023	\$1,790,610.85
Excavacion con clasificacion	202 días	24/01/2022 - 16/09/2022	\$821,044.49
Excavacion material compacto con equipo (Retr..	148 días	24/01/2022 - 15/07/2022	\$199,152.57
Excavacion material compacto con equipo (Retr..	54 días	15/07/2022-16/09/2022	\$621,891.92
Nivelacion en zanja	40 días	18/09/2022 -04/11/2022	\$40,101.34
Nivelacion Y Limpieza del terreno a mano	40 días	18/09/2022 -04/11/2022	\$40,101.34
Suministro y colocacion asiento de arena (incluye acar...	40 días	04/11/2022 -21/12/2022	\$206,723.48
Suministro y colocacion asiento de arena (incluye acar...	40 días	04/11/2022 -21/12/2022	\$206,723.48
suministro de material de mina para relleno(DISTAN...	54 días	01/11/2022-03/01/2023	\$365,436.50
suministro de material de mina para relleno(DISTAN...	54 días	01/11/2022-03/01/2023	\$365,436.50
Relleno compactado con equipo en capas de 0.20m	167 días	04/01/2023-18/07/2023	\$286,837.44
Relleno compactado con equipo en capas de 0.20m	167 días	04/01/2023-18/07/2023	\$286,837.44
Bote de material con camion.Distancia 5 km(incluye...	18 días	24/01/2022-14/02/2022	\$70,467.60
Bote de material con camion.Distancia 5 km(incluye...	18 días	24/01/2022-14/02/2022	\$70,467.60
Suministro de tuberías	29 días	26/01/2022-01/03/2022	\$1,460,522.14
tubería de 4" pvc SDR 26 C/ junta de goma +2% d...	13 días	26/01/2022-10/02/2022	\$595,018.71
tubería de 3" pvc SDR 26 C/ junta de goma +2% d...	13 días	13/02/2022-01/03/2022	\$865,503.43
colocacion de tuberías	99 días	21/12/2022-16/04/2023	\$75,843.01
colocacion de tuberías de 4" pvc SDR 26 C/ junta de goma +2% d...	54 días	21/12/2022-22/02/2023	\$24,284.79
colocacion de tuberías de 3" pvc SDR 26 C/ junta de goma +2% d...	45 días	22/02/2023-16/04/2023	\$51,558.22
Suministro y colocacion de piezas especiales	339 días	26/01/2022-26/02/2023	\$175,829.76
Codo 3"x 15 grados acero SCH -80 C/ Proteccion anticorr...	3 días	01/03/2022-04/03/2022	\$1,190.24
Codo 3"x 20 grados acero SCH -80 C/ Proteccion anticorr...	3 días	01/03/2022-04/03/2022	\$5,951.20
Codo 3"x 30 grados acero SCH -80 C/ Proteccion anticorr...	3 días	15/03/2022-18/03/2022	\$1,190.24
Codo 3"x 45grados acero SCH -80 C/ Proteccion anticorr...	3 días	15/03/2022-18/03/2022	\$2,640.08
Codo 3"x 40 grados acero SCH -80 C/ Proteccion anticorr...	3 días	15/03/2022-18/03/2022	\$2,640.08
Codo 3"x 60 grados acero SCH -80 C/ Proteccion anticorr...	3 días	15/03/2022-18/03/2022	\$3,289.08
Codo 3"x 70 grados acero SCH -80 C/ Proteccion anticorr...	3 días	13/02/2022-16/02/2022	\$1,644.54
Codo 4"x 15 grados acero SCH -80 C/ Proteccion anticorr...	3 días	22/02/2023-26/02/2023	\$3,330.10
Codo 4"x 25 grados acero SCH -80 C/ Proteccion anticorr...	3 días	08/02/2022-11/02/2022	\$1,665.05
Codo 4"x 75 grados acero SCH -80 C/ Proteccion anticorr...	1 día	07/02/2022-08/02/2022	\$2,443.85
CRUZ 3"x 3" acero SCH -80 C/ Proteccion anticorr...	1 día	08/02/2022-09/02/2022	\$1,969.04
CRUZ 4"x 3" acero SCH -80 C/ Proteccion anticorr...	1 día	07/02/2022-08/02/2022	\$15,441.90
CRUZ 4"x 4" acero SCH -80 C/ Proteccion anticorr...	1 día	08/02/2022-09/02/2022	\$2,963.05
TEE 3"x 3" acero SCH -80 C/ Proteccion anticorr...	1 día	31/01/2022-01/02/2022	\$3,029.48
TEE 4"x 3" acero SCH -80 C/ Proteccion anticorr...	1 día	13/02/2023-14/02/2022	\$4,108.90
Reduccion 4" x 3" acero SCH -80 C/ Proteccion anticorr...	1 día	21/12/2022-22/12/2022	\$2,810.90
Tapon 3" acero SCH -80 C/ Proteccion anticorr...	1 día	22/02/2023-23/02/2023	\$4,348.14

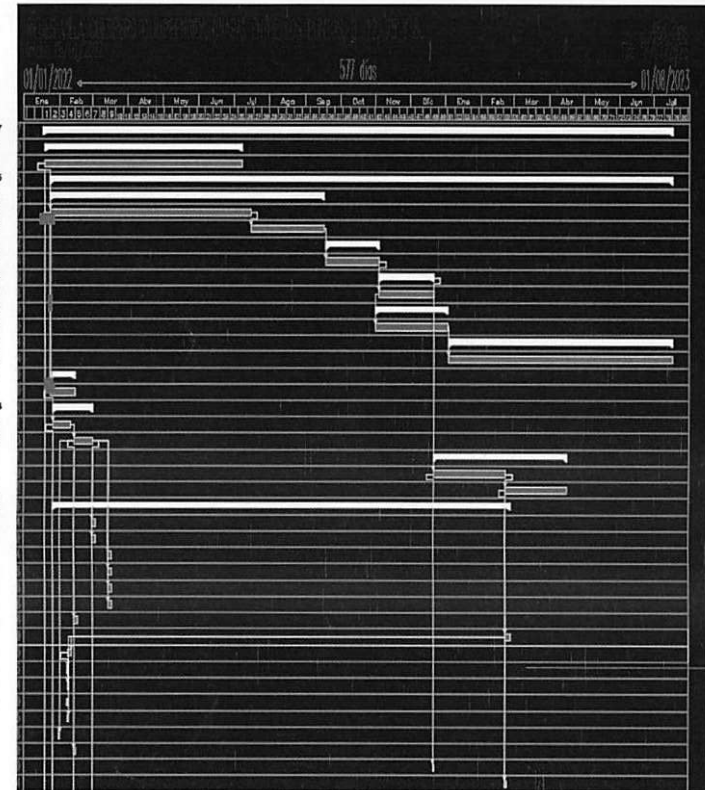

REDES VILLA GUERRERO COMPRENDIDA (INAPA) ENTRE LOS PUNTOS 8,12,75 Y 80
 PAGINA 1/2

Yordania Cruzeta A.

REDES VILLA GUERRERO COMPRENDIDA(INAPA) EN

468 DIAS

INICIO 18/01/2022

577 DIAS


FIN 18/07/2023

1/1/2022

8/1/2023

REDES VILLA GUERRERO

JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø3" 150 PSI	11 días	01/03/2022-14/03/2022	\$59,532.64
JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø4" 150 PSI	9 días	26/01/2022-05/02/2022	\$32,891.25
ANCLAJE PARA PIEZA (SEGUN DETALLE)	8 días	02/02/2022-11/02/2022	\$22,750.00
VALVULA DE COMPUERTA Ø4" H.F. PLATILLADA COMPLETA 150PSI	18 días	25/01/2022-15/02/2022	\$180,667.57
VALVULA DE COMPUERTA Ø4" H.F. PLATILLADA COMPLETA 150PSI	1 días	25/01/2022-26/01/2022	\$34,444.57
VALVULA DE COMPUERTA Ø3" H.F. PLATILLADA COMPLETA 150PSI	2 días	13/02/2022-15/02/2022	\$139,223.00
CAJA TELESCOPICA P/VALVULAS (INCL. BASE Y TAPA DE H.S.)	1 días	31/01/2022-01/02/2022	\$7,000.00
ACOMETIDAS URBANAS Ø3"(178 UNIDADES)	17 días	21/02/2022-12/03/2022	\$536,889.42
COLLARIN EN POLIETILENO Ø3" (ABRAZADERA)	2 días	21/02/2022-23/02/2022	\$34,418.08
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ø1/2"	9 días	23/02/2022-05/03/2022	\$30,245.76
ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA	1 días	01/03/2022-02/03/2022	\$5,681.70
ADAPTADOR HEMBRA Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA	1 días	21/02/2022-22/02/2022	\$5,681.70
LLAVE DE PASO DE 1/2"	1 días	22/02/2022-23/02/2022	\$27,392.00
VALVULA CHECK DE 1/2" BRONCE	1 días	22/02/2022-23/02/2022	\$41,302.00
CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10"	5 días	28/02/2022-05/03/2022	\$147,018.00
TUBERIA 1/2" SCH 40 PVC LONGITUD PROMEDIO	1 días	01/03/2022-02/03/2022	\$3,430.42
ANCLAJES DE H.S. FC' 180 KG/CM2	1 días	23/02/2022-24/02/2022	\$21,400.00
CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON	1 días	01/03/2022-02/03/2022	\$1,605.00
TAPON HEMBRA 1/2" PVC	1 días	01/03/2022-02/03/2022	\$526.44
EXCAVACION Y TAPADO A MANO	10 días	01/03/2022-12/03/2022	\$186,088.32
MANO DE OBRA PLOMERO	1 días	01/03/2022-02/03/2022	\$32,100.00
PRUEBA HIDROSTATICA	1 días	01/03/2022-02/03/2022	\$21,642.10
Prueba Hidrostatica para tuberias DE Ø 4" PVC SDR-26 C/ J.G.	1 días	01/03/2022-02/03/2022	\$7,540.55
Prueba Hidrostatica para tuberias de Ø 3" PVC SDR-26 C/ J.G.	1 días	01/03/2022-02/03/2022	\$14,101.55
LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y h..	1 días	01/03/2022-02/03/2022	\$60,000.00
LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (OBREROS, CAMION Y h..	1 días	01/03/2022-02/03/2022	\$60,000.00
VARIOS (CAMPAMENTO y valla anunciando obra)	4 días	18/01/2022-22/01/2022	\$43,500.00
CAMPAMENTO (INC ALQUILER DE CASA O SOLAR, FURGON OFICIN..	2 días	20/01/2022-22/01/2022	\$297,000.00
VALLA ANUNCIANDO OBRA 16' X 8' IMPRESION FULL COLOR...	1 días	18/01/2022-19/01/2022	\$43,500.00
Costos indirectos	11 días	14/03/2022-26/03/2022	\$2,124,600.72
HONORARIOS PROFESIONALES: PORCENTAJE DE BENEFICIOS 10%	1 días	14/03/2022-15/03/2022	\$467,973.81
GASTOS ADMINISTRATIVOS. PORCENTAJE DE GASTOS ADMINISTRATIVOS...	1 días	15/03/2022-16/03/2022	\$140,392.14
SEGUROS, PÓLIZA Y FIANZAS . PPORCENTAJE 4...	1 días	15/03/2022-16/03/2022	\$187,189.52
SUPERVISIÓN DE LA OBRA(PORCENTAJE DE SUPERVISION 5%	1 días	17/03/2022-18/03/2022	\$233,986.90
GASTOS DE TRANSPORTE. PORCENTAJE DE GASTOS...	1 días	18/03/2022-19/03/2022	\$187,189.52
LEY 6-86. PORCENTAJE 1%	1 días	20/03/2022-21/03/2022	\$46,797.38
CODIA. PORCENTAJE 0.10%	1 días	21/03/2022-22/03/2022	\$4,679.74
ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES (LEY 07-2007),PORCENTAJE 18%	1 días	22/03/2022-23/03/2022	\$84,234.93
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INAPA	1 días	22/03/2022-23/03/2022	\$467,973.81
IMPREVISTOS. PORCENTAJE 5%	1 días	24/03/2022-25/03/2022	\$233,986.90
MEDIDA DE COMPENSACION AMBIENTAL PORCENTAJE...	1 días	25/03/2022-26/03/2022	\$70,196.07

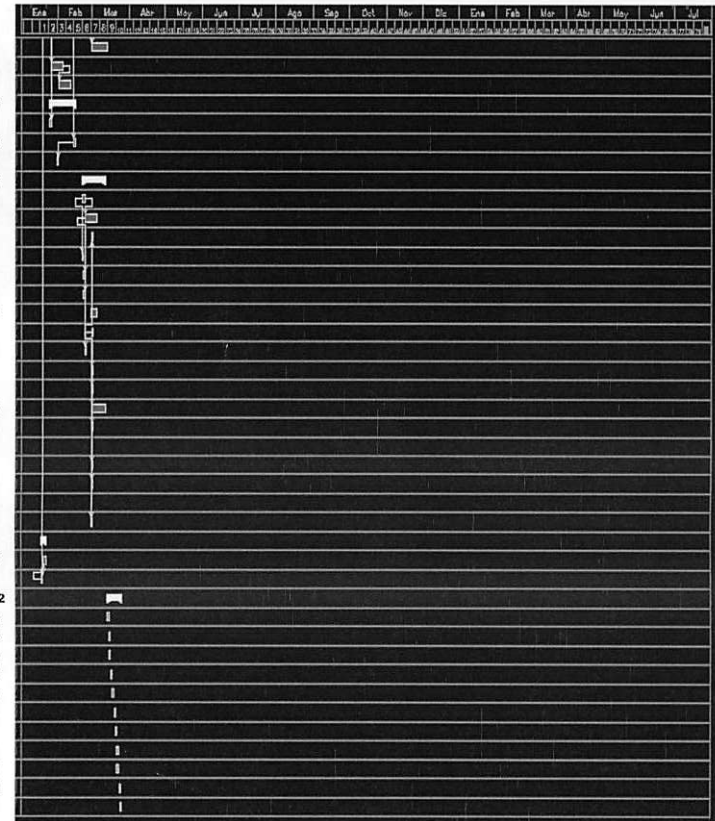

REDES VILLA GUERRERO COMPRENDIDA(INAPA) ENTRE LOS PUNTOS 8,12,75 Y 80
PAGINA 2/2

Yordanic Cruz A.

Id	Texto	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Meses											
							enero 2022	febrero 2022	marzo 2022	abril 2022	mayo 2022	junio 2022	julio 2022	agosto 2022	septiembre 2022	octubre 2022	noviembre 2022	diciembre 2022
1			AUMENTO DE CANTIDAD (A.C)	252 días	mar 11/1/22	jun 5/1/23	[Gantt bar from Mar 11, 2022 to Jun 5, 2023]											
2							[Empty]											
3	A		RED DE DISTRIBUCIÓN	252 días	mar 11/1/22	jun 5/1/23	[Gantt bar from Mar 11, 2022 to Jun 5, 2023]											
4							[Empty]											
5	2		MOVIMIENTO DE TIERRA	225 días	mar 11/1/22	mar 29/11/22	[Gantt bar from Mar 11, 2022 to Mar 29, 2022]											
6							[Empty]											
7	2.1		EXCAVACIÓN CON CLASIFICACIÓN (606.00 M3)	225 días	mar 11/1/22	mar 29/11/22	[Gantt bar from Mar 11, 2022 to Mar 29, 2022]											
8	2.1.1		MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 70%	225 días	mar 11/1/22	mar 29/11/22	[Gantt bar from Mar 11, 2022 to Mar 29, 2022]											
9							[Empty]											
10	3		SUMINISTRO DE TUBERIA:	230 días	mié 12/1/22	mié 7/12/22	[Gantt bar from Dec 1, 2022 to Dec 7, 2022]											
11	3.1		DE Ø 4" PVC SDR-26 C/ J.G. +2% PÉRDIDA POR CAMPANA	230 días	mié 12/1/22	mié 7/12/22	[Gantt bar from Dec 1, 2022 to Dec 7, 2022]											
12							[Empty]											
13	4		COLOCACION DE TUBERIA:	235 días	jun 13/1/22	jun 15/12/22	[Gantt bar from Jun 13, 2022 to Jun 15, 2022]											
14	4.2		DE Ø 4" PVC SDR-26 C/ J.G. + 2% DESP.	235 días	jun 13/1/22	jun 15/12/22	[Gantt bar from Jun 13, 2022 to Jun 15, 2022]											
15							[Empty]											
16	6		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES	235 días	jun 13/1/22	jun 15/12/22	[Gantt bar from Jun 13, 2022 to Jun 15, 2022]											
17	5.5		CODO 3" X 35" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA	235 días	jun 13/1/22	jun 15/12/22	[Gantt bar from Jun 13, 2022 to Jun 15, 2022]											
18	5.10		CODO 3" X 90" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA	235 días	jun 13/1/22	jun 15/12/22	[Gantt bar from Jun 13, 2022 to Jun 15, 2022]											
19	5.18		TAPÓN 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA	235 días	jun 13/1/22	jun 15/12/22	[Gantt bar from Jun 13, 2022 to Jun 15, 2022]											
20	5.19		JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø3" 150 PSI	235 días	jun 13/1/22	jun 15/12/22	[Gantt bar from Jun 13, 2022 to Jun 15, 2022]											
21	5.20		JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE Ø4" 150 PSI	235 días	jun 13/1/22	jun 15/12/22	[Gantt bar from Jun 13, 2022 to Jun 15, 2022]											
22							[Empty]											
23							[Empty]											
24	7		ACOMETIDAS URBANAS Ø1" (290 UNIDADES)	235 días	lun 31/1/22	jun 29/12/22	[Gantt bar from Jan 31, 2022 to Jun 29, 2022]											
25	7.1		COLLARIN EN POLIETILENO Ø3" (ABRAZADERA)	235 días	lun 31/1/22	jun 29/12/22	[Gantt bar from Jan 31, 2022 to Jun 29, 2022]											
26	7.2		TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=6.00M (PROMEDIO)	235 días	lun 31/1/22	jun 29/12/22	[Gantt bar from Jan 31, 2022 to Jun 29, 2022]											

Project: LOTE 2 - RED VILLA GU
Date: mar 11/10/22

Task		Project Summary		Manual Task		Start only		Deadline	
SPH		Inactive Task		Duration only		Finish only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

Page 1

id	Texto	Modo de Tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	enero 2022	febrero 2022	marzo 2022	abril 2022	mayo 2022	junio 2022	julio 2022	agosto 2022	septiembre 2022	octubre 2022	noviembre 2022	diciembre 2022	enero 2023
27	7.3	☑	ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA	235 días	lun 31/1/22	jue 29/12/22													
28	7.4	☑	ADAPTADOR HEMBRA Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA	235 días	lun 31/1/22	jue 29/12/22													
29	7.5	☑	LLAVE DE PASO DE 1/2"	235 días	lun 31/1/22	jue 29/12/22													
30	7.6	☑	VALVULA CHECK DE 1/2" BRONCE	235 días	lun 31/1/22	jue 29/12/22													
31	7.7	☑	CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10"	235 días	lun 31/1/22	jue 29/12/22													
32	7.8	☑	TUBERIA 1/2" SCH 40 PVC LONGITUD L= 1 00M (PROMEDIO)	235 días	lun 31/1/22	jue 29/12/22													
33	7.9	☑	ANCLAJES DE H.S. FC 180 KG/CM2	235 días	lun 31/1/22	jue 29/12/22													
34	7.10	☑	CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON	235 días	lun 31/1/22	jue 29/12/22													
35	7.11	☑	TAPON HEMBRA 1/2" PVC	235 días	lun 31/1/22	jue 29/12/22													
36	7.12	☑	EXCAVACION Y TAPADO A MANO	235 días	lun 31/1/22	jue 29/12/22													
37	7.13	☑	MANO DE OBRA PLOMERO	235 días	lun 31/1/22	jue 29/12/22													
38		☑																	
39		☑	NUEVAS PARTIDAS (N.P)	250 días	jue 13/1/22	jue 5/1/23													
40		☑																	
41	A	☑	RED DE DISTRIBUCIÓN	250 días	jue 13/1/22	jue 5/1/23													
42		☑																	
43	B	☑	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES	235 días	jue 13/1/22	jue 15/12/22													
44	5.22	☑	YEE 3" X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA	235 días	jue 13/1/22	jue 15/12/22													
45	5.23	☑	YEE 4" X 3" ACERO SCH-80 C/PROTECCION ANTICORROSIVA	235 días	jue 13/1/22	jue 15/12/22													
46		☑																	
47	12	☑	ACOMETIDAS URBANAS Ø4" (43 UNIDADES)	240 días	lun 31/1/22	jue 5/1/23													
48	7.1	☑	COLLARIN EN POLIETILENO Ø4" (ABRAZADERA)	240 días	lun 31/1/22	jue 5/1/23													
49	7.2	☑	TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Ø1/2" INTERNO L=6 00M (PROMEDIO)	240 días	lun 31/1/22	jue 5/1/23													
50	7.3	☑	ADAPTADOR MACHO Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA	240 días	lun 31/1/22	jue 5/1/23													
51	7.4	☑	ADAPTADOR HEMBRA Ø1/2" ROSCADO A MANGUERA	240 días	lun 31/1/22	jue 5/1/23													
52	7.5	☑	LLAVE DE PASO DE 1/2"	240 días	lun 31/1/22	jue 5/1/23													

Project: LOTE 2 - RED VILLA GU
Date: mar 11/10/22

Task		Project Summary		Manual Task		Start only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration only		High only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

Page 2

Id	Texto1	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	fin
53	7.8	☑	VALVULA CHECK DE 1/2" BRONCE	240 días	lun 31/1/22	jue 5/1/23
54	7.7	☑	CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10"	240 días	lun 31/1/22	jue 5/1/23
55	7.8	☑	TUBERIA 1/2" SCH 40 PVC LONGITUD L= 1.00M (PROMEDIO)	240 días	lun 31/1/22	jue 5/1/23
56	7.9	☑	ANCLAJES DE H S. FC' 180 KG/CM2	240 días	lun 31/1/22	jue 5/1/23
57	7.10	☑	CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON	240 días	lun 31/1/22	jue 5/1/23
58	7.11	☑	TAPON HEMBRA 1/2" PVC	240 días	lun 31/1/22	jue 5/1/23
59	7.12	☑	EXCAVACION Y TAPADO A MANO	240 días	lun 31/1/22	jue 5/1/23
60	7.13	☑	MANO DE OBRA PLOMERO	240 días	lun 31/1/22	jue 5/1/23
61		☑				
62	13	☑	REPARACION DE AVERIAS EN DIFERENTES TRAMOS	245 días	jue 20/1/22	jue 5/1/23
63		☑				
64	13.1	☑	DE Ø 1/2" PVC SCH-40	245 días	jue 20/1/22	jue 5/1/23
65	13.2	☑	DE Ø 3/4" PVC SCH-40	245 días	jue 20/1/22	jue 5/1/23
66	13.3	☑	DE Ø 2" PVC SCH-40	245 días	jue 20/1/22	jue 5/1/23
67	13.5	☑	COUPLING PVC DE 1/2"	245 días	jue 20/1/22	jue 5/1/23
68	13.6	☑	COUPLING PVC DE 3/4"	245 días	jue 20/1/22	jue 5/1/23
69	13.7	☑	COUPLING PVC DE 2"	245 días	jue 20/1/22	jue 5/1/23
70	13.8	☑	TAPON DE 1/2"	245 días	jue 20/1/22	jue 5/1/23
71	13.9	☑	TAPON DE 3/4"	245 días	jue 20/1/22	jue 5/1/23
72	13.10	☑	ALAMBRE No 12	245 días	jue 20/1/22	jue 5/1/23
73	13.11	☑	CEMENTO SOLVENTE	245 días	jue 20/1/22	jue 5/1/23
74	13.12	☑	MANO DE OBRA	245 días	jue 20/1/22	jue 5/1/23

enero 2022 febrero 2022 marzo 2022 abril 2022 mayo 2022 junio 2022 agosto 2022 septiembre 2022 octubre 2022 noviembre 2022 diciembre 2022 enero 2023
 1 6 11 16 21 26 31 5 10 15 20 25 1 7 12 17 22 27 1 6 11 16 21 26 1 6 11 16 21 26 31 5 10 15 20 25 30 4 9 14 19 24 29 3 8 13 18 23 28 1 6 11 16 21 26 1 7 12 17 22 27 1 6



Project: LOTE 2 - RED VILLA GU
 Date: mar 11/10/22


Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Task		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Gantt Chart											
						M	enero	P	F	M	marzo	P	F	M	mayo	P	F
1	LINEA DE CONDUCCION Y REDES LOMA DE CHIVO, EL SEIBO	391 días	mié 1/19/22	mié 7/19/23	\$8,514,234.57	[Gantt bar for task 1]											
2	Linea de conduccion	73 días	mié 1/19/22	vie 4/29/22	\$3,399,180.11	[Gantt bar for task 2]											
3	Replanteo	13 días	mié 1/19/22	vie 2/4/22	\$14,366.31	[Gantt bar for task 3]											
4	Corte carpeta asfaltica	56 días	lun 2/7/22	lun 4/25/22	\$56,997.30	[Gantt bar for task 4]											
5	Movimiento de tierra	56 días	vie 1/21/22	vie 4/8/22	\$948,424.41	[Gantt bar for task 5]											
6	Suministro de tubería	13 días	mié 1/19/22	vie 2/4/22	\$1,667,486.80	[Gantt bar for task 6]											
7	Colocación de tubería	56 días	vie 1/21/22	vie 4/8/22	\$40,105.65	[Gantt bar for task 7]											
8	Suministro y colocación de piezas especiales	56 días	vie 1/21/22	vie 4/8/22	\$156,054.48	[Gantt bar for task 8]											
9	Suministro y colocación de valvulas	56 días	vie 1/21/22	vie 4/8/22	\$206,061.77	[Gantt bar for task 9]											
10	Pruebas hidrostáticas en tuberías	2 días	lun 4/11/22	mar 4/12/22	\$17,103.58	[Gantt bar for task 10]											
11	Pavimento	13 días	mié 4/13/22	vie 4/29/22	\$271,621.81	[Gantt bar for task 11]											
12	Control y manejo tránsito (Incluye uso de letreros, uso de conos refractarios y hombres con	73 días	mié 1/19/22	vie 4/29/22	\$7,500.00	[Gantt bar for task 12]											
13	Senalización, control y seguridad en la obra	73 días	mié 1/19/22	vie 4/29/22	\$6,933.00	[Gantt bar for task 13]											
14	Limpieza continua y final	73 días	mié 1/19/22	vie 4/29/22	\$6,525.00	[Gantt bar for task 14]											
15	Redes de distribución	252 días	lun 5/2/22	mar 4/18/23	\$4,587,361.43	[Gantt bar for task 15]											
16	Replanteo	56 días	lun 5/2/22	lun 7/18/22	\$24,250.53	[Gantt bar for task 16]											
17	Movimiento de tierra	112 días	lun 5/23/22	mar 10/25/22	\$1,379,913.39	[Gantt bar for task 17]											
18	Suministro de tubería	13 días	lun 5/23/22	mié 6/8/22	\$1,061,974.55	[Gantt bar for task 18]											

Proyecto: Inapa KGK_ASCM
Fecha: mié 11/16/22

Tarea	[Barra con puntos]	Tarea inactiva	[Barra con puntos]	Informe de resumen manual	[Barra con puntos]	Hito externo	[Barra con punto]
División	[Barra con puntos]	Hito inactivo	[Barra con punto]	Resumen manual	[Barra con puntos]	Fecha límite	[Barra con punto]
Hito	[Barra con punto]	Resumen inactivo	[Barra con puntos]	solo el comienzo	[Barra con punto]	Progreso	[Barra con punto]
Resumen	[Barra con puntos]	Tarea manual	[Barra con puntos]	solo fin	[Barra con punto]	Progreso manual	[Barra con punto]
Resumen del proyecto	[Barra con puntos]	solo duración	[Barra con puntos]	Tareas externas	[Barra con puntos]		


YMA




Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Gantt Chart											
						M	enero	P	F	M	marzo	P	F	M	mayo	P	F
34	Valla anunciando obra 16'x8' Impresión full color conteniendo logo de Inapa, Nombre de Proyecto y Contratista	391 días	mié 1/19/22	mié 7/19/23	\$43,500.00	▶											

Proyecto: Inapa KGK_ASCM Fecha: mié 11/16/22	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

YAG




julio P F M | septiembre P F M | noviembre P F M | enero P F M | marzo P F M | mayo P F M | julio P

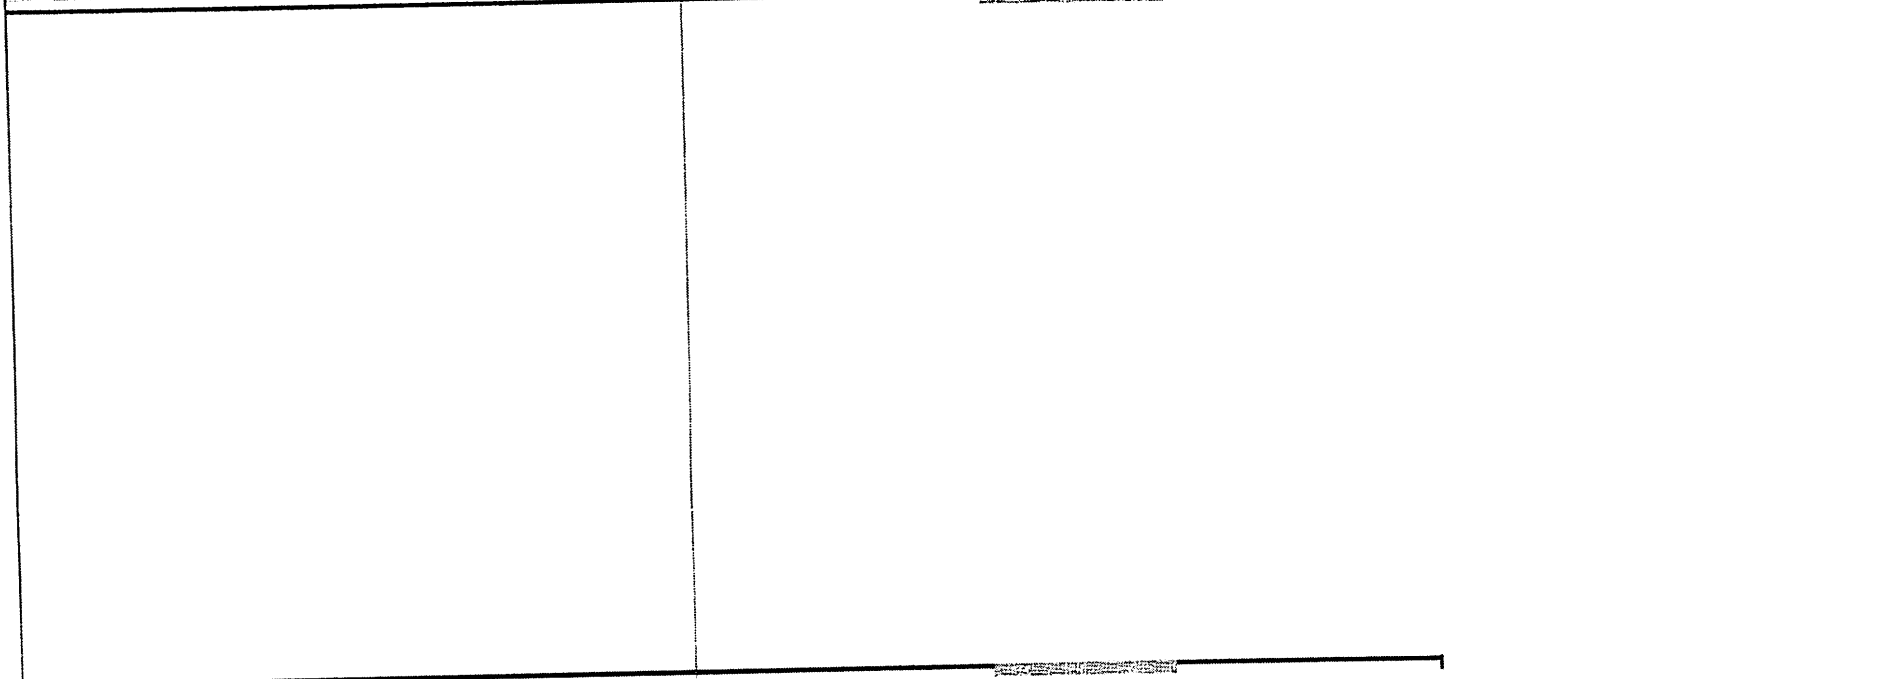


Proyecto: Inapa KGK_ASCM
 Fecha: mié 11/16/22

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

Handwritten signature or initials



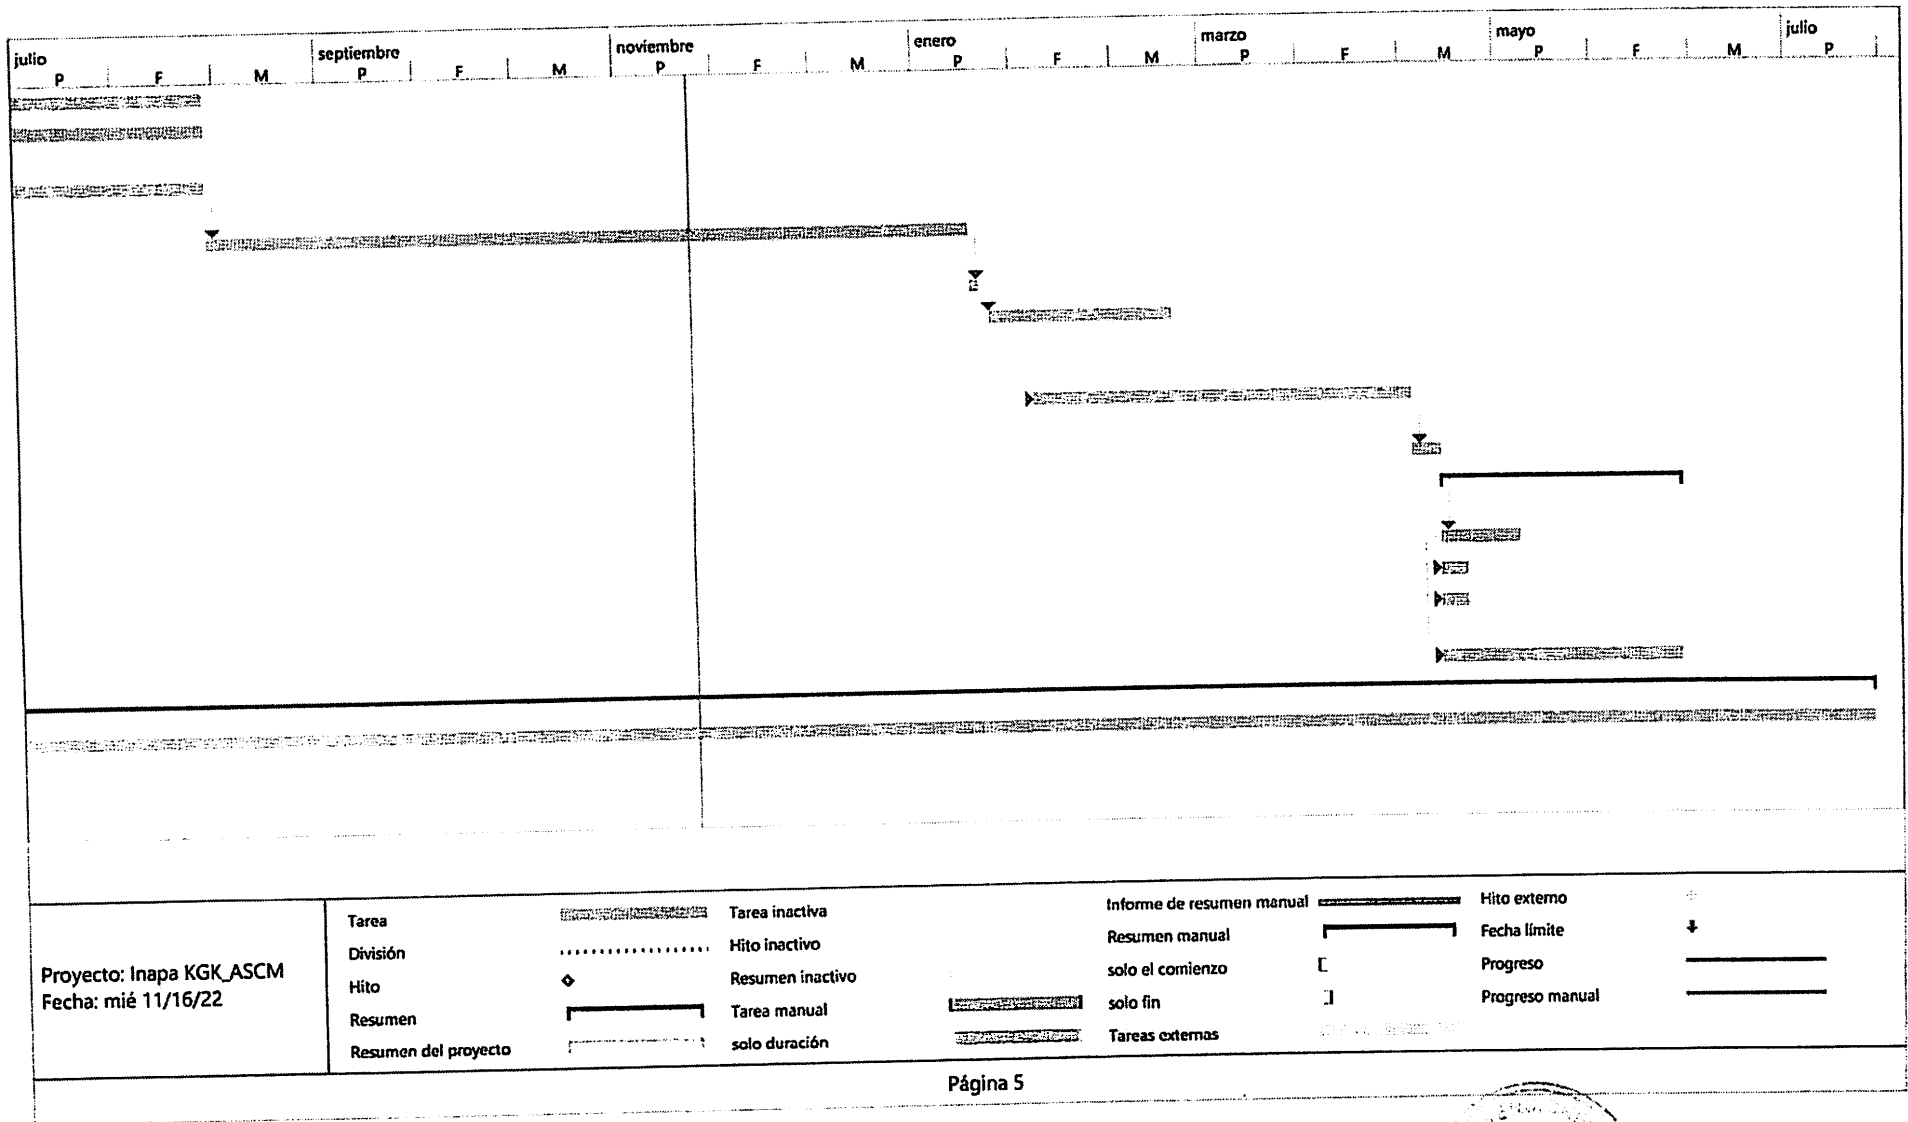















4/17



julio	septiembre	noviembre	enero	marzo	mayo	julio
P F M	P F M	P F M	P F M	P F M	P F M	P

--	--	--

Proyecto: Inapa KGK_ASCM Fecha: mié 11/16/22	Tarea		Tarea inactivo	Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual	solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas			

JY

