


Proyecto: LINEA DE CONDUCCI  
 Fecha: sáb 30/1/21

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Progreso manual	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite			
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas			
Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica			
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Progreso			





ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	Feb 22, 21	Mar 1, 21	Mar 8, 21
								M T W T F S S	M T W T F S S	M T W T F S S
1		<b>LINEA DE CONDUCCION 12" PVC TRAMO DESDE EST. 2+359 HASTA EST. 3+162</b>	129.5 days	Wed 2/24/21	Fri 8/27/21					
2		INICIO	0 days	Wed 2/24/21	Wed 2/24/21					
3		CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES CON (IU) BANO MOVIL)	3 days	Wed 2/24/21	Fri 2/26/21	2	campamento			
4		REPLANTEO	15 days	Mon 3/1/21	Fri 3/19/21	3	Brigada tipografica			
5		<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	85.5 days	Mon 4/5/21	Tue 8/3/21					
6		EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO	15 days	Thu 4/15/21	Wed 5/5/21	48F5-5 days,49	Retroexcavadora,operat			
7		ASIENTO DE ARENA	5 days	Thu 5/6/21	Wed 5/12/21	6	obrero1,obrero2,obrero			
8		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M	9 days	Wed 7/21/21	Tue 8/3/21	36	obrero,compactador me			
9		BOTE DE MATERIAL CON CAMION, INCLUYE CARGUIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO (DIST.=5.0KM)	3 days	Mon 4/5/21	Wed 4/7/21	49FF-5 days				
10		<b>SUMINISTRO DE TUBERIAS</b>	7 days	Wed 3/24/21	Thu 4/1/21					
11		012" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. PARA CAMPANA	7 days	Wed 3/24/21	Thu 4/1/21	9FF-3 days	Suplidor de tubos			
12		<b>COLOCACION DE TUBERIAS</b>	10 days	Thu 5/13/21	Wed 5/26/21					
13		0 12" PVC (SDR-26) C/ JUNTA DE GOMA + 4 % PERO.	10 days	Thu 5/13/21	Wed 5/26/21	11,7	Brigada de plomeria			
14		<b>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PRESION</b>	20 days	Thu 5/27/21	Thu 6/24/21					
15		CODO 12X45" ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA	2 days	Thu 5/27/21	Fri 5/28/21	13	Brigada de plomeria			
16		REDUCCION 12"X 8" ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA	1 day	Mon 5/31/21	Mon 5/31/21	15	Brigada de plomeria			
17		TEE 12X6" ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA	1 day	Tue 6/1/21	Tue 6/1/21	16	Brigada tipografica			
18		NIPLE 12" X 1.00M ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA	2 days	Wed 6/2/21	Fri 6/4/21	17	Brigada de plomeria			
19		NIPLE 8" X 1.00M ACERO (SCH-40) C/PROTECCION ANTICORROSIVA	2 days	Mon 6/7/21	Tue 6/8/21	18	Brigada de plomeria			
20		JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 0 12" HF	3 days	Wed 6/9/21	Fri 6/11/21	19	Brigada de plomeria			
21		JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 0 8" HF	1 day	Mon 6/14/21	Mon 6/14/21	20	Brigada de plomeria			
22		JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 0 6" HF	1 day	Tue 6/15/21	Tue 6/15/21	21	Brigada de plomeria			
23		ANCLAJE P/PIEZAS ESPECIALES (SEGUN DISENO)	7 days	Wed 6/16/21	Thu 6/24/21	22	Brigada de plomeria			
24		<b>INTERCONEXION A LINEA CONDUCCION 08" EXISTENTE</b>	111.5 days	Mon 3/22/21	Fri 8/27/21					
25		<b>SUMINISTRO Y COLOCACION:</b>	20.5 days	Wed 6/23/21	Wed 7/21/21					
26		TUBERIA 0 8" ACERO	3 days	Wed 6/23/21	Fri 6/25/21	23F5-2 days	Soldadores,Brigada de p			
27		VALVULA DE COMPUERTA 08" H.F. PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS,	2 days	Fri 6/25/21	Mon 6/28/21	26F5-1 day	Brigada de plomeria			
28		TEE 12X8" ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA	2 days	Mon 6/28/21	Tue 6/29/21	27F5-1 day	Brigada de plomeria			
29		TEE 8"X8" ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA	2 days	Tue 6/29/21	Wed 6/30/21	28F5-1 day	Brigada de plomeria			
30		NIPLE 12" X 1.00M ACERO (SCH-30) C/PROTECCION ANTICORROSIVA	2 days	Thu 7/1/21	Fri 7/2/21	29	Brigada de plomeria			
31		NIPLE 8" X 1.00M ACERO (SCH-40) C/PROTECCION ANTICORROSIVA	1.5 days	Mon 7/5/21	Tue 7/6/21	30	Brigada de plomeria			
32		JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 012" HF	1 day	Tue 7/6/21	Wed 7/7/21	31	Brigada de plomeria			
33		JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 0 8" HF	1 day	Wed 7/7/21	Thu 7/8/21	32	Brigada de plomeria			
34		ANCLAJE P/PIEZAS ESPECIALES (SEGUN DISENO)	3 days	Thu 7/8/21	Tue 7/13/21	33	Brigada de plomeria			
35		REGISTRO PARA VALVULA (SEGUN DETALLE)	5 days	Tue 7/13/21	Tue 7/20/21	34	Brigada de plomeria			
36		MOVIMIENTO DE TIERRA	3 days	Fri 7/16/21	Wed 7/21/21	35F5-2 days	Retro pala,camion de 6 i			
37		<b>SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS</b>	13 days	Mon 7/19/21	Thu 8/5/21					
38		VALVULA DE COMPUERTA 06" H.F. PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS	3 days	Mon 7/19/21	Thu 7/22/21	36F5-2 days	Brigada de plomeria			
39		MECANICA TIPO DRESSER Y ROS CAJES DE TORNILLOS	3 days	Wed 7/21/21	Mon 7/26/21	38F5-1 day	Brigada de plomeria			
40		VALVULA DE AIRE COMBINADA 02" H.F. 150 PSI,150 PSI,PLATILLADA (INC JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE	5 days	Mon 7/26/21	Mon 8/2/21	39	Brigada de plomeria,alb			
41		PLATILLADO 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 ROS DE TORNILLOS	3 days	Mon 8/2/21	Thu 8/5/21	40	Brigada de plomeria			
42		CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA	3 days	Mon 8/2/21	Thu 8/5/21	40	Brigada de plomeria			
43		REGISTRO PARA VALVULA EN TUBO DE 036" H.A. (INC. BASEY TAPA DE H.S.)	3 days	Mon 8/2/21	Thu 8/5/21	40	Brigada de plomeria			
44		<b>PRUEBA HIDROSTATICA</b>	21 days	Wed 7/21/21	Fri 8/20/21					
45		012" PVC	3 days	Thu 8/5/21	Tue 8/10/21	41	Brigada de plomeria			
46		SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (INCL OBREROS, MECHONES, CONOS, CINTA,	9 days	Wed 7/21/21	Tue 8/3/21	36	BaBanderilleros,obrero			
47		AVISO DE PELIGRO, CTRABEJO)	12 days	Tue 8/3/21	Fri 8/20/21	955,1155,36,44	Retro pala,camion de 6 i			
48		LIMPIEZA CONTINUA	12 days	Tue 8/3/21	Fri 8/20/21	955,1155,36,44	Retro pala,camion de 6 i			
49		<b>ASFALTO</b>	111.5 days	Mon 3/22/21	Fri 8/27/21					
50		CORTE DE ASFALTO	10 days	Mon 3/22/21	Mon 4/5/21	4	maquina de cortar asfalt			
51		EXTRACCION DE ASFALTO	5 days	Tue 4/6/21	Mon 4/12/21	47	obrero,obrero2,obrero3			
52		BOTE DE CARPETA ASFALTO C/CAMION D=5 KM (INC.	2 days	Tue 4/13/21	Wed 4/14/21	48	Retro pala,camion,ayud.			
53		SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARA RELLENO	3 days	Thu 7/29/21	Tue 8/3/21	49,8F5-3 days	camion de 6 metros,sup			
54		SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPRIMACION	3 days	Tue 8/3/21	Fri 8/6/21	50	Brigada de imprimacion			
55		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO	3 days	Tue 8/24/21	Fri 8/27/21	53F5-1 day	Brigada de asfalto			
56		TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM)	3 days	Fri 8/20/21	Wed 8/25/21	51FF,45	camion transportadores			
57		<b>FIN</b>	0 days	Fri 8/27/21	Fri 8/27/21	43,52				

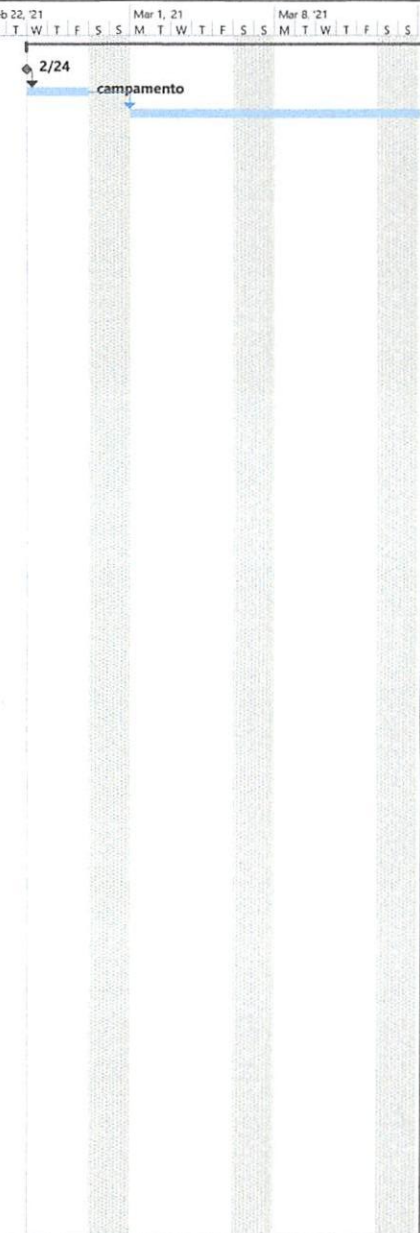

Proyecto: Proyecto1  
 Tarea: [Barra azul] Resumen del proyecto  
 División: [Puntos azules] Tarea inactiva  
 Hito: [Diamante azul] Hito inactivo  
 Resumen: [Barra azul con línea] Resumen inactivo  
 Tarea manual: [Barra gris] Tarea manual  
 solo duración: [Barra gris] solo duración  
 Informe de resumen manual: [Barra azul con línea] Informe de resumen manual  
 Resumen manual: [Barra gris] Resumen manual  
 solo el comienzo: [Barra azul] solo el comienzo  
 solo fin: [Barra azul] solo fin  
 Tareas externas: [Barra azul con línea] Tareas externas  
 Hito externo: [Diamante azul] Hito externo  
 Fecha limite: [Barra azul con línea] Fecha limite  
 Progreso: [Barra azul con línea] Progreso  
 Progreso manual: [Barra azul con línea] Progreso manual




















Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2021	
							1er trimestre ene	f
1		<b>LINEA DE CONDUCCION TRAMO DESDE 1+340.80 HASTA EST. 2+356.60</b>	<b>245 días</b>	<b>lun 15/02/21</b>	<b>vie 21/01/22</b>			
2		INICIO	0 días	lun 15/02/21	lun 15/02/21			
3		CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES CON (IU) BAÑO MOVIL)	245 días	lun 15/02/21	vie 21/01/22	2		
4		REPLANTEO	30 días	mié 17/02/21	mar 30/03/21	3CC+2 días		
5		<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	<b>55 días</b>	<b>mié 24/02/21</b>	<b>mar 11/05/21</b>			
6		EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO (DENTRO DEL VOLUMEN TOTAL, PARA LONG. 705.00M LA ZANJA TENDRA UN ANCHO =1.45M, DONDE SE COLOCARA UN TRAMO DE LA RED DISTRIBUCION Ø6" JUNTO A LA DE 12" DE CONDUCCION)	15 días	mié 24/02/21	mar 16/03/21	4CC+5 días		
7		ASIENTO DE ARENA (SUMINISTRO Y COLOCACION)	30 días	mié 03/03/21	mar 13/04/21	6CC+5 días		
8		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.20M	30 días	mié 31/03/21	mar 11/05/21	13CC+15 días		
9		BOTE DE MATERIAL CON CAMION, INCLUYE CARGIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO (DIST.=5.0 KM)	3 días	mié 17/03/21	vie 19/03/21	6		
10		<b>SUMINISTRO DE TUBERIAS</b>	<b>30 días</b>	<b>lun 15/02/21</b>	<b>vie 26/03/21</b>			
11		Ø12" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. P/CAMPANA	30 días	lun 15/02/21	vie 26/03/21	3CC		
12		Ø6" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 % PERD. P/CAMPANA	30 días	lun 15/02/21	vie 26/03/21	3CC		
13		<b>COLOCACION DE TUBERIAS</b>	<b>180 días</b>	<b>mié 10/03/21</b>	<b>mar 16/11/21</b>			

Proyecto: BOTADOS LOTE VII  
Fecha: mar 02/02/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	*	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2021	
								1er trimestre ene	f
14			Ø12" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. P/CAMPANA	150 días	mié 10/03/21	mar 05/10/21	7CC+5 días		
15			Ø6" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 % PERD. P/CAMPANA	110 días	mié 16/06/21	mar 16/11/21	14CC+70 días		
16			<b>SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PRESION C/PROTECCION ANTICORROSIVA</b>	<b>22 días</b>	<b>mié 06/10/21</b>	<b>jue 04/11/21</b>			
17			TEE 12"X6" ACERO (SCH-30)	1 día	mié 06/10/21	mié 06/10/21	14		
18			TEE 6"X 6" ACERO (SCH-40)	1 día	jue 07/10/21	jue 07/10/21	17		
19			TEE 6"X 3" ACERO (SCH-40)	1 día	vie 08/10/21	vie 08/10/21	18		
20			REDUCCION 6" X 4" ACERO (SCH-40)	1 día	lun 11/10/21	lun 11/10/21	19		
21			CODO 4X45" ACERO (SCH-80)	1 día	mar 12/10/21	mar 12/10/21	20		
22			CODO 3X45" ACERO (SCH-80)	1 día	mié 13/10/21	mié 13/10/21	21		
23			CODO 2X45" ACERO (SCH-80)	1 día	jue 14/10/21	jue 14/10/21	22		
24			NIPLE 12" X 1.00 M. ACERO (SCH-30)	1 día	vie 15/10/21	vie 15/10/21	23		
25			NIPLE 6" X 1.00 M. ACERO (SCH-40)	1 día	lun 18/10/21	lun 18/10/21	24		
26			NIPLE 4" X 1.00 M. ACERO (SCH-80)	1 día	mar 19/10/21	mar 19/10/21	25		
27			NIPLE 3" X 1.00 M. ACERO (SCH-80)	1 día	mié 20/10/21	mié 20/10/21	26		
28			JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 12 HF	1 día	jue 21/10/21	jue 21/10/21	27		
29			JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 6 HF	1 día	vie 22/10/21	vie 22/10/21	28		
30			JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 4 HF	1 día	lun 25/10/21	lun 25/10/21	29		
31			JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 3 HF	1 día	mar 26/10/21	mar 26/10/21	30		
32			ANCLAJE H.A. P/PIEZAS ESPECIALES (SEGUN DISEÑO)	7 días	mié 27/10/21	jue 04/11/21	31		

Proyecto: BOTADOS LOTE VII  
Fecha: mar 02/02/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Page	Section	Text	Page	Section	Text
1	Introduction	...	1	Introduction	...
2	Methodology	...	2	Methodology	...
3	Results	...	3	Results	...
4	Discussion	...	4	Discussion	...
5	Conclusion	...	5	Conclusion	...
6	References	...	6	References	...
7	Appendix A	...	7	Appendix A	...
8	Appendix B	...	8	Appendix B	...
9	Appendix C	...	9	Appendix C	...
10	Appendix D	...	10	Appendix D	...
11	Appendix E	...	11	Appendix E	...
12	Appendix F	...	12	Appendix F	...
13	Appendix G	...	13	Appendix G	...
14	Appendix H	...	14	Appendix H	...
15	Appendix I	...	15	Appendix I	...
16	Appendix J	...	16	Appendix J	...
17	Appendix K	...	17	Appendix K	...
18	Appendix L	...	18	Appendix L	...
19	Appendix M	...	19	Appendix M	...
20	Appendix N	...	20	Appendix N	...
21	Appendix O	...	21	Appendix O	...
22	Appendix P	...	22	Appendix P	...
23	Appendix Q	...	23	Appendix Q	...
24	Appendix R	...	24	Appendix R	...
25	Appendix S	...	25	Appendix S	...
26	Appendix T	...	26	Appendix T	...
27	Appendix U	...	27	Appendix U	...
28	Appendix V	...	28	Appendix V	...
29	Appendix W	...	29	Appendix W	...
30	Appendix X	...	30	Appendix X	...
31	Appendix Y	...	31	Appendix Y	...
32	Appendix Z	...	32	Appendix Z	...

Page	Section	Text	Page	Section	Text
33	Appendix AA	...	33	Appendix AA	...
34	Appendix AB	...	34	Appendix AB	...
35	Appendix AC	...	35	Appendix AC	...
36	Appendix AD	...	36	Appendix AD	...
37	Appendix AE	...	37	Appendix AE	...
38	Appendix AF	...	38	Appendix AF	...
39	Appendix AG	...	39	Appendix AG	...
40	Appendix AH	...	40	Appendix AH	...
41	Appendix AI	...	41	Appendix AI	...
42	Appendix AJ	...	42	Appendix AJ	...
43	Appendix AK	...	43	Appendix AK	...
44	Appendix AL	...	44	Appendix AL	...
45	Appendix AM	...	45	Appendix AM	...
46	Appendix AN	...	46	Appendix AN	...
47	Appendix AO	...	47	Appendix AO	...
48	Appendix AP	...	48	Appendix AP	...
49	Appendix AQ	...	49	Appendix AQ	...
50	Appendix AR	...	50	Appendix AR	...
51	Appendix AS	...	51	Appendix AS	...
52	Appendix AT	...	52	Appendix AT	...
53	Appendix AU	...	53	Appendix AU	...
54	Appendix AV	...	54	Appendix AV	...
55	Appendix AW	...	55	Appendix AW	...
56	Appendix AX	...	56	Appendix AX	...
57	Appendix AY	...	57	Appendix AY	...
58	Appendix AZ	...	58	Appendix AZ	...



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2021	
							1er trimestre ene	f
33		<b>SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS</b>	2 días	vie 05/11/21	lun 08/11/21			
34		VALVULA DE DESAGUE Ø4" H.F. PLATILLADA (INC. 2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS)	1 día	vie 05/11/21	vie 05/11/21	16		
35		CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA	1 día	lun 08/11/21	lun 08/11/21	34		
36		<b>PRUEBA HIDROSTATICA</b>	8 días	mar 09/11/2	jue 18/11/21			
37		Ø12" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. P/CAMPANA	5 días	mar 09/11/21	lun 15/11/21	35		
38		Ø6" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 % PERD. P/CAMPANA	3 días	mar 16/11/21	jue 18/11/21	37		
39		SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (INCL OBREROS,MECHONES, CONOS,CINTA, AVISO DE PELIGRO, LETREROS)	245 días	lun 15/02/21	vie 21/01/22	3CC		
40		LIMPIEZA CONTINUA	245 días	lun 15/02/21	vie 21/01/22	3CC		
41		<b>ASFALTO</b>	51 días	mar 09/11/2	mar 18/01/2			
42		CORTE DE ASFALTO	12 días	mar 09/11/2	mié 24/11/21	35,32		
43		EXTRACCION DE ASFALTO	12 días	jue 25/11/21	vie 10/12/21	42		
44		BOTE DE CARPETA ASFALTO C/CAMION D=5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	2 días	lun 13/12/21	mar 14/12/21	43		
45		SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARA RELLENO	4 días	mié 15/12/21	lun 20/12/21	44		
46		SUMINISTRO Y COLOCCION DE IMPRIMACION	7 días	mar 21/12/2	mié 29/12/21	45		
47		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE+25% DESP e= 2"	7 días	lun 10/01/22	mar 18/01/22	48		

Proyecto: BOTADOS LOTE VII  
Fecha: mar 02/02/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2021	
							1er trimestre ene	f
48		TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM)	7 días	jue 30/12/21	vie 07/01/22	46		
49		FIN	0 días	vie 07/01/22	vie 07/01/22	48		

Proyecto: BOTADOS LOTE VII  
Fecha: mar 02/02/21

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



LINEA DE CONDUCCION 8" PVC TRAMO DESDE EST. 0+881 HATA EST. 3.785, PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA

Id	Mod de tare	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2021		
							ene	feb	mar
1		<b>LINEA DE CONDUCCION 8" PVC TRAMO DESDE EST. 0+881 HATA EST. 3.785</b>	245 días	jue 04/02/21	mié 12/01/22				
2		INICIO	0 días	jue 04/02/21	jue 04/02/21				04/02
3		CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES CON (IU) BAÑO MOVIL)	245 días	jue 04/02/21	mié 12/01/22	2			
4		REPLANTEO	25 días	jue 11/02/21	mié 17/03/21	3CC+5 días			
5		MOVIMIENTO DE TIERRA	193 días	jue 18/03/21	lun 13/12/21				
6		EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO	30 días	jue 18/03/21	mié 28/04/21	4			
7		ASIENTO DE ARENA	30 días	jue 29/04/21	mié 09/06/21	6			
8		RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30M	30 días	mar 02/11/21	lun 13/12/21	14			
9		BOTE DE MATERIAL CON CAMION, INCLUYE CARGIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO (DIST.=5.0 KM)	4 días	jue 29/04/21	mar 04/05/21	6			
10		SUMINISTRO DE TUBERIAS	30 días	jue 11/02/21	mié 24/03/21				
11		Ø8" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 % PERD. P/CAMPANA	30 días	jue 11/02/21	mié 24/03/21	3CC+5 días			
12		COLOCACION DE TUBERIAS	120 días	vie 07/05/21	jue 21/10/21				
13		Ø8" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 % PERD. P/CAMPANA	120 días	vie 07/05/21	jue 21/10/21	7CC+6 días			
14		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS C/PROTECCION ANTICORROSIVA	7 días	vie 22/10/21	lun 01/11/21				
15		TEE 8"X 8" ACERO (SCH-40)	1 día	vie 22/10/21	vie 22/10/21	13			
16		NIPLE 8" X 1.00M ACERO (SCH-40)	1 día	lun 25/10/21	lun 25/10/21	15			
17		NIPLE 6" X 1.00M ACERO (SCH-40)	1 día	mar 26/10/21	mar 26/10/21	16			
18		REDUCION 8" X 6" ACERO (SCH-40)	1 día	mié 27/10/21	mié 27/10/21	17			
19		JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 8 HF	1 día	jue 28/10/21	jue 28/10/21	18			
20		JUNTA MECANICA TIPO DRESSER 6 HF	1 día	vie 29/10/21	vie 29/10/21	19			

LINEA DE CONDUCCION 8" PVC TRAMO DESDE EST. 0+881 HATA EST. 3.785, PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA

Id	Mod de tare	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	2021		
							1er semestre	ene	feb
21		ANCLAJE P/PIEZAS ESPECIALES (SEGUN DISEÑO)	1 día	lun 01/11/21	lun 01/11/21	20			
22		PRUEBA HIDROSTATICA	5 días	mar 02/11/21	lun 08/11/21				
23		Ø8" PVC	5 días	mar 02/11/21	lun 08/11/21	14			
24		SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL (INCL OBREROS,MECHONES, CONOS,CINTA, AVISO DE PELIGRO, LETREROS)	245 días	jue 04/02/21	mié 12/01/22	3CC			
25		LIMPIEZA CONTINUA	245 días	jue 04/02/21	mié 12/01/22	3CC			
26		ASFALTO	213 días	jue 18/03/21	lun 10/01/22				
27		CORTE DE ASFALTO	10 días	jue 18/03/21	mié 31/03/21	14			
28		EXTRACCION DE ASFALTO	10 días	jue 01/04/21	mié 14/04/21	27			
29		BOTE DE CARPETA ASFALTO C/CAMION D=5 KM (INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)	5 días	jue 15/04/21	mié 21/04/21	28			
30		SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARA RELLENO	4 días	mar 14/12/21	vie 17/12/21	8			
31		SUMINISTRO Y COLOCCION DE IMPRIMACION	4 días	lun 20/12/21	jue 23/12/21	30			
32		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO CALIENTE+25% DESP e= 2"	6 días	lun 03/01/22	lun 10/01/22	33			
33		TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM)	6 días	vie 24/12/21	vie 31/12/21	31			
34		FIN	0 días	lun 10/01/22	lun 10/01/22	26			

LÍNEA DE CONDUCCION 8" PVC TRAMO DESDE EST. 0+881 HATA EST. 3.785, PROVINCIAS SANTO DOMINGO - MONTE PLATA

2022

mar

abr

may

jun

2º semestre

jul

ago

sep

oct

nov

dic

1er semestre

ene

feb

mar

abr

may

