

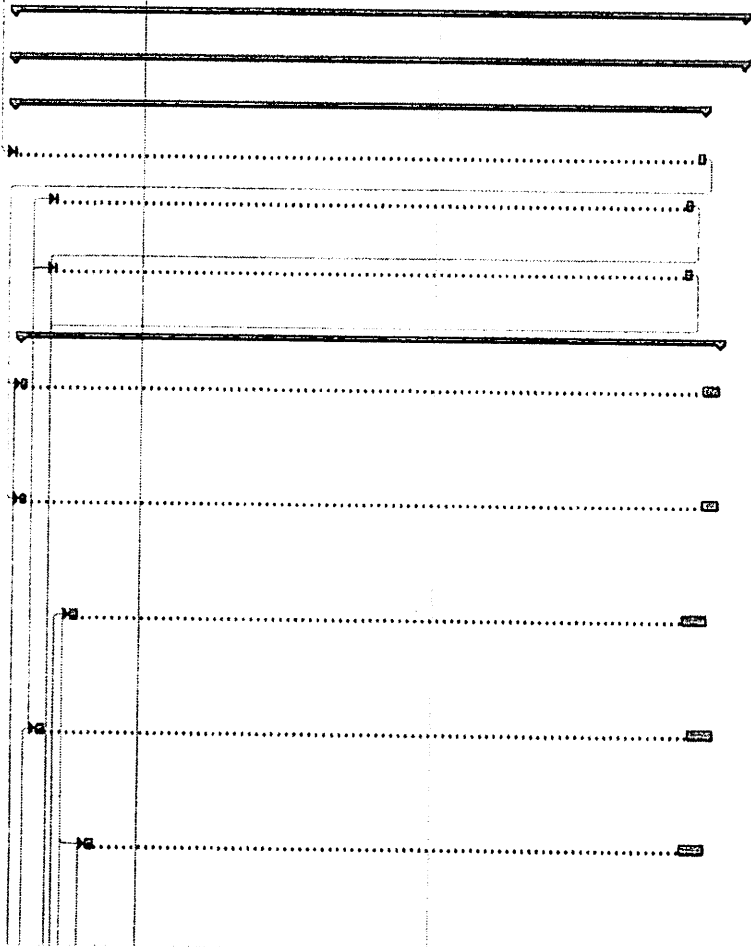



CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA 75LPS, ACUEDUCTO MONTE PLATA, ZONA IV

Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	21	ene '22	feb '22	mar '22	abr '22	may '22	jun '22	jul '22	ago '22	sep '22	oct '22	nov '22	dic '22	ene '23	feb '23	mar '23			
					S-4	S-2 S1	S3 S5	S7 S9	S11 S13	S15 S17	S19 S21	S23 S25	S27 S29	S31 S33	S35 S37	S39 S41	S43 S45	S47 S49	S51 S53	S55 S57	S59 S61	S63	
135	Termómetro para uso general	30 días	mié 08/02/23	vie 10/03/23																			
136	Cono Imhoff con base	30 días	mié 08/02/23	vie 10/03/23																			
137	Jarra 2000 ml cuadrada marca Pyrex	30 días	mié 08/02/23	vie 10/03/23																			
138	Manómetro manual	30 días	mié 08/02/23	vie 10/03/23																			
139	Matraz volumétrico 1000 ml	30 días	mié 08/02/23	vie 10/03/23																			
140	Matraz volumétrico 500 ml	30 días	mié 08/02/23	vie 10/03/23																			
141	Matraz volumétrico 100 ml	30 días	mié 08/02/23	vie 10/03/23																			
142	Materiales gastables menores	30 días	mié 08/02/23	vie 10/03/23																			
143	ÁREA EXTERNA	247,75 días	dom 27/03/22	mar 29/11/22																			
144	VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS	247,75 días	dom 27/03/22	mar 29/11/22																			
145	MOVIMIENTO DE TIERRA:	234,25 días	dom 27/03/22	mié 16/11/22																			
146	Excavación zapatas a mano	3 días	dom 27/03/22	mié 16/11/22																			
147	Reposición material compactado	3 días	dom 10/04/22	sáb 12/11/22																			
148	Bote de material con camión in situ	3 días	dom 10/04/22	sáb 12/11/22																			
149	HORMIGÓN ARMADO EN:	237,25 días	mié 30/03/22	mar 22/11/22																			
150	Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.87 qq/m3, F'c=180 kg/cm²	8 días	mié 30/03/22	mar 22/11/22																			
151	Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08qq/m3 F'c=180 kg/cm²	8 días	mié 30/03/22	mar 22/11/22																			
152	Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qq/m3, F'c=210 kg/cm²	12 días	sáb 16/04/22	sáb 19/11/22																			
153	Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20) m - 3.22 qq/m3, F'c=210 kg/cm²	12 días	mar 05/04/22	lun 21/11/22																			
154	Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m3, F'c=210 kg/cm²	12 días	vie 22/04/22	sáb 19/11/22																			



CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA 75LPS, ACUEDUCTO MONTE PLATA, ZONA IV



Tareas críticas		Atraso		Tareas externas		Tarea manual		Sólo fin	⊞
División crítica	Resumen		Hito externo	↓	Sólo duración		Fecha límite	↓
Tarea		Resumen del proyecto		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Progreso	
División	Tarea crítica resumida		Hito inactivo		Resumen manual			
Hito	◆	División crítica resumida	Resumen inactivo		Sólo el comienzo	⊞		
