


Id	Modo de Tarea	Fase	Nombre de tarea	Duración de línea base	Comienzo de línea base estimado	Fin de línea base	Duración	Comienzo	Fin	Duración real	Comienzo real	Fin real	% Comple	Cronograma											
														feb/22	mar/22	abr/22	may/22	jun/22	jul/22	ago/22	sep/22	oct/22	nov/22	dic/22	
1			AMPLIACION ALCANTARILLADO LAS MATAS DE FARFAN	147.88 días	vie 18/2/22	mié 10/8/22	238.63 días	vie 18/2/22	jue 24/11/22	3.05 días	vie 18/2/22	NOD	1%	[Gantt bar for task 1]											
2			PRELIMINARES	7 días	vie 18/2/22	vie 25/2/22	97.88 días	vie 18/2/22	jun 13/6/22	97.88 días	vie 18/2/22	NOD	99%	[Gantt bar for task 2]											
3	✓		Notificación de adjudicación	0 días	vie 18/2/22	vie 18/2/22	1 día	vie 18/2/22	vie 18/2/22	1 día	vie 18/2/22	vie 18/2/22	100%	[Gantt bar for task 3]											
4	✓		Perfeccionamiento del Contrato	0 días	vie 18/2/22	vie 18/2/22	1 día	vie 18/2/22	vie 18/2/22	1 día	vie 18/2/22	vie 18/2/22	100%	[Gantt bar for task 4]											
5	✓		Constitución de garantías	0 días	vie 18/2/22	vie 18/2/22	1 día	vie 18/2/22	vie 18/2/22	1 día	vie 18/2/22	vie 18/2/22	100%	[Gantt bar for task 5]											
6	✓		Firma del Contrato	0 días	vie 18/2/22	vie 18/2/22	1 día	vie 18/2/22	vie 18/2/22	1 día	vie 18/2/22	vie 18/2/22	100%	[Gantt bar for task 6]											
7	✓		Recepción del anticipo	0 días	vie 18/2/22	vie 18/2/22	1 día	vie 18/2/22	vie 18/2/22	1 día	vie 18/2/22	vie 18/2/22	100%	[Gantt bar for task 7]											
8	✓		Firma de Acta de Inicio	0 días	vie 25/2/22	vie 25/2/22	1 día	mié 18/5/22	mié 18/5/22	1 día	mié 18/5/22	mié 18/5/22	100%	[Gantt bar for task 8]											
9			Otros	0 días	vie 18/2/22	vie 18/2/22	89 días	mar 1/3/22	jun 13/6/22	89 días	mar 1/3/22	NOD	99%	[Gantt bar for task 9]											
10	✓		Recepción de la Ingeniería de Detalle	0 días	vie 18/2/22	vie 18/2/22	1 día	mar 1/3/22	mar 1/3/22	1 día	mar 1/3/22	mar 1/3/22	100%	[Gantt bar for task 10]											
11			Recepción del Estudio de Impacto Ambiental	0 días	vie 18/2/22	vie 18/2/22	0 días	jun 13/6/22	jun 13/6/22	0 días	NOD	NOD	0%	[Gantt bar for task 11]											
12			INICIO DE LA OBRA	0 días	mar 1/3/22	mar 1/3/22	0 días	mié 1/6/22	mié 1/6/22	0 días	NOD	NOD	0%	[Gantt bar for task 12]											
13			MOVILIZACION	10 días	mar 1/3/22	vie 11/3/22	10 días	mié 1/6/22	jun 13/6/22	0 días	NOD	NOD	0%	[Gantt bar for task 13]											
14			PRESENTACIONES AL INGENIERO SUPERVISOR (SUBMITTALS)	7 días	vie 18/2/22	vie 25/2/22	21 días	mié 1/6/22	jun 27/6/22	0 días	NOD	NOD	0%	[Gantt bar for task 14]											
18			PROCURAS CLAVES	30 días	vie 25/2/22	vie 1/4/22	30 días	jun 20/6/22	jun 25/7/22	0 días	NOD	NOD	0%	[Gantt bar for task 18]											
19			Tuberías	30 días	vie 25/2/22	vie 1/4/22	30 días	jun 20/6/22	jun 25/7/22	0 días	NOD	NOD	0%	[Gantt bar for task 19]											
20			TRABAJOS CONTRACTUALES	120 días	vie 11/3/22	jun 1/8/22	116 días	jun 6/6/22	mié 19/10/22	0.49 días	jun 6/6/22	NOD	0%	[Gantt bar for task 20]											
21			REHABILITACIÓN PLANTA AGUAS RESIDUALES	120 días	vie 11/3/22	jun 1/8/22	110.2 días	jun 6/6/22	mié 12/10/22	0.71 días	jun 6/6/22	NOD	1%	[Gantt bar for task 21]											
22			Preliminares	18 días	vie 11/3/22	vie 1/4/22	33.2 días	jun 6/6/22	jue 14/7/22	3.21 días	jun 6/6/22	NOD	10%	[Gantt bar for task 22]											
23			Desyerbe y destronque camino de Acceso y area PTAR	4 días	vie 11/3/22	mié 16/3/22	15 días	jun 6/6/22	mar 28/6/22	2.8 días	jun 6/6/22	NOD	19%	[Gantt bar for task 23]											
24			Excavacion y nivelacion de camino de Acceso	7 días	mié 16/3/22	jue 24/3/22	7 días	mar 28/6/22	mié 6/7/22	0 días	NOD	NOD	0%	[Gantt bar for task 24]											
25			Demolicion y bote de hormigon en taludes Lagunas	7 días	jue 24/3/22	vie 1/4/22	7 días	mié 6/7/22	jue 14/7/22	0 días	NOD	NOD	0%	[Gantt bar for task 25]											
26			Lagunas Facultativas	77 días	vie 1/4/22	sáb 2/7/22	110.2 días	jun 6/6/22	mié 12/10/22	0 días	NOD	NOD	0%	[Gantt bar for task 26]											
27			Sacar Agua de laguna Laguna#2	0 días?	NOD	NOD	10 días	jun 6/6/22	vie 17/6/22	0 días	NOD	NOD	0%	[Gantt bar for task 27]											
28			Movimiento de Tierra	15 días	vie 1/4/22	mié 20/4/22	15 días	jue 14/7/22	jun 1/8/22	0 días	NOD	NOD	0%	[Gantt bar for task 28]											
29			Fondo de Laguna	65 días	sáb 9/4/22	jun 27/6/22	65 días	vie 22/7/22	jue 6/10/22	0 días	NOD	NOD	0%	[Gantt bar for task 29]											
30			Revestimientos de Taludes	40 días	mié 20/4/22	mar 7/6/22	40 días	jun 1/8/22	vie 16/9/22	0 días	NOD	NOD	0%	[Gantt bar for task 30]											
31			Vettedero de Salida	15 días	mar 7/6/22	vie 24/6/22	15 días	vie 16/9/22	mar 4/10/22	0 días	NOD	NOD	0%	[Gantt bar for task 31]											
32			Registros	22 días	mar 7/6/22	sáb 2/7/22	22 días	vie 16/9/22	mié 12/10/22	0 días	NOD	NOD	0%	[Gantt bar for task 32]											
33			Fin Lagunas Facultativas	0 días	sáb 2/7/22	sáb 2/7/22	0 días	mié 12/10/22	mié 12/10/22	0 días	NOD	NOD	0%	[Gantt bar for task 33]											
34			Laguna de Acabado	55 días	mié 20/4/22	vie 24/6/22	55 días	jun 1/8/22	mar 4/10/22	0 días	NOD	NOD	0%	[Gantt bar for task 34]											
35			Movimiento de Tierra	8 días	mié 20/4/22	vie 29/4/22	8 días	jun 1/8/22	mar 9/8/22	0 días	NOD	NOD	0%	[Gantt bar for task 35]											
36			Fondo de Laguna	20 días	jue 28/4/22	jun 23/5/22	20 días	mar 9/8/22	jue 1/9/22	0 días	NOD	NOD	0%	[Gantt bar for task 36]											
37			Revestimientos de Taludes	15 días	vie 29/4/22	mié 18/5/22	15 días	mar 9/8/22	sáb 27/8/22	0 días	NOD	NOD	0%	[Gantt bar for task 37]											
38			Muros Mampostería	30 días	mié 18/5/22	mié 22/6/22	30 días	sáb 27/8/22	sáb 1/10/22	0 días	NOD	NOD	0%	[Gantt bar for task 38]											
39			Terminaciones	25 días	jue 26/5/22	vie 24/6/22	25 días	jun 5/9/22	mar 4/10/22	0 días	NOD	NOD	0%	[Gantt bar for task 39]											
40			Vettederos	15 días	jue 26/5/22	jun 13/6/22	15 días	jun 5/9/22	jue 22/9/22	0 días	NOD	NOD	0%	[Gantt bar for task 40]											
41			Fin Lagunas Acabado	0 días	vie 24/6/22	vie 24/6/22	0 días	mar 4/10/22	mar 4/10/22	0 días	NOD	NOD	0%	[Gantt bar for task 41]											
42			Desarenador	74 días	vie 29/4/22	mar 26/7/22	60 días	jun 4/7/22	jun 12/9/22	0 días	NOD	NOD	0%	[Gantt bar for task 42]											
43			Movimiento de Tierra	1 día	vie 29/4/22	sáb 30/4/22	1 día	jun 4/7/22	mar 5/7/22	0 días	NOD	NOD	0%	[Gantt bar for task 43]											
44			Hormigones	14 días	mié 18/5/22	jue 2/6/22	14 días	mar 5/7/22	jue 21/7/22	0 días	NOD	NOD	0%	[Gantt bar for task 44]											
45			Terminaciones	10 días	jue 2/6/22	mar 14/6/22	10 días	jue 21/7/22	mar 2/8/22	0 días	NOD	NOD	0%	[Gantt bar for task 45]											
46			Compuertas y Accesorios	5 días	mar 14/6/22	mar 21/6/22	5 días	mar 2/8/22	jun 8/8/22	0 días	NOD	NOD	0%	[Gantt bar for task 46]											
47			Caseta Vigilante	30 días	mar 21/6/22	mar 26/7/22	30 días	jun 8/8/22	jun 12/9/22	0 días	NOD	NOD	0%	[Gantt bar for task 47]											

Proyecto: CRONOGRAMA ALCA
Fecha: mar 14/6/22

Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Hito de línea base	Progreso manual
División	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Resumen de línea base	Tareas críticas
Hito	Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas externas	Línea base	Progreso	Tareas divididas

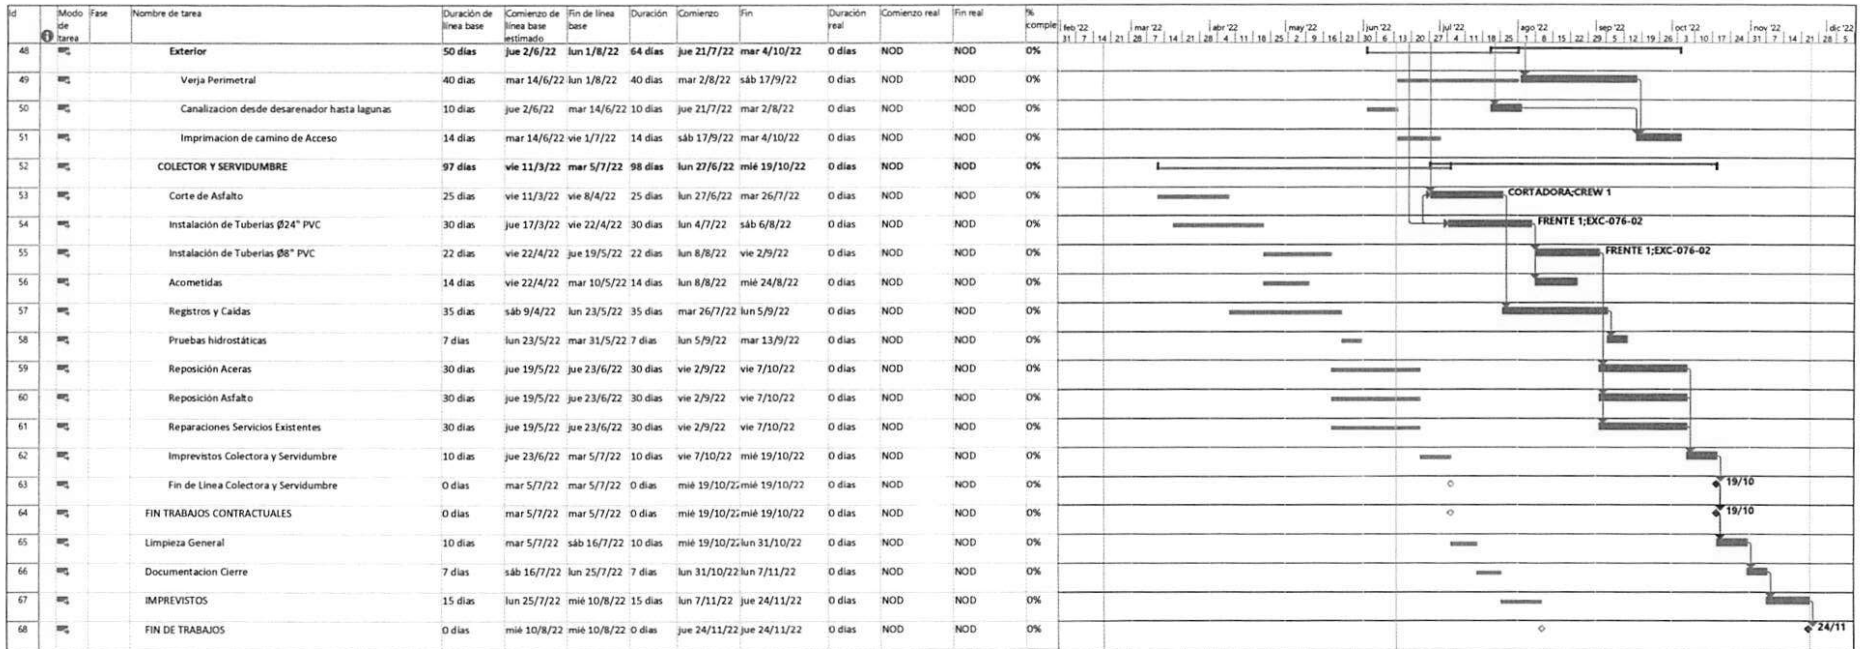

[Handwritten signature]

Proyecto: CRONOGRAMA ALCA
 Fecha: mar 14/6/22

Tarea División Hitos	Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva	Hitos inactivos Resumen inactivo Tarea manual	solo duración Informe de resumen manual Resumen manual	solo el comienzo solo fin Tareas externas	Hitos externos Fecha límite Línea base	Hitos de línea base Resumen de línea base Progreso	Progreso manual Tareas críticas Tareas divididas
----------------------------	---	---	--	---	--	--	--

Página 2
