


ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene
2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023
dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic

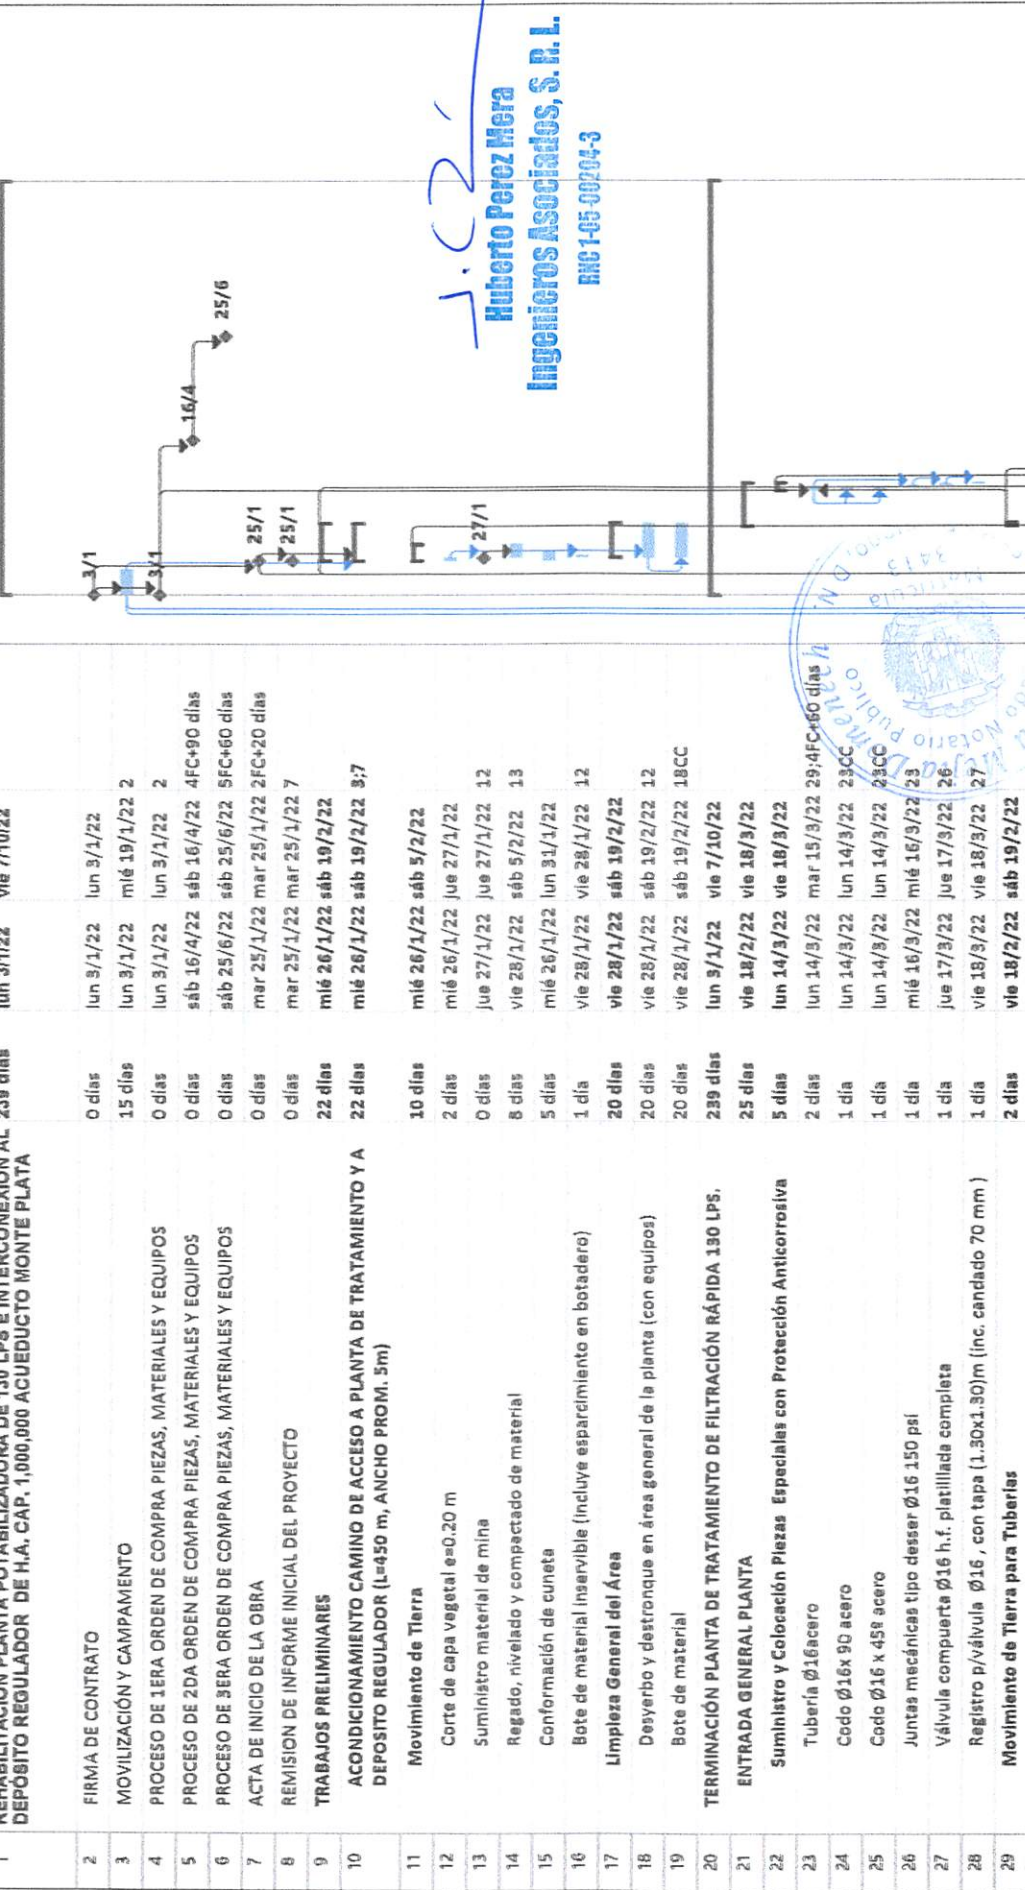

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE 130 LPS E INTERCONEXIÓN AL DEPÓSITO REGULADOR DE H.A. CAP. 1,000,000 ACUEDUCTO MONTE PLATA	239 días	lun 3/1/22	vie 7/10/22	
2	FIRMA DE CONTRATO	0 días	lun 3/1/22	lun 3/1/22	
3	MOVILIZACIÓN Y CAMPAMENTO	15 días	lun 3/1/22	mié 19/1/22	2
4	PROCESO DE 1ERA ORDEN DE COMPRA PIEZAS, MATERIALES Y EQUIPOS	0 días	lun 3/1/22	lun 3/1/22	2
5	PROCESO DE 2DA ORDEN DE COMPRA PIEZAS, MATERIALES Y EQUIPOS	0 días	sáb 16/4/22	sáb 16/4/22	4FC+90 días
6	PROCESO DE 3ERA ORDEN DE COMPRA PIEZAS, MATERIALES Y EQUIPOS	0 días	sáb 25/6/22	sáb 25/6/22	5FC+60 días
7	ACTA DE INICIO DE LA OBRA	0 días	mar 25/1/22	mar 25/1/22	2FC+20 días
8	REMISION DE INFORME INICIAL DEL PROYECTO	0 días	mar 25/1/22	mar 25/1/22	7
9	TRABAJOS PRELIMINARES	22 días	mié 26/1/22	sáb 19/2/22	
10	ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE ACCESO A PLANTA DE TRATAMIENTO Y A DEPÓSITO REGULADOR (L=450 m, ANCHO PROM. 5m)	22 días	mié 26/1/22	sáb 19/2/22	3;7
11	Movimiento de Tierra	10 días	mié 26/1/22	sáb 5/2/22	
12	Corte de capa vegetal e=0.20 m	2 días	mié 26/1/22	jue 27/1/22	
13	Suministro material de mina	0 días	jue 27/1/22	jue 27/1/22	12
14	Regado, nivelado y compactado de material	8 días	vie 28/1/22	sáb 5/2/22	13
15	Conformación de cuneta	5 días	mié 26/1/22	lun 31/1/22	
16	Bote de material inservible (incluye esparcimiento en botadero)	1 día	vie 28/1/22	vie 28/1/22	12
17	Limpieza General del Área	20 días	vie 28/1/22	sáb 19/2/22	
18	Desyerbo y destronque en área general de la planta (con equipos)	20 días	vie 28/1/22	sáb 19/2/22	12
19	Bote de material	20 días	vie 28/1/22	sáb 19/2/22	18CC
20	TERMINACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACIÓN RÁPIDA 130 LPS.	239 días	lun 3/1/22	vie 7/10/22	
21	ENTRADA GENERAL PLANTA	25 días	vie 18/2/22	vie 18/3/22	
22	Suministro y Colocación Piezas Especiales con Protección Anticorrosiva	5 días	lun 14/3/22	vie 18/3/22	
23	Tubería Ø16acero	2 días	lun 14/3/22	mar 15/3/22	29;4FC+60 días
24	Codo Ø16x 90 acero	1 día	lun 14/3/22	lun 14/3/22	23CC
25	Codo Ø16 x 45º acero	1 día	lun 14/3/22	lun 14/3/22	23CC
26	Junetas mecánicas tipo desarr Ø16 150 psi	1 día	mié 16/3/22	mié 16/3/22	23
27	Válvula compuerta Ø16 h.f. platillada completa	1 día	jue 17/3/22	jue 17/3/22	26
28	Registro p/válvula Ø16 , con tapa (1.30x1.30)m (inc. candidato 70 mm )	1 día	vie 18/3/22	vie 18/3/22	27
29	Movimiento de Tierra para Tuberías	2 días	vie 18/2/22	sáb 19/2/22	

Proyecto: Cronograma Monte P  
 Fecha: sáb 11/9/21

Tarea: Tarea inactiva  
 División: Hito inactivo  
 Hito: Resumen inactivo  
 Resumen: Tarea manual  
 Resumen del proyecto: solo duración

Hito externo: Fecha limite  
 Progreso: Progreso manual

Informe de resumen manual  
 solo el comienzo  
 solo fin  
 Tareas externas











Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	tri 1, 2022		tri 2, 2022		tri 3, 2022			tri 4, 2022		tri 1, 2023	
						dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct
115	Grava 11/2 @ 21/2 e=0.20 m + 15% reacomodo	1 día	vie 13/5/22	vie 13/5/22	114CC											
116	<b>CANAleta EN FILTRO</b>	8 días	sáb 30/4/22	lun 9/5/22												
117	<b>Hormigón Armado (f'c=280 kg/cm²)</b>	2 días	sáb 30/4/22	lun 2/5/22												
118	Losa de fondo 0.20 (3.44 qq/m³)	1 día	sáb 30/4/22	sáb 30/4/22	83											
119	Muros 0.20 (3.44 qq/m³)	1 día	lun 2/5/22	lun 2/5/22	118											
120	<b>Terminación de Superficie</b>	6 días	mar 3/5/22	lun 9/5/22												
121	Pañete interior pulido	3 días	mar 3/5/22	jue 5/5/22	119											
122	Fino losa fondo	1 día	vie 6/5/22	vie 6/5/22	121											
123	Cantos	3 días	vie 6/5/22	lun 9/5/22	121											
124	<b>CANAL DESAGÜE RETROLAVADO</b>	3 días	mar 3/5/22	jue 5/5/22												
125	<b>Hormigón Armado (f'c=280 kg/cm²)</b>	1 día	mar 3/5/22	mar 3/5/22												
126	Muros 0.30 (2.38 qq/m³)	1 día	mar 3/5/22	mar 3/5/22	119											
127	<b>Terminación de Superficie :</b>	2 días	mié 4/5/22	jue 5/5/22												
128	Fino losa fondo	1 día	mié 4/5/22	mié 4/5/22	126											
129	Cantos	1 día	jue 5/5/22	jue 5/5/22	128											
130	<b>CANAL DESAGÜE DE FILTROS</b>	2 días	jue 5/5/22	vie 6/5/22												
131	<b>Terminación de Superficie</b>	2 días	jue 5/5/22	vie 6/5/22												
132	Fino losa fondo	1 día	jue 5/5/22	jue 5/5/22	128											
133	Cantos	1 día	vie 6/5/22	vie 6/5/22	129											
134	<b>CANAL DE INTERCONEXION ENTRE FILTROS</b>	5 días	mar 10/5/22	sáb 14/5/22												
135	<b>Terminación de Superficie</b>	5 días	mar 10/5/22	sáb 14/5/22												
136	Pañete interior pulido	3 días	mar 10/5/22	jue 12/5/22	120											
137	Fino losa fondo	1 día	vie 13/5/22	vie 13/5/22	136											
138	Cantos	1 día	sáb 14/5/22	sáb 14/5/22	137											
139	<b>CÁMARA DE SALIDA</b>	24 días	mié 4/5/22	mar 31/5/22												
140	<b>Hormigón Armado (f'c=280 kg/cm²)</b>	5 días	mié 4/5/22	lun 9/5/22												
141	Muros 0.30 (1.18 qq/m³)	5 días	mié 4/5/22	lun 9/5/22	126											
142	<b>Terminación de Superficie</b>	3 días	lun 16/5/22	mié 18/5/22												
143	Pañete interior pulido	1 día	lun 16/5/22	lun 16/5/22	135											
144	Fino losa fondo	1 día	mar 17/5/22	mar 17/5/22	143											
145	Cantos	1 día	mié 18/5/22	mié 18/5/22	144											

  
**Huberto Perez Mera**  
**Ingenieros Asociados, S. R. L.**  
**RNC 1-05-00204-3**

Proyecto: Cronograma Monte P Fecha: sáb 11/9/21	Tarea		Tarea Inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito Inactiva	Resumen manual		Fecha limite	
	Hito		Resumen Inactivo	solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual	solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas			

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	tri 1, 2022			tri 2, 2022			tri 3, 2022			tri 4, 2022			tri 1, 2023	
						dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene
146	<b>Instalaciones</b>	2 días	mié 4/5/22	jue 5/5/22															
147	Vertedor de control (0.80 x 0.90) m	2 días	mié 4/5/22	jue 5/5/22	141CC														
148	<b>Instalaciones (Suministro y Colocación)</b>	6 días	mié 25/5/22	mar 31/5/22															
149	Tubería ø20 acero	2 días	mié 25/5/22	jue 26/5/22	156														
150	Codo ø20 x 90º acero	1 día	mié 25/5/22	mié 25/5/22	149CC														
151	Codo ø20 x 45º acero	1 día	mié 25/5/22	mié 25/5/22	149CC														
152	Tee ø20 x ø20 acero	1 día	mié 25/5/22	mié 25/5/22	149CC														
153	Anclajes de hormigón simple para piezas	1 día	mié 25/5/22	mié 25/5/22	149CC														
154	Válvula compuerta 20 h.f. platillada completa	2 días	jue 26/5/22	vie 27/5/22	153														
155	Registro de 1.50 x 1.50 m con tapa metálica p/válvula (Incluye pintura)	3 días	sáb 28/5/22	mar 31/5/22	154														
156	<b>Movimiento de Tierra p/Tuberías</b>	8 días	lun 16/5/22	mar 24/5/22															
157	Excavación en roca c/compresor	6 días	lun 16/5/22	sáb 21/5/22	134														
158	Relleno compactado c/compactador mecánico	2 días	lun 23/5/22	mar 24/5/22	157														
159	Bote de material inservible (Incluye esparcimiento en botadero)	6 días	lun 16/5/22	sáb 21/5/22	157CC														
160	<b>CANAL PRINCIPAL DE DESAGÜE</b>	21 días	mié 1/6/22	vie 24/6/22															
161	<b>Terminación de Superficie</b>	7 días	vie 17/6/22	vie 24/6/22															
162	Fino losa fondo	2 días	vie 17/6/22	sáb 18/6/22	164														
163	Cantos	5 días	lun 20/6/22	vie 24/6/22	162														
164	<b>Suministro y Colocación de</b>	12 días	vie 3/6/22	jue 16/6/22															
165	Tubería ø20 pvc (sdr-32.5)	3 días	vie 3/6/22	lun 6/6/22	175														
166	Tubería ø20 acero	3 días	mar 7/6/22	jue 9/6/22	165														
167	Codo ø20x 90º acero	3 días	mar 7/6/22	jue 9/6/22	166CC														
168	Tee ø20 x 20 acero	3 días	mar 7/6/22	jue 9/6/22	166CC														
169	Junta dresser ø20	3 días	mar 7/6/22	jue 9/6/22	166CC														
170	Anclajes hs p/piezas acero	3 días	mar 7/6/22	jue 9/6/22	166CC														
171	Registros c/tapa metálica (0.80x0.80) m	1 día	vie 10/6/22	vie 10/6/22	170														
172	Registros c/tapa metálica (1.00x1.00) m	1 día	sáb 11/6/22	sáb 11/6/22	171														
173	Registros c/rejilla (1.10x1.50)m	1 día	lun 13/6/22	lun 13/6/22	172														
174	Escaleras tipo gato de h.g. h=3.00 m	3 días	mar 14/6/22	jue 16/6/22	173														
175	<b>Movimiento de Tierra p/Tuberías</b>	2 días	mié 1/6/22	jue 2/6/22															
176	Excavación material no clasificado c/equipo	1 día	mié 1/6/22	mié 1/6/22	139														

  
**Huberto Perez Mera**  
**Ingenieros Asociados, S. R. L.**  
 RNC 1-05-00204-3

Proyecto: Cronograma Monte P Fecha: sáb 11/9/21	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			





Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	tri 1, 2022		tri 2, 2022			tri 3, 2022			tri 4, 2022			tri 1, 2023	
						dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
208	Cantos	4 días	sáb 23/7/22	mié 27/7/22	209													
209	Pañete interior pulido	1 día	vie 22/7/22	vie 22/7/22	206													
210	Fino losa fondo	1 día	sáb 23/7/22	sáb 23/7/22	209													
211	Revestido fibra de vidrio tina	2 días	lun 25/7/22	mar 26/7/22	210													
212	Piso de mosaicos	5 días	mié 27/7/22	lun 1/8/22	211													
213	Pintura (Inc. base blanca)	12 días	mar 2/8/22	lun 15/8/22	212													
214	Pañete interior pulido	5 días	sáb 23/7/22	jue 28/7/22	209													
215	Pañete techo	3 días	vie 29/7/22	lun 1/8/22	214													
216	Antepecho	3 días	mar 12/7/22	jue 14/7/22	203													
217	<b>Escalera Acceso a Tina</b>	<b>9 días</b>	<b>mar 16/8/22</b>	<b>jue 25/8/22</b>														
218	Rampa de escalera 0.10 (2.47qq/m³), f'c=280 kg/cm²	3 días	mar 16/8/22	jue 18/8/22	205													
219	Escalones de Hormigón Simple	1 día	vie 19/8/22	vie 19/8/22	218													
220	Fino	1 día	sáb 20/8/22	sáb 20/8/22	219													
221	Pañete interior pulido	1 día	lun 22/8/22	lun 22/8/22	220													
222	Cantos	1 día	mar 23/8/22	mar 23/8/22	221													
223	Pasamanos	2 días	mié 24/8/22	jue 25/8/22	222													
224	<b>Escalera Acceso a Tina</b>	<b>7 días</b>	<b>mar 16/8/22</b>	<b>mar 29/8/22</b>														
225	Rampa de escalera 0.10 (2.47qq/m³), f'c=280 kg/cm²	2 días	mar 16/8/22	mié 17/8/22	218CC													
226	Escalones de Hormigón Simple	1 día	jue 18/8/22	jue 18/8/22	225													
227	Fino	1 día	vie 19/8/22	vie 19/8/22	226													
228	Pañete interior pulido	1 día	sáb 20/8/22	sáb 20/8/22	227													
229	Cantos	1 día	lun 22/8/22	lun 22/8/22	228													
230	Pasamanos	1 día	mar 23/8/22	mar 23/8/22	229													
231	<b>Portajes</b>	<b>5 días</b>	<b>sáb 27/8/22</b>	<b>jue 1/9/22</b>														
232	Puerta metálica (2.00 x 2.10) m	2 días	sáb 27/8/22	lun 29/8/22	234													
233	Puerta EVERLAST (Inc instalación)	3 días	mar 30/8/22	jue 1/9/22	232													
234	<b>Ventanas</b>	<b>3 días</b>	<b>mié 24/8/22</b>	<b>vie 26/8/22</b>														
235	Ventana aluminio	3 días	mié 24/8/22	vie 26/8/22	224													
236	Escalera interior caracol; d=2.00 m, h=2.50 m	3 días	mié 24/8/22	vie 26/8/22	224													
237	Tarima de madera p/sulfato ( 2.10x1.40x0.20 )	2 días	sáb 27/8/22	lun 29/8/22	236													
238	Bomba dosificadores doctec 40p, pistón 1 hp 90 gph, 100 psi pp	2 días	mar 30/8/22	mié 31/8/22	237													

  
**Huberto Perez Mera**  
**Ingenieros Asociados, S. I**  
 RNC 1-85-00204-3















Proyecto: Cronograma Monte P Fecha: sáb 11/9/21	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual	solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas			





Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	tri 1, 2022			tri 2, 2022			tri 3, 2022			tri 4, 2022			tri 1, 2023		
						dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	
239	Agitadores de sulfato, 1hp, 60 hp 370 w brida - 13m turbina 120	3 días	jue 1/9/22	sáb 3/9/22	238															
240	Bomba 1 hp (Inc.sum.col. y accesorios)	3 días	lun 5/9/22	mié 7/9/22	239															
241	<b>ELEVADOR DE SULFATO (Estructura Metálica en Elevador)</b>	<b>10 días</b>	<b>vie 26/8/22</b>	<b>mié 7/9/22</b>																
242	Tola de 4 x 82 x 3/16	0 días	vie 26/8/22	vie 26/8/22	234															26/8
243	Cortes de tola	0 días	vie 26/8/22	vie 26/8/22	242CC															26/8
244	Tubo de 2 h.g. espesor grueso	0 días	vie 26/8/22	vie 26/8/22	242CC															26/8
245	Tubo de 2 1/2 h.g. espesor grueso	0 días	vie 26/8/22	vie 26/8/22	242CC															26/8
246	Barra cuadradas 3/4 x 3/4	0 días	vie 26/8/22	vie 26/8/22	242CC															26/8
247	Barra cuadradas 1/2 x 1/2	0 días	vie 26/8/22	vie 26/8/22	242CC															26/8
248	Angulares 2 x 2 x 1/4	0 días	vie 26/8/22	vie 26/8/22	242CC															26/8
249	Angulares 1 1/2 x 1 1/2 x 1/4	0 días	vie 26/8/22	vie 26/8/22	242CC															26/8
250	Planchas de malla desplegable 3/4	0 días	vie 26/8/22	vie 26/8/22	242CC															26/8
251	Cable de acero cap. 18,960 lb	0 días	vie 26/8/22	vie 26/8/22	242CC															26/8
252	Grapas p/ cable de 1/2	0 días	vie 26/8/22	vie 26/8/22	242CC															26/8
253	Grillete de 2 ton.	0 días	vie 26/8/22	vie 26/8/22	242CC															26/8
254	Guardacabo p/ cable de 1/2	0 días	vie 26/8/22	vie 26/8/22	242CC															26/8
255	Planchuelas de 3 x 3/8	0 días	vie 26/8/22	vie 26/8/22	242CC															26/8
256	Perfil I, con ojal de sujeción	0 días	vie 26/8/22	vie 26/8/22	242CC															26/8
257	Spring industrial de 4 p/ soporte	0 días	vie 26/8/22	vie 26/8/22	242CC															26/8
258	Mano obra estructura metálica y soldadura	8 días	sáb 27/8/22	lun 5/9/22	242															26/8
259	Suministro y colocación de diferencial capacidad 1 tonelada (cubicar con factura)	2 días	mar 6/9/22	mié 7/9/22	258															26/8
260	<b>Desagüe tina p/sulfato</b>	<b>4 días</b>	<b>jue 8/9/22</b>	<b>lun 12/9/22</b>																
261	Tubería Ø3 PVC (SDR-26)	2 días	jue 8/9/22	vie 9/9/22	241															
262	Codo Ø3 x 90º PVC	1 día	jue 8/9/22	jue 8/9/22	261CC															
263	Tee Ø3 x Ø3 PVC	1 día	jue 8/9/22	jue 8/9/22	261CC															
264	Válvula compuerta Ø3 HF platillada completa.	2 días	sáb 10/9/22	lun 12/9/22	261															
265	<b>Instalaciones Sanitarias</b>	<b>22 días</b>	<b>mar 13/9/22</b>	<b>vie 7/10/22</b>																
266	Lavamanos completo	1 día	mar 13/9/22	mar 13/9/22	260															
267	Inodoro y accesorios	1 día	mar 13/9/22	mar 13/9/22	266CC															
268	Piletas/azulejos	1 día	mié 14/9/22	mié 14/9/22	267															

  
**Huberto Perez Mera**  
**Ingenieros Asociados, S. R. L.**  
**RNC 1-05-00204-3**

Proyecto: Cronograma Monte P Fecha: sáb 11/9/21	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual	solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas			



















Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	tri 1, 2022			tri 2, 2022			tri 3, 2022			tri 4, 2022			tri 1, 2023	
						dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene
422	Zabaleta	2 días	lun 15/8/22	mar 16/8/22	417														
423	<b>PORTAJE</b>	<b>1 día</b>	<b>lun 22/8/22</b>	<b>lun 22/8/22</b>															
424	Puerta everlast	1 día	lun 22/8/22	lun 22/8/22	413														
425	Acera exterior de 0.60 m	3 días	sáb 6/8/22	mar 9/8/22	413CC														
426	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>	<b>8 días</b>	<b>sáb 6/8/22</b>	<b>lun 15/8/22</b>															
427	Entrada eléctrica	4 días	mar 9/8/22	vie 12/8/22	428														
428	Salida eléctrica	2 días	sáb 6/8/22	lun 8/8/22	410														
429	Interruptores sencillos	1 día	sáb 13/8/22	sáb 13/8/22	427														
430	Tomacorrientes sencillos	1 día	lun 15/8/22	lun 15/8/22	429														
431	Logo y letrero de inapa	0 días	vie 22/7/22	vie 22/7/22	401														
432	<b>SISTEMA DE CLORACIÓN :</b>	<b>15 días</b>	<b>lun 15/8/22</b>	<b>jue 1/9/22</b>	<b>426</b>														
433	Dosificador de cloro aplicación al vacío	0 días	lun 15/8/22	lun 15/8/22															
434	Bomba rompedora de presión	0 días	lun 15/8/22	lun 15/8/22															
435	Arrancador magnético 230 voltios	0 días	lun 15/8/22	lun 15/8/22															
436	Cilindro de gas cloro lleno ( instalado )	0 días	lun 15/8/22	lun 15/8/22															
437	Accesorios	0 días	lun 15/8/22	lun 15/8/22															
438	Registro de aplicación	0 días	lun 15/8/22	lun 15/8/22															
439	Mano de obra	15 días	mar 16/8/22	jue 1/9/22															
440	Limpieza final	5 días	mié 31/8/22	lun 5/9/22	432FC-2 días														
441	<b>CASA PARA GENERADOR</b>	<b>34 días</b>	<b>sáb 30/7/22</b>	<b>mié 7/9/22</b>															
442	<b>TRABAJOS PELIMINARES</b>	<b>1 día</b>	<b>sáb 30/7/22</b>	<b>sáb 30/7/22</b>															
443	Replanteo	1 día	sáb 30/7/22	sáb 30/7/22	403														
444	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>	<b>4 días</b>	<b>lun 1/8/22</b>	<b>jue 4/8/22</b>															
445	Excavación en material clasificado a mano	2 días	lun 1/8/22	mar 2/8/22	442														
446	Relleno de reposición	2 días	mié 3/8/22	jue 4/8/22	445														
447	<b>HORMIGÓN ARMADO (f'c=210 kg/cm²)</b>	<b>15 días</b>	<b>vie 5/8/22</b>	<b>lun 22/8/22</b>															
448	Zapata de muro de 0.60x0.25 ( 0.71 qq/m³)	5 días	vie 5/8/22	mié 10/8/22	444														
449	Zapata de columnas de 1.00 x 1.00 m ( 0.41 qq/m³)	2 días	vie 5/8/22	sáb 6/8/22	448CC														
450	Viga de amarre (0.15 x 0.15) 4.57 qq/m³	2 días	mié 17/8/22	jue 18/8/22	452														
451	Losa de techo 0.10 - 1.04 qq/m³	3 días	vie 19/8/22	lun 22/8/22	450														
452	<b>MAMPOSTERIA</b>	<b>5 días</b>	<b>jue 11/8/22</b>	<b>mar 16/8/22</b>															

J.C.  
**Huberto Perez Mera**  
**Ingenieros Asociados S. R. L.**  
 RNC 1-95-98204-3

Proyecto: Cronograma Monte P Fecha: sáb 11/9/21	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual	solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas			















