


INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS INAPA

**LINEA DE IMPULSION DESDE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 125 LPS HASTA DEPOSITO REGULADOR DE 1500 M3 DEL ACUEDUCTO MULTIPLE
VILLA RIVAS
CPS-023-2014**

OFERENTE: ING. ANGEL CARLOS SCHIFFINO PERALTA

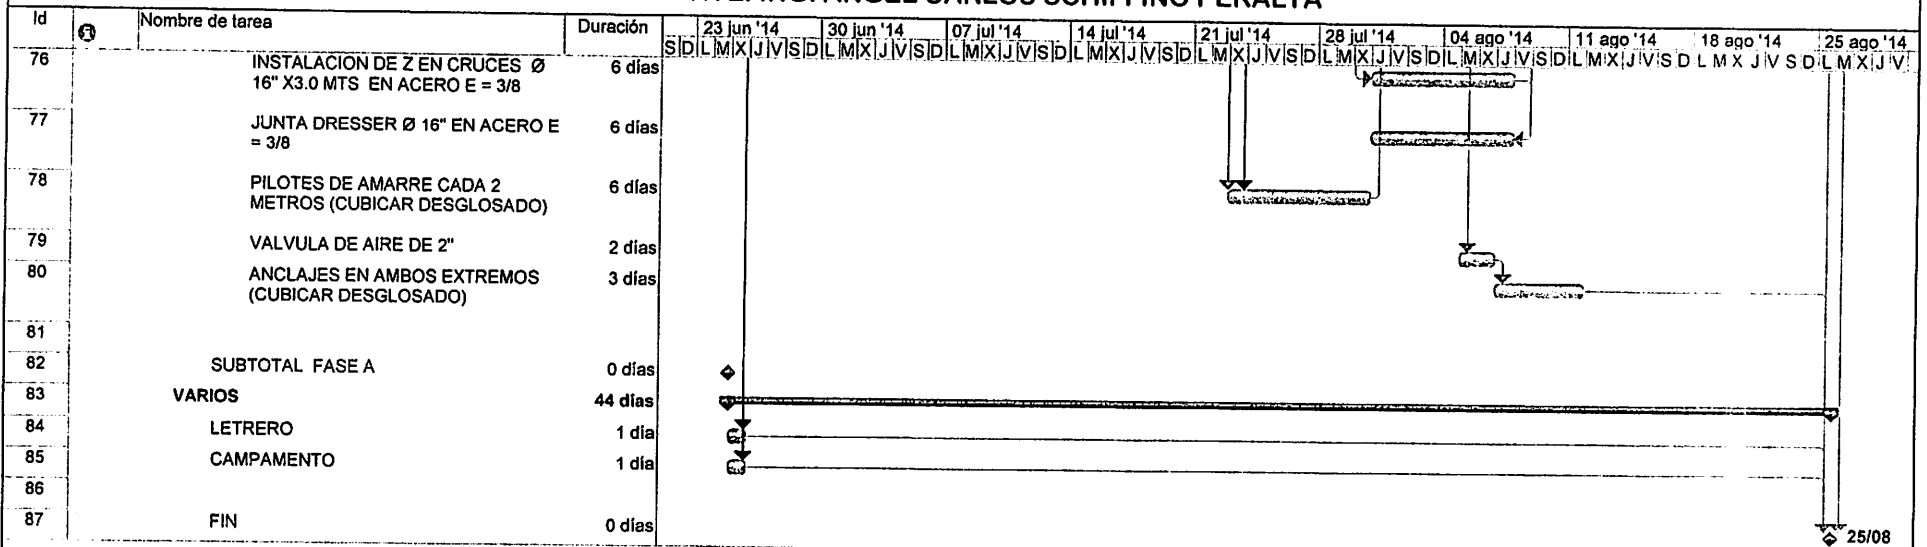


Peralta S.

Tarea		Resumen		Progreso resumido		Agrupar por síntesis	
Tarea crítica		Tarea resumida		División		Fecha límite	
Progreso		Tarea crítica resumida		Tareas externas			
Hito	◆	Hito resumido	◇	Resumen del proyecto			

ID	Task Name	Duration	Predecessors
1	CASA DE OPERADOR	20 days	
2	ACERA PERIMETRAL	11 days	1FS-3 days
3	CORRECCION DE GRIETAS	2.25 days	1FS-4 days
4	ESTACION DE BOMBEO No. 2	14 days	1
5	CASA DE QUIMICOS	3 days	
6	ESTACION DE BOMBEO No. 1	9 days	4
7	AREA DE CLORACION	10 days	
8	AREA FLOCULADORES	2 days	1FS-7 days
9	AREA SEDIMENTADORES	5 days	8FS-1 day
10	PLANTA DE TRATAMIENTO	1 day	9
11	FILTROS	14 days	9FS-2 days
12	VERJA PERIMETRAL EXISTENTE	2 days	
13	ESCALONES VERJA PERIMETRAL POSTERIOR	25 days	12
14	LIMPIEZA	3 days	13
15	LINEA DE IMPULSION AL TANQUE REGULADOR	1 day	
16	CASETA GENERADOR	1 day	15
17	MICELANEOS	4 days	16
18	SUMINISTRO	20 days	9

Project: LICITACION VILLA RIVA
Date: Sat 22-03-14

Task
Split
Milestone










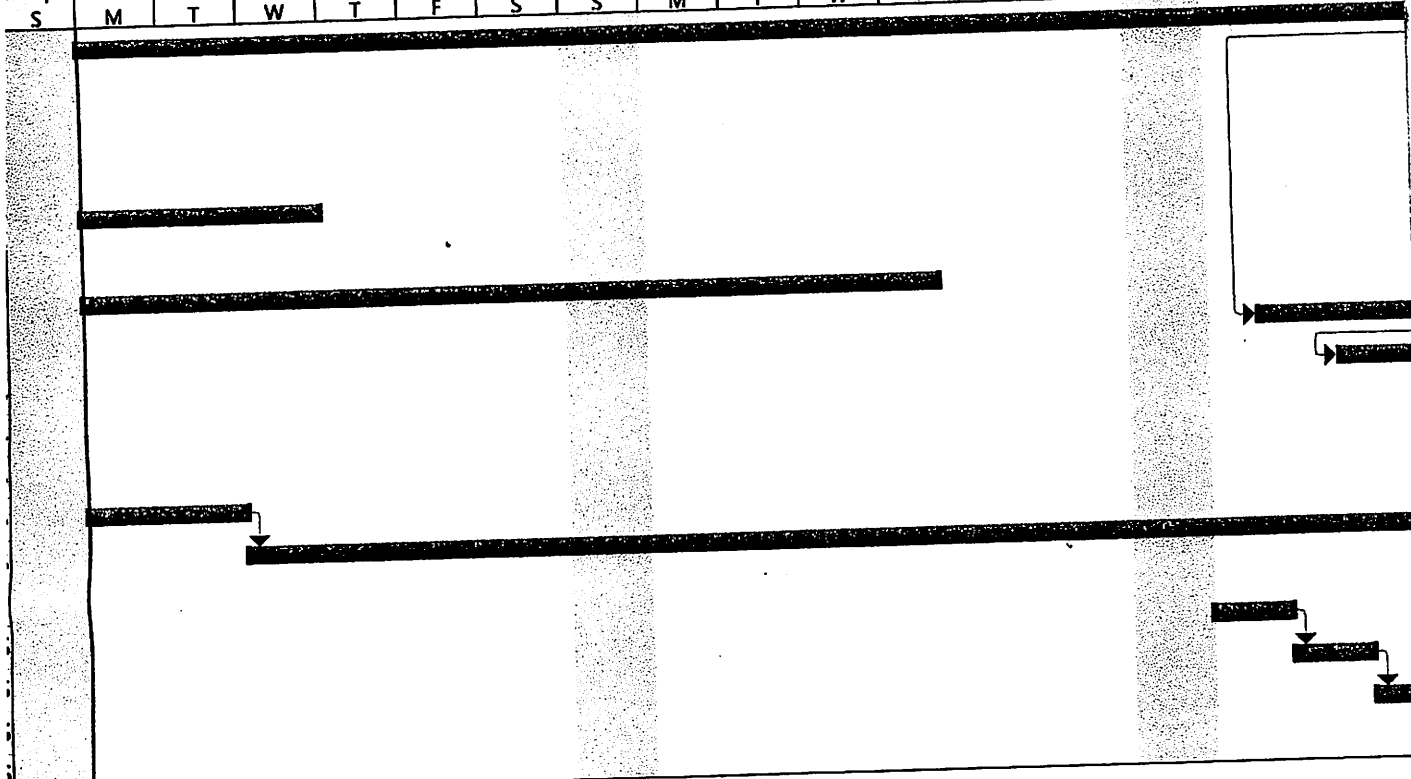


Summary
Project Summary
Inactive Task


20 Apr '14

27 Apr '14

04 May '14



-  Inactive Milestone
-  Inactive Summary
-  Manual Task
-  Duration-only
-  Manual Summary Rollup
-  Manual Summary
-  Start-only
-  Finish-only
-  External Tasks

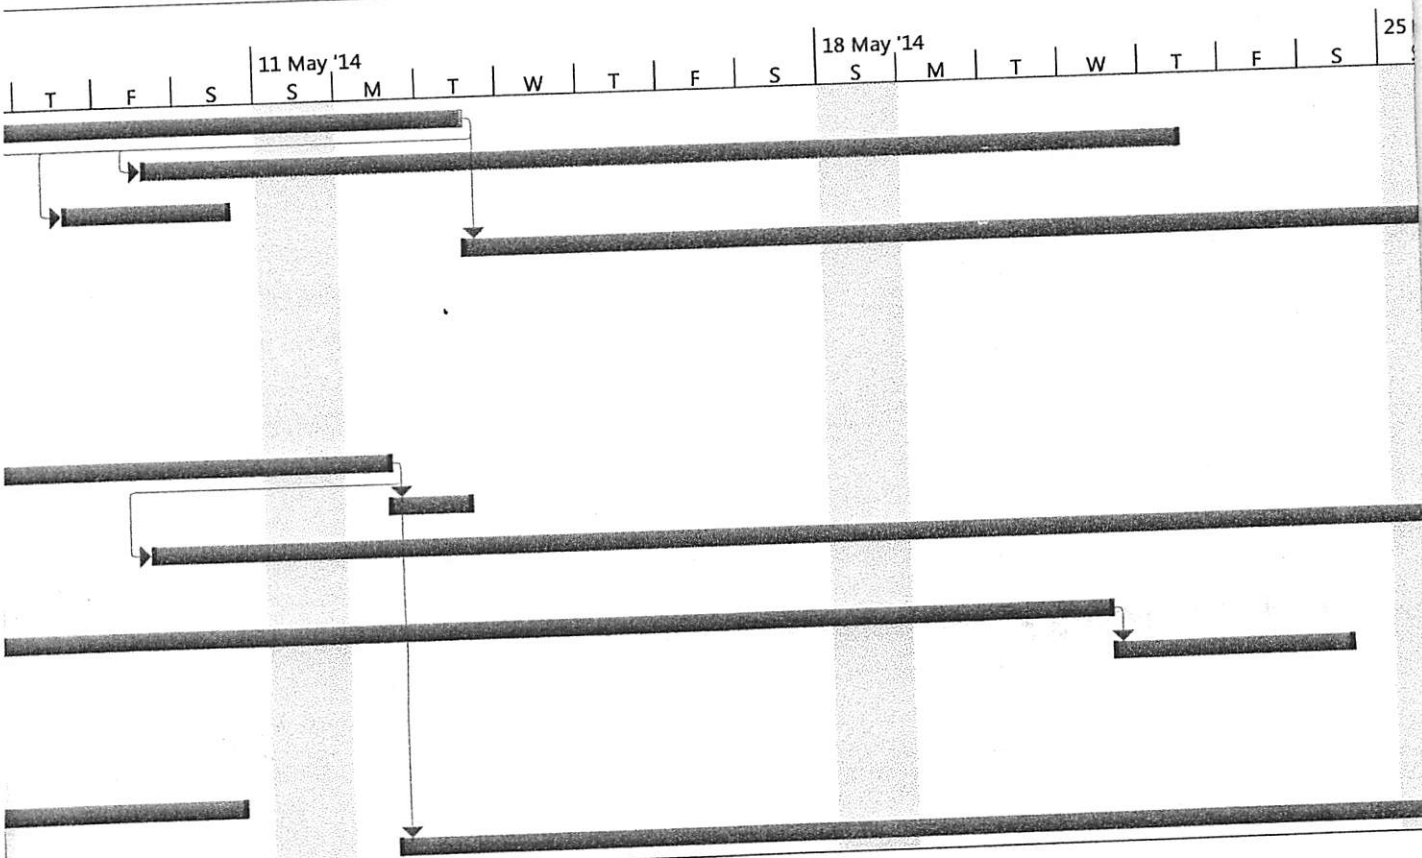

	External Milestone	◆	Path Predecessor Summary Task		Manual
	Deadline	↓	Path Predecessor Normal Task		
	Path Predecessor Milestone Task	◆	Progress		

e 1

May '14

01 Jun '14

08 Jun '14

M

T

W

T

F

S

S

M

T

W

T

F

S

S

M

T



Progress

