

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | 2022 | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|-----------------|--------------------|---------------------|------|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|--|--|--|
| | | | | | | dic | tri 1, 2022 | | | tri 2, 2022 | | | tri 3, 2022 | | | | |
| | | | | | | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | | | |
| 0 | | AC. SABANA DE LA MAR, Sector La Aviacion, Prov. Hato Mayor | 609 días | vie 14/1/22 | mié 15/5/24 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | REPLANTEO | 7 días | vie 14/1/22 | lun 24/1/22 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Replanteo | 7 días | vie 14/1/22 | lun 24/1/22 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | CORTE Y EXTRACCION DE ASFALTO | 109 días | mar 25/1/22 | vie 24/6/22 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Corte de Asfalto | 52 días | mar 25/1/22 | mié 6/4/22 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Rotura y Extraccion de Asfalto | 33 días | jue 7/4/22 | lun 23/5/22 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Bote de Materiales Con Camion | 24 días | mar 24/5/22 | vie 24/6/22 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | MOVIMIENTO DE TIERRA | 339 días | lun 27/6/22 | jue 12/10/23 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Excavacion en Roca | 61 días | lun 27/6/22 | lun 19/9/22 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Excavacion Material compactado | 59 días | mar 20/9/22 | vie 9/12/22 | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| Proyecto: AC. SABANA DE LA M Fecha: mié 31/5/23 | Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| | División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| | Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| | Resumen | | Informe de resumen manual | | Progreso | |
| | Resumen del proyecto | | Resumen manual | | Progreso manual | |
| | Tarea inactiva | | solo el comienzo | | | |
| | Hito inactivo | | solo fin | | | |

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | tri 1, 2022 | | | tri 2, 2022 | | | tri 3, 2022 | | |
|----|---------------|--|----------|--------------|--------------|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| | | | | | | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago |
| 10 | | Suministro material de mina | 51 días | lun 12/12/22 | jue 17/8/23 | | | | | | | | | |
| 11 | | Relleno compactado con compactador | 23 días | vie 18/8/23 | mar 19/9/23 | | | | | | | | | |
| 12 | | Suministro y colocacion asiento de arena | 17 días | mié 20/9/23 | jue 12/10/23 | | | | | | | | | |
| 13 | | Bote de material con | 15 días | vie 18/8/23 | jue 7/9/23 | | | | | | | | | |
| 14 | | SUMINISTRO DE TUBERIA | 45 días | vie 13/10/23 | jue 14/12/23 | | | | | | | | | |
| 15 | | De 6 PVCSDR-26 | 15 días | vie 13/10/23 | jue 2/11/23 | | | | | | | | | |
| 16 | | De 4 PVC SDR-26 | 15 días | vie 3/11/23 | jue 23/11/23 | | | | | | | | | |
| 17 | | De 3 PVC SDR-26 | 15 días | vie 24/11/23 | jue 14/12/23 | | | | | | | | | |
| 18 | | COLOCACION DE TUBERIA | 25 días | vie 15/12/23 | jue 18/1/24 | | | | | | | | | |
| 19 | | De 6 PVC SDR-26 | 10 días | vie 15/12/23 | jue 28/12/23 | | | | | | | | | |



| | | | | | | |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| Proyecto: AC. SABANA DE LA M Fecha: mié 31/5/23 | Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| | División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| | Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| | Resumen | | Informe de resumen manual | | Progreso | |
| | Resumen del proyecto | | Resumen manual | | Progreso manual | |
| | Tarea inactiva | | solo el comienzo | | | |
| | Hito inactivo | | solo fin | | | |

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | tri 1, 2022 | | | tri 2, 2022 | | | tri 3, 2022 | | |
|----|---------------|---|----------------|--------------------|--------------------|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| | | | | | | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago |
| 20 | | De 4 PVC SDR-26 | 8 días | vie 29/12/23 | mar 9/1/24 | | | | | | | | | |
| 21 | | De 3 PVCSDR-26 | 7 días | mié 10/1/24 | jue 18/1/24 | | | | | | | | | |
| 22 | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES | 84 días | vie 19/1/24 | mié 15/5/24 | | | | | | | | | |
| 23 | | Tee de 3 x 3 PVC | 9 días | vie 19/1/24 | mié 31/1/24 | | | | | | | | | |
| 24 | | Tee de 4 x 4 PVC | 9 días | jue 1/2/24 | mar 13/2/24 | | | | | | | | | |
| 25 | | Tee de 6 x 3 PVC | 6 días | mié 14/2/24 | mié 21/2/24 | | | | | | | | | |
| 26 | | Tee 6 x 4 PVC | 6 días | jue 22/2/24 | jue 29/2/24 | | | | | | | | | |
| 27 | | Tee 6 x 6 PVC | 4 días | vie 1/3/24 | mié 6/3/24 | | | | | | | | | |
| 28 | | Tee 8 x 6 PVC | 4 días | jue 7/3/24 | mar 12/3/24 | | | | | | | | | |
| 29 | | Codo de 3 x 45 PVC | 4 días | mié 13/3/24 | lun 18/3/24 | | | | | | | | | |
| 30 | | Codo de 4 x 45 PVC | 2 días | mar 19/3/24 | mié 20/3/24 | | | | | | | | | |
| 31 | | Codo 4 x 30 PVC | 2 días | jue 21/3/24 | vie 22/3/24 | | | | | | | | | |
| 32 | | Codo 6 x 20 PVC | 2 días | lun 25/3/24 | mar 26/3/24 | | | | | | | | | |
| 33 | | Cruz de 3 x 3 PVC | 8 días | mié 27/3/24 | vie 5/4/24 | | | | | | | | | |

Proyecto: AC. SABANA DE LA M
 Fecha: mié 31/5/23

| | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Progreso | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | Progreso manual | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | | |
| Hito inactivo | | solo fin | | | |

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | tri 1, 2022 | | | tri 2, 2022 | | | tri 3, 2022 | | | |
|----|---------------|---|----------|-------------------|--------------------|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|
| | | | | | | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep |
| 34 | | Reduccion 4@3 6 días PVC | | lun 8/4/24 | lun 15/4/24 | | | | | | | | | | |
| 35 | | Junta Mecanica 3 días Tipo Dresser 3 | | mar 16/4/24 | jue 18/4/24 | | | | | | | | | | |
| 36 | | Junta Mecanica 3 días Tipo Dresser 4 | | vie 19/4/24 | mar 23/4/24 | | | | | | | | | | |
| 37 | | Junta Mecanica 8 días Tipo Dresser 6 | | mié 24/4/24 | vie 3/5/24 | | | | | | | | | | |
| 38 | | Junta Mecanica 2 días Tipo Dresser 8 | | lun 6/5/24 | mar 7/5/24 | | | | | | | | | | |
| 39 | | Junta Tapon de 3 PVC 1 día | | mié 8/5/24 | mié 8/5/24 | | | | | | | | | | |
| 40 | | tapon de 4 PVC 1 día | | jue 9/5/24 | jue 9/5/24 | | | | | | | | | | |
| 41 | | Tapon de 6 Acero 1 día | | vie 10/5/24 | vie 10/5/24 | | | | | | | | | | |
| 42 | | Anclaje 3 días | | lun 13/5/24 | mié 15/5/24 | | | | | | | | | | |
| 43 | | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS 5 días | | lun 6/5/24 | vie 10/5/24 | | | | | | | | | | |
| 44 | | Valvula de Compuerta 4HF. 2 días | | lun 6/5/24 | mar 7/5/24 | | | | | | | | | | |
| 45 | | Valvula de Compuerta 6 2 días | | mié 8/5/24 | jue 9/5/24 | | | | | | | | | | |
| 46 | | Caja Telescopica 1 día | | vie 10/5/24 | vie 10/5/24 | | | | | | | | | | |

Proyecto: AC. SABANA DE LA M
 Fecha: mié 31/5/23

| | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Progreso | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | Progreso manual | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | | |
| Hito inactivo | | solo fin | | | |

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | tri 1, 2022 | | | tri 2, 2022 | | | tri 3, 2022 | | |
|----|---------------|--------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| | | | | | | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago |
| 47 | | PRUEBA HIDROSTATICA | 6 días | vie 3/2/23 | vie 10/2/23 | | | | | | | | | |
| 48 | | Tuberia 3 PVC | 2 días | vie 3/2/23 | vie 19/1/24 | | | | | | | | | |
| 49 | | Tuberia 4 PVC | 2 días | vie 19/1/24 | lun 22/1/24 | | | | | | | | | |
| 50 | | Tuberia de 6 PV | 2 días | vie 19/1/24 | lun 22/1/24 | | | | | | | | | |
| 51 | | CRUCE DE ALCANTARILLA 6 ACERO | 23 días | mar 30/1/24 | jue 29/2/24 | | | | | | | | | |
| 52 | | Suministro de tuberia 6 Acero | 6 días | jue 1/2/24 | jue 8/2/24 | | | | | | | | | |
| 53 | | Codo 6 x 45 Acero | 2 días | mar 30/1/24 | jue 1/2/24 | | | | | | | | | |
| 54 | | Junta mecanica tipo Dresser 6 | 2 días | jue 1/2/24 | vie 2/2/24 | | | | | | | | | |
| 55 | | Anclaje H.S. | 4 días | lun 5/2/24 | jue 8/2/24 | | | | | | | | | |
| 56 | | Excavacion material no clasificado | 6 días | vie 9/2/24 | vie 16/2/24 | | | | | | | | | |
| 57 | | Relleno compactado | 4 días | lun 19/2/24 | jue 22/2/24 | | | | | | | | | |
| 58 | | Bote de material | 3 días | vie 23/2/24 | mar 27/2/24 | | | | | | | | | |
| 59 | | Mano de obra plomero y soldador | 2 días | mié 28/2/24 | jue 29/2/24 | | | | | | | | | |

Proyecto: AC. SABANA DE LA M
 Fecha: mié 31/5/23

| | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Progreso | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | Progreso manual | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | | |
| Hito inactivo | | solo fin | | | |

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | tri 1, 2022 | | | tri 2, 2022 | | | tri 3, 2022 | | | |
|----|---------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|
| | | | | | | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep |
| 60 | | CRUCE DE ALCANTARILLA 4 ACERO | 50 días | jue 28/7/22 | mié 5/10/22 | | | | | | | | | | |
| 61 | | Suministro de tubería 4 | 9 días | vie 1/3/24 | mié 13/3/24 | | | | | | | | | | |
| 62 | | Codo 4 x 45 Acero | 4 días | vie 1/3/24 | mié 6/3/24 | | | | | | | | | | |
| 63 | | Junta mecanica tipo dresser | 4 días | vie 1/3/24 | mié 6/3/24 | | | | | | | | | | |
| 64 | | Anclajes H.S. | 7 días | vie 1/3/24 | lun 11/3/24 | | | | | | | | | | |
| 65 | | Excavacion material no | 10 días | vie 1/3/24 | jue 14/3/24 | | | | | | | | | | |
| 66 | | Relleno compac | 10 días | vie 1/3/24 | jue 14/3/24 | | | | | | | | | | |
| 67 | | Bote de materia | 4 días | vie 1/3/24 | mié 6/3/24 | | | | | | | | | | |
| 68 | | Mano de obra plmero y | 2 días | vie 1/3/24 | lun 4/3/24 | | | | | | | | | | |
| 69 | | CRUCE CAÑADA 4 ACERO | 42 días | mié 24/8/22 | jue 20/10/22 | | | | | | | | | | |
| 70 | | Suministro de tubería 4 acero | 6 días | jue 6/10/22 | jue 13/10/22 | | | | | | | | | | |
| 71 | | Codo 4 x 45 ace | 4 días | jue 6/10/22 | mar 11/10/22 | | | | | | | | | | |
| 72 | | Junta mecanica tipo Dresser 4 | 4 días | jue 6/10/22 | mar 11/10/22 | | | | | | | | | | |
| 73 | | Anclaje H.S. | 7 días | jue 6/10/22 | vie 14/10/22 | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| Proyecto: AC. SABANA DE LA M Fecha: mié 31/5/23 | Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| | División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| | Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| | Resumen | | Informe de resumen manual | | Progreso | |
| | Resumen del proyecto | | Resumen manual | | Progreso manual | |
| | Tarea inactiva | | solo el comienzo | | | |
| | Hito inactivo | | solo fin | | | |

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | tri 1, 2022 | | | tri 2, 2022 | | | tri 3, 2022 | | | |
|----|---------------|----------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|
| | | | | | | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep |
| 74 | | Relleno compactado a mano | 10 días | jue 6/10/22 | mié 19/10/22 | | | | | | | | | | |
| 75 | | Bote de materia | 6 días | jue 6/10/22 | jue 13/10/22 | | | | | | | | | | |
| 76 | | Alquiler de equi | 3 días | jue 6/10/22 | lun 10/10/22 | | | | | | | | | | |
| 77 | | Mano de Obra | 2 días | jue 6/10/22 | vie 7/10/22 | | | | | | | | | | |
| 78 | | ACOMETIDAS URBANAS | 24 días | vie 15/12/23 | mié 17/1/24 | | | | | | | | | | |
| 79 | | Acometidas urbanas | 24 días | vie 15/12/23 | mié 17/1/24 | | | | | | | | | | |
| 80 | | SEÑALIZACION | 5 días | mar 25/1/22 | lun 31/1/22 | | | | | | | | | | |
| 81 | | Control, Manejo de | 5 días | mar 25/1/22 | lun 31/1/22 | | | | | | | | | | |
| 82 | | PAVIMENTACION EN LA CALLE | 85 días | lun 7/11/22 | vie 3/3/23 | | | | | | | | | | |
| 83 | | Extracion de material | 10 días | jue 18/1/24 | mié 31/1/24 | | | | | | | | | | |
| 84 | | Bote de material | 9 días | jue 18/1/24 | mar 30/1/24 | | | | | | | | | | |
| 85 | | Suministro material base | 10 días | jue 18/1/24 | mié 31/1/24 | | | | | | | | | | |
| 86 | | Relleno compactado | 15 días | jue 18/1/24 | mié 7/2/24 | | | | | | | | | | |
| 87 | | Riego adherent | 7 días | jue 18/1/24 | vie 26/1/24 | | | | | | | | | | |
| 88 | | Imprimacion de arena | 12 días | jue 18/1/24 | vie 2/2/24 | | | | | | | | | | |

Proyecto: AC. SABANA DE LA M
 Fecha: mié 31/5/23


| | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Progreso | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | Progreso manual | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | | |
| Hito inactivo | | solo fin | | | |

| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | 2022 | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|---------------|--------------------|--------------------|------|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|--|--|--|
| | | | | | | dic | tri 1, 2022 | | | tri 2, 2022 | | | tri 3, 2022 | | | | |
| | | | | | | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | | | |
| 89 | | Reposicion de asfalto | 15 días | jue 18/1/24 | mié 7/2/24 | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | Transporte asfalto | 7 días | jue 18/1/24 | vie 26/1/24 | | | | | | | | | | | | |
| 91 | | LIMPIEZA | 2 días | lun 13/5/24 | mar 14/5/24 | | | | | | | | | | | | |
| 92 | | Continua y Final | 2 días | lun 13/5/24 | mar 14/5/24 | | | | | | | | | | | | |
| 93 | | VARIOS | 2 días | mar 25/1/22 | mié 26/1/22 | | | | | | | | | | | | |
| 94 | | Valla anunciando | 2 días | mar 25/1/22 | mié 26/1/22 | | | | | | | | | | | | |
| 95 | | CAMPAMENTO | 2 días | mar 25/1/22 | mié 26/1/22 | | | | | | | | | | | | |
| 96 | | Alquiler de casa, baños portatil y caseta para | 2 días | mar 25/1/22 | mié 26/1/22 | | | | | | | | | | | | |

Proyecto: AC. SABANA DE LA M
 Fecha: mié 31/5/23


| | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Progreso | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | Progreso manual | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | | |
| Hito inactivo | | solo fin | | | |

tri 4, 2022 | oct | nov | dic | tri 1, 2023 | ene | feb | mar | tri 2, 2023 | abr | may | jun | tri 3, 2023 | jul | ago | sep | tri 4, 2023 | oct | nov | dic | tri 1, 2024 | ene | feb | mar | tri 2, 2024 | abr | may | jun | tri 3, 2024 | jul

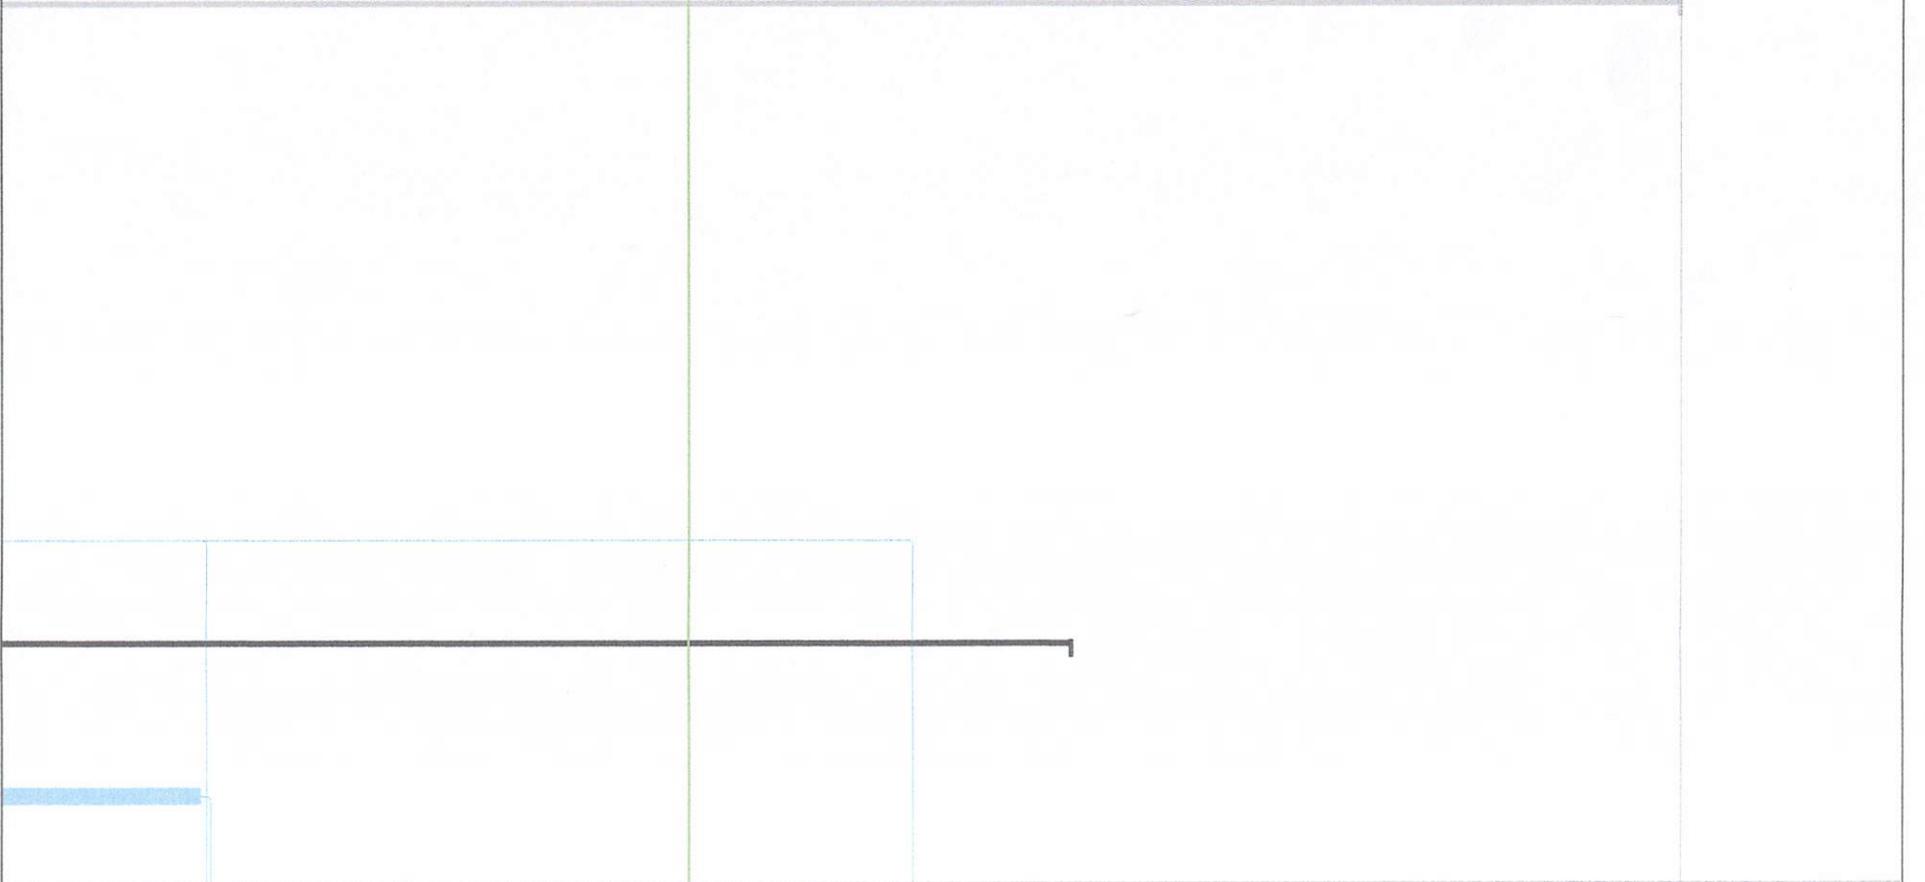

Proyecto: AC. SABANA DE LA M
 Fecha: mié 31/5/23

| | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Progreso | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | Progreso manual | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | | |
| Hito inactivo | | solo fin | | | |

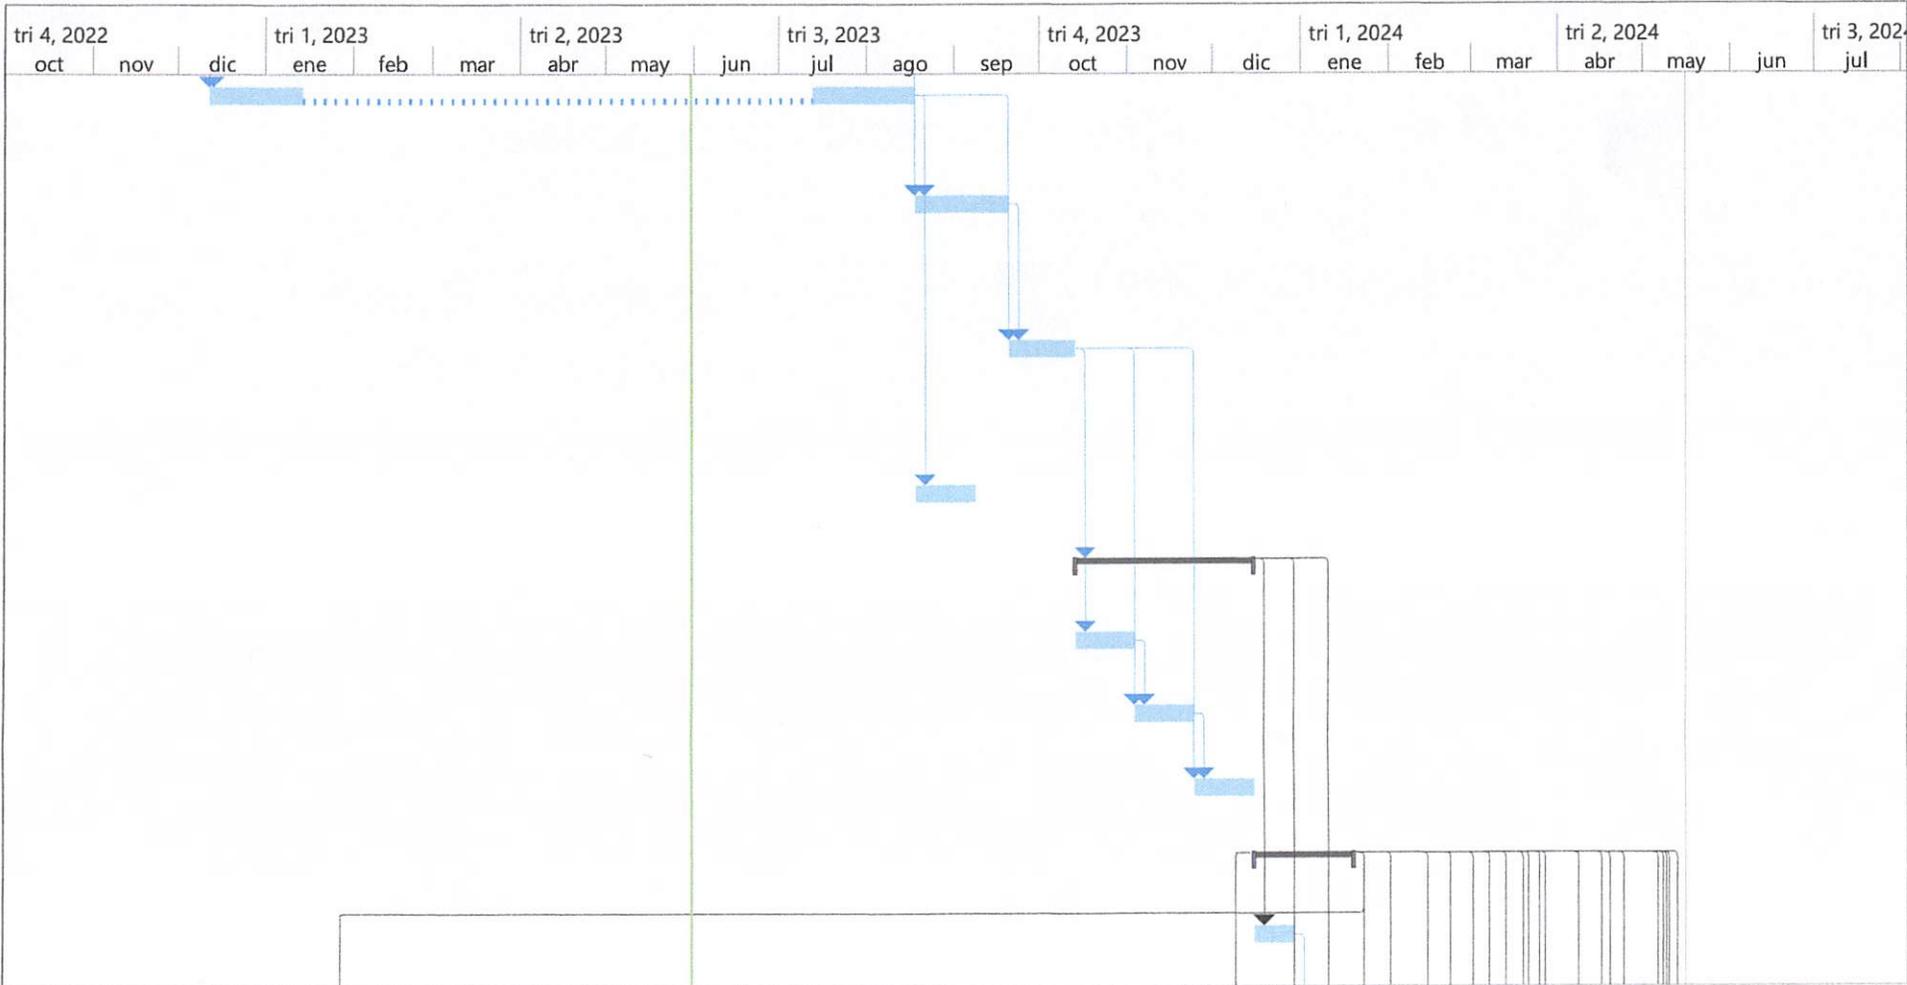


Project: AC. SABANA DE LA M
 Fecha: mié 31/5/23

| | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Progreso | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | Progreso manual | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | | |
| Hito inactivo | | solo fin | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

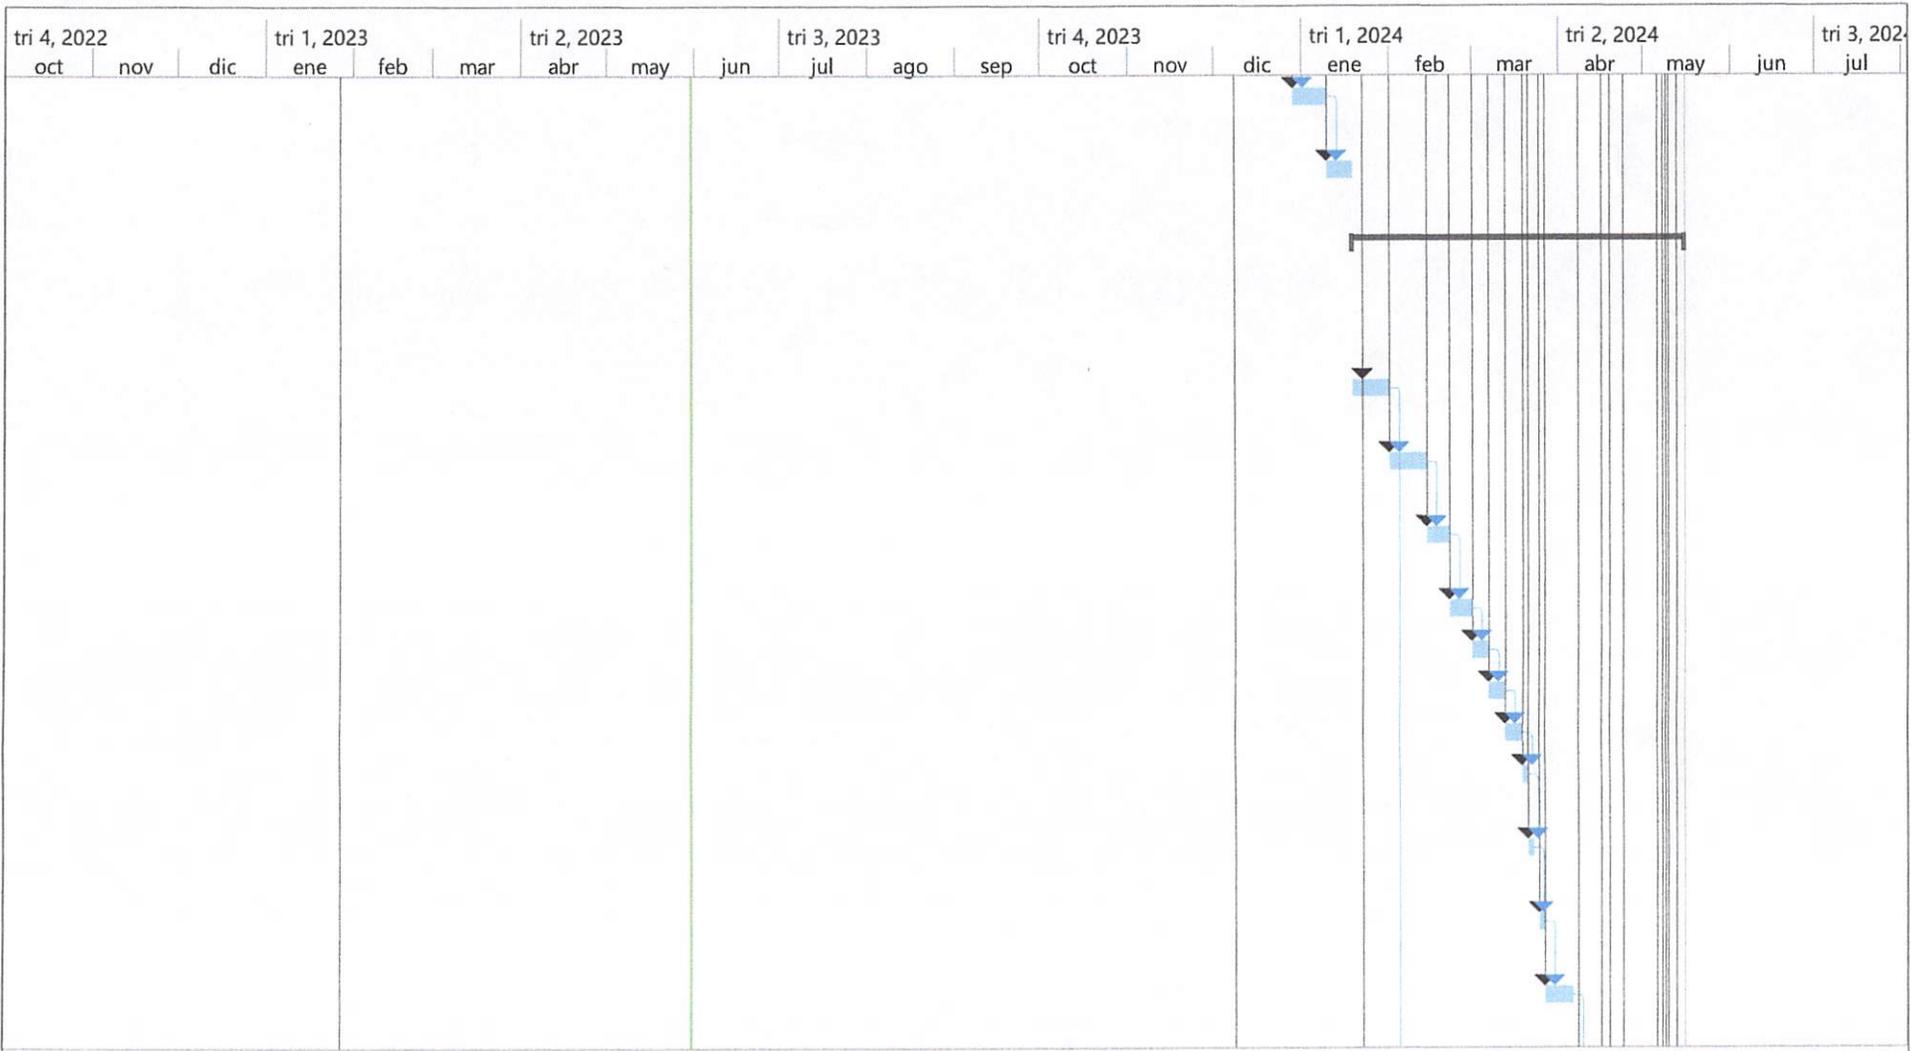

Proyecto: AC. SABANA DE LA M
 Fecha: mié 31/5/23

| | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Progreso | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | Progreso manual | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | | |
| Hito inactivo | | solo fin | | | |




| | | | | | | |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| Proyecto: AC. SABANA DE LA M Fecha: mié 31/5/23 | Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| | División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| | Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| | Resumen | | Informe de resumen manual | | Progreso | |
| | Resumen del proyecto | | Resumen manual | | Progreso manual | |
| | Tarea inactiva | | solo el comienzo | | | |
| | Hito inactivo | | solo fin | | | |



Proyecto: AC. SABANA DE LA M
 Fecha: mié 31/5/23

| | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Progreso | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | Progreso manual | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | | |
| Hito inactivo | | solo fin | | | |

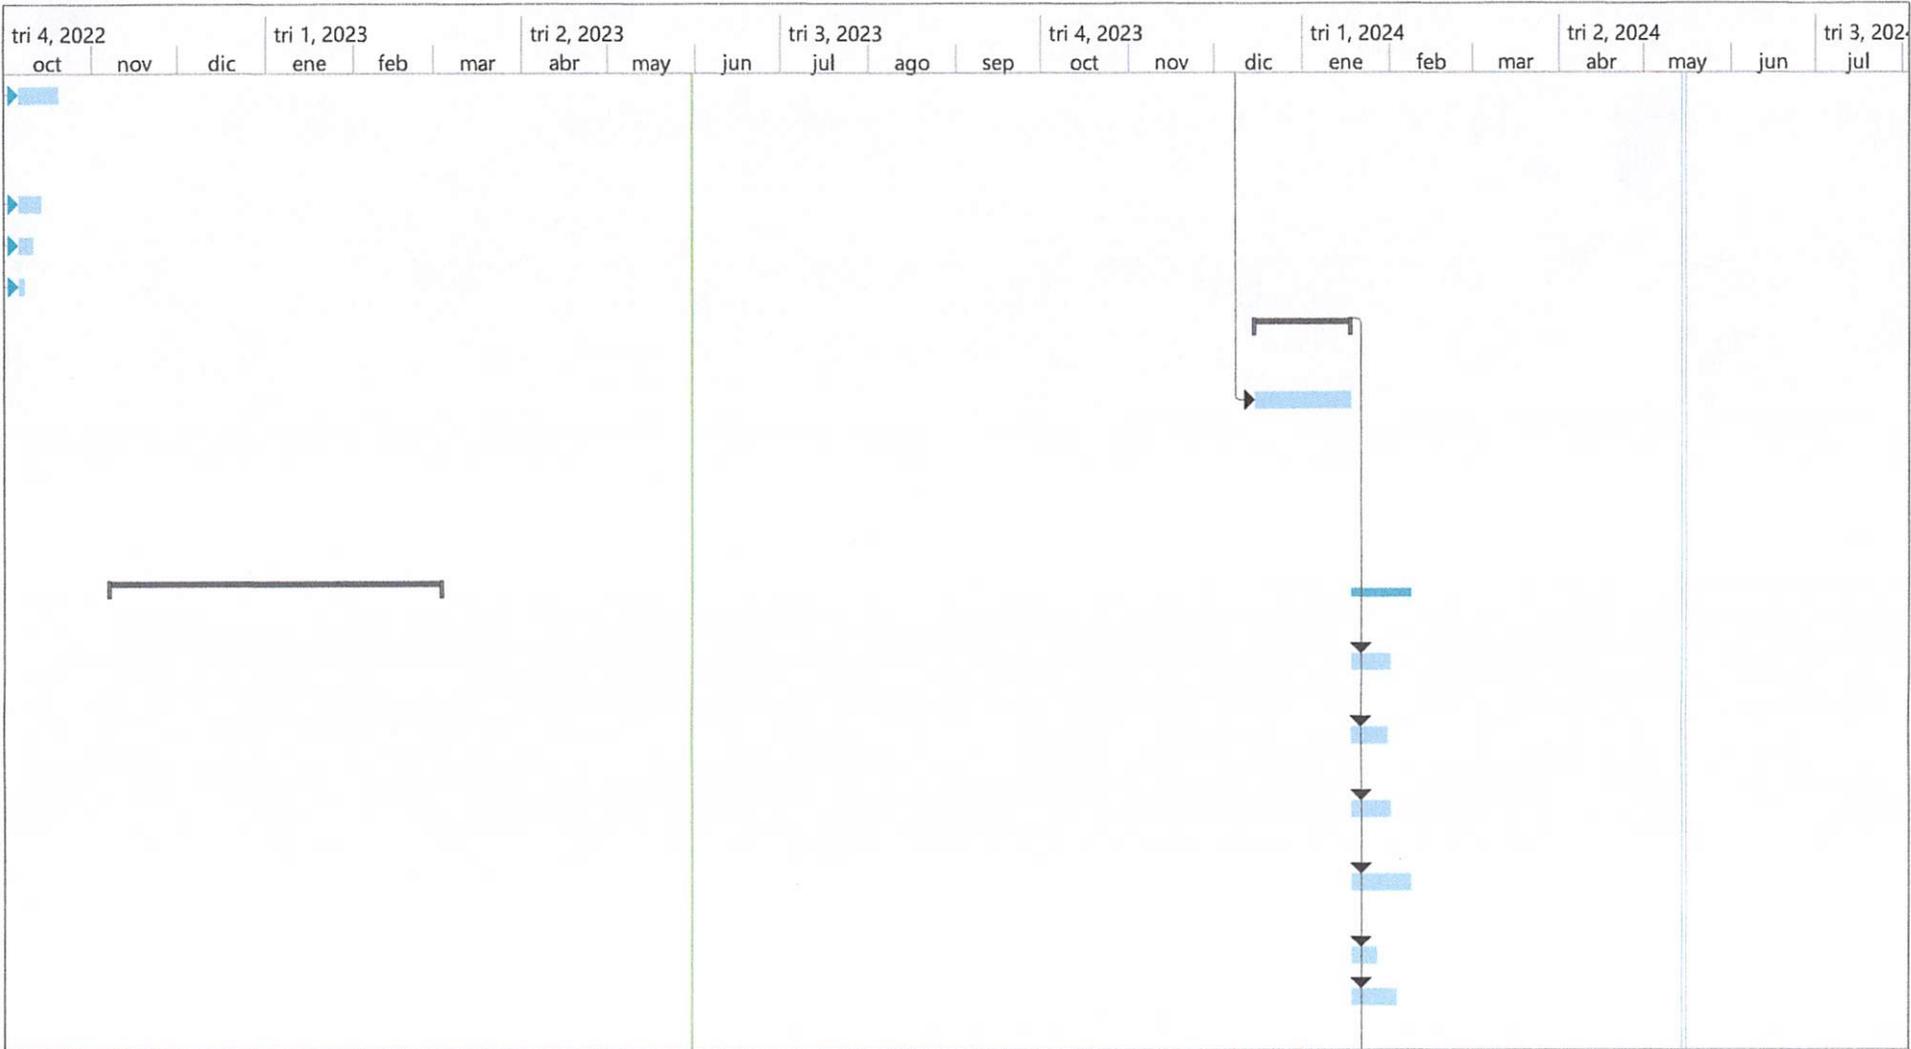


Proyecto: AC. SABANA DE LA M
 Fecha: mié 31/5/23

| | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| Resumen | | Informe de resumen manual | | Progreso | |
| Resumen del proyecto | | Resumen manual | | Progreso manual | |
| Tarea inactiva | | solo el comienzo | | | |
| Hito inactivo | | solo fin | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten initials ERF]

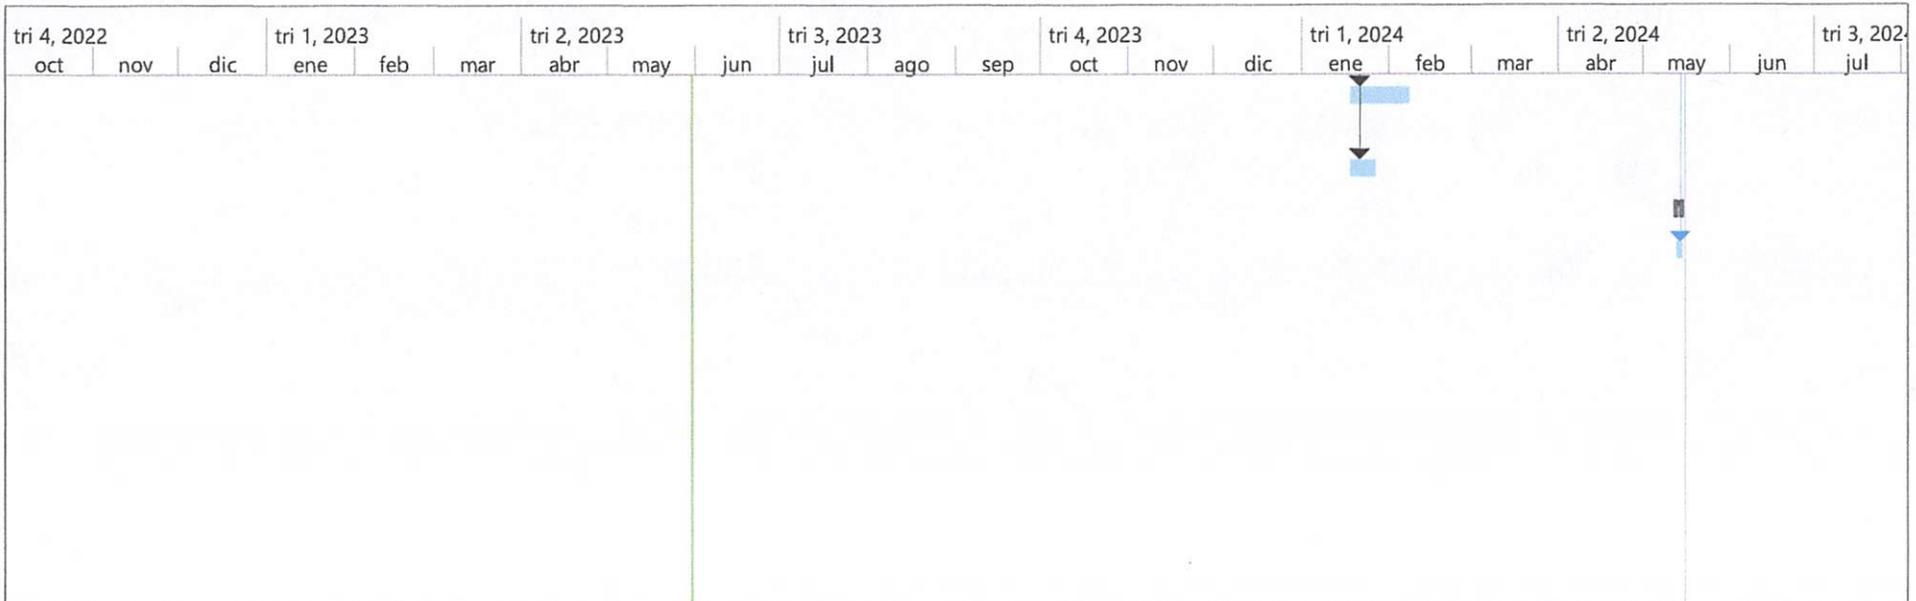

| | | | | | | |
|--|----------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|
| Proyecto: AC. SABANA DE LA M Fecha: mié 31/5/23 | Tarea | | Resumen inactivo | | Tareas externas | |
| | División | | Tarea manual | | Hito externo | |
| | Hito | | solo duración | | Fecha límite | |
| | Resumen | | Informe de resumen manual | | Progreso | |
| | Resumen del proyecto | | Resumen manual | | Progreso manual | |
| | Tarea inactiva | | solo el comienzo | | | |
| | Hito inactivo | | solo fin | | | |
