


Nº	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	PRELIMINARES A	2 días	vie 16/05/14	vie 16/05/14
2	MOVIMIENTO DE TIERRA A	2 días	sáb 17/05/14	lun 19/05/14 1
3	SUMINISTRO DE TUBERÍA A	1 día	mar 20/05/14	mar 20/05/14
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES A	3 días	mié 21/05/14	vie 23/05/14
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS A	1 día	jue 22/05/14	jue 22/05/14
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS A	2 días	jue 22/05/14	vie 23/05/14
7	LIMPIEZA FINAL A	1 día	sáb 24/05/14	sáb 24/05/14 6
8	PRELIMINARES B1	1 día	lun 26/05/14	lun 26/05/14 7
9	MOVIMIENTO DE TIERRA B1	2 días	mar 27/05/14	mié 28/05/14 8
10	HORMIGÓN ARMADO EN FC =240 K0C02 B1	3 días	jue 29/05/14	sáb 31/05/14 9
11	TERMINACION DE SUPERFICIE B1	4 días	vie 30/05/14	mar 03/06/14
12	PRELIMINARES B2	1 día	mié 04/06/14	mié 04/06/14
13	VIGA PERIMETRAL (0.20 X 0.20) 5.25 O0M3 B2	2 días	mar 27/05/14	mié 28/05/14
14	LOSA DE TECHO 0.13 - 1.04 O0M3 B2	2 días	jue 29/05/14	vie 30/05/14 13
15	MUROS DE BLOQUES DE 6" B2	1 día	sáb 31/05/14	sáb 31/05/14 14
16	TERMINACION DE SUPERFICIE B2	3 días	lun 02/06/14	mié 04/06/14 15
17	PINTURA B2	2 días	jue 05/06/14	vie 06/06/14 16
18	ACERA 0.60 M B2	1 día	sáb 07/06/14	sáb 07/06/14 2
19	PUERTAS Y VENTANAS B2	1 día	sáb 07/06/14	sáb 07/06/14
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE METALES B2	3 días	lun 09/06/14	mié 11/06/14 19
21	LIMPIEZA FINAL B2	2 días	jue 12/06/14	vie 12/06/14 20
22	ELECTRIFICACION SECUNDARIA C	5 días	sáb 14/06/14	jue 19/06/14 21
23	INSTALACION EQUIPOS DE BOMBEO C	5 días	vie 20/06/14	jue 26/06/14 22
24	PRELIMINARES D	1 día	jue 15/05/14	jue 15/05/14
25	MOVIMIENTO DE TIERRA D	15 días	vie 16/05/14	vie 13/06/14 24
26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA D	22 días	sáb 14/05/14	jue 10/07/14 25
27	SUMINISTRO Y COLOCACION PIEZAS ESPECIALES D	22 días	sáb 14/05/14	jue 10/07/14
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS D	22 días	sáb 14/05/14	jue 10/07/14
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS D	22 días	sáb 14/05/14	jue 10/07/14
30	CAÑADA EN 8 ACERO L= 6.00 M (3 00 U) D	4 días	vie 11/07/14	mié 10/07/14 29
31	PAVIMENTACION L= 1.500 M D	6 días	sáb 09/06/14	vie 15/06/14 30
32	MOVIMIENTO DE TIERRA PAVIMENTACION D	5 días	sáb 16/06/14	jue 21/06/14 31
33	REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO E	2 días	vie 22/06/14	lun 25/06/14 32
34	MOVIMIENTO DE TIERRA E	2 días	mar 26/06/14	mié 27/06/14 33
35	HORMIGÓN ARMADO EN FC=240K0C02 (INDUSTRIAL) E	10 días	jue 28/06/14	mar 09/07/14 34
36	TERMINACION SUPERFICIE E	5 días	mié 10/07/14	mar 16/07/14 35
37	IMPERMEABILIZANTE SX-PEL E	2 días	mié 17/06/14	jue 18/06/14 36
38	ADITIVO E	2 días	jue 18/06/14	vie 19/06/14
39	JUNTA WATER STOP 9" E	2 días	jue 18/06/14	vie 19/06/14
40	INSTALACION DE ENTRADA, SALIDA, REBOSE, DESAGUE Y BY PASS (INC. INTERCONEXION PLANTA - TANQUE) E	4 días	sáb 20/06/14	mié 24/06/14 38
41	MISCELANEOS E	4 días	mié 24/06/14	sáb 27/06/14
42	VERJA PERIMETRAL E	3 días	mié 24/06/14	vie 26/06/14
43	EMBELLECIMIENTO CON GRAVILLA E	2 días	mié 24/06/14	jue 25/06/14
44	LOGO Y LETRERO DE NAPA E	1 día	mié 24/06/14	mié 24/06/14
45	ORNAMENTACION E	3 días	mié 24/06/14	vie 26/06/14
46	ASFALTADO EN VIAS INTERIORES E	2 días	vie 26/06/14	sáb 27/06/14 43
47	LIMPIEZA FINAL E	1 día	lun 29/06/14	lun 29/06/14 46
48	REPLANTEO LINEA MATRIZ F	1 día	vie 11/07/14	vie 11/07/14 28
49	MOVIMIENTO DE TIERRA	26 días	lun 14/07/14	vie 15/08/14 48
50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA F	11 días	vie 05/06/14	vie 19/06/14
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES	10 días	mié 10/06/14	lun 22/06/14
52	SUMINISTRO Y COLOCACION JUNTA DRESSER	10 días	mié 10/06/14	lun 22/06/14
53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS	10 días	jue 11/06/14	mar 23/06/14
54	CAÑADA EN 8" ACERO L= 28.00 M F	3 días	mié 24/06/14	vie 26/06/14 53
55	PAVIMENTACION L= 700 M F	2 días	sáb 27/06/14	lun 29/06/14 54
56	MOVIMIENTO DE TIERRA PAVIMENTACION F	3 días	mar 30/06/14	jue 02/07/14 55
57	EMPALME A RED EXISTENTE F	2 días	vie 02/07/14	lun 06/07/14 56
58	LIMPIEZA FINAL	2 días	mar 07/07/14	mié 09/07/14 57
59	REPLANTEO LINEA DE CONDUCCION A PARTE ALTA G	1 día	sáb 16/06/14	sáb 16/06/14 49
60	MOVIMIENTO DE TIERRA G	2 días	lun 16/06/14	mar 19/06/14 59
61	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA G	2 días	mié 20/06/14	jue 21/06/14 60
62	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES G	2 días	jue 11/06/14	vie 12/06/14
63	SUMINISTRO Y COLOCACION JUNTA DRESSER G	2 días	jue 11/06/14	vie 12/06/14
64	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS G	2 días	jue 11/06/14	vie 12/06/14
65	PAVIMENTACION L= 830 M G	3 días	lun 15/06/14	mié 17/06/14 64
66	PRELIMINARES H	1 día	jue 15/05/14	jue 15/05/14
67	MOVIMIENTO DE TIERRA H	2 días	vie 16/05/14	sáb 17/05/14 66
68	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA H	3 días	lun 19/05/14	mié 21/05/14 67
69	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES H	3 días	jue 22/05/14	sáb 24/05/14 68
70	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS H	3 días	jue 22/05/14	sáb 24/05/14
71	LIMPIEZA FINAL H	7 días	jue 25/06/14	jue 02/07/14 70
72	LETRERO Z	1 día	jue 15/05/14	jue 15/05/14
73	CAMPAMENTO Z	3 días	vie 16/05/14	lun 19/05/14

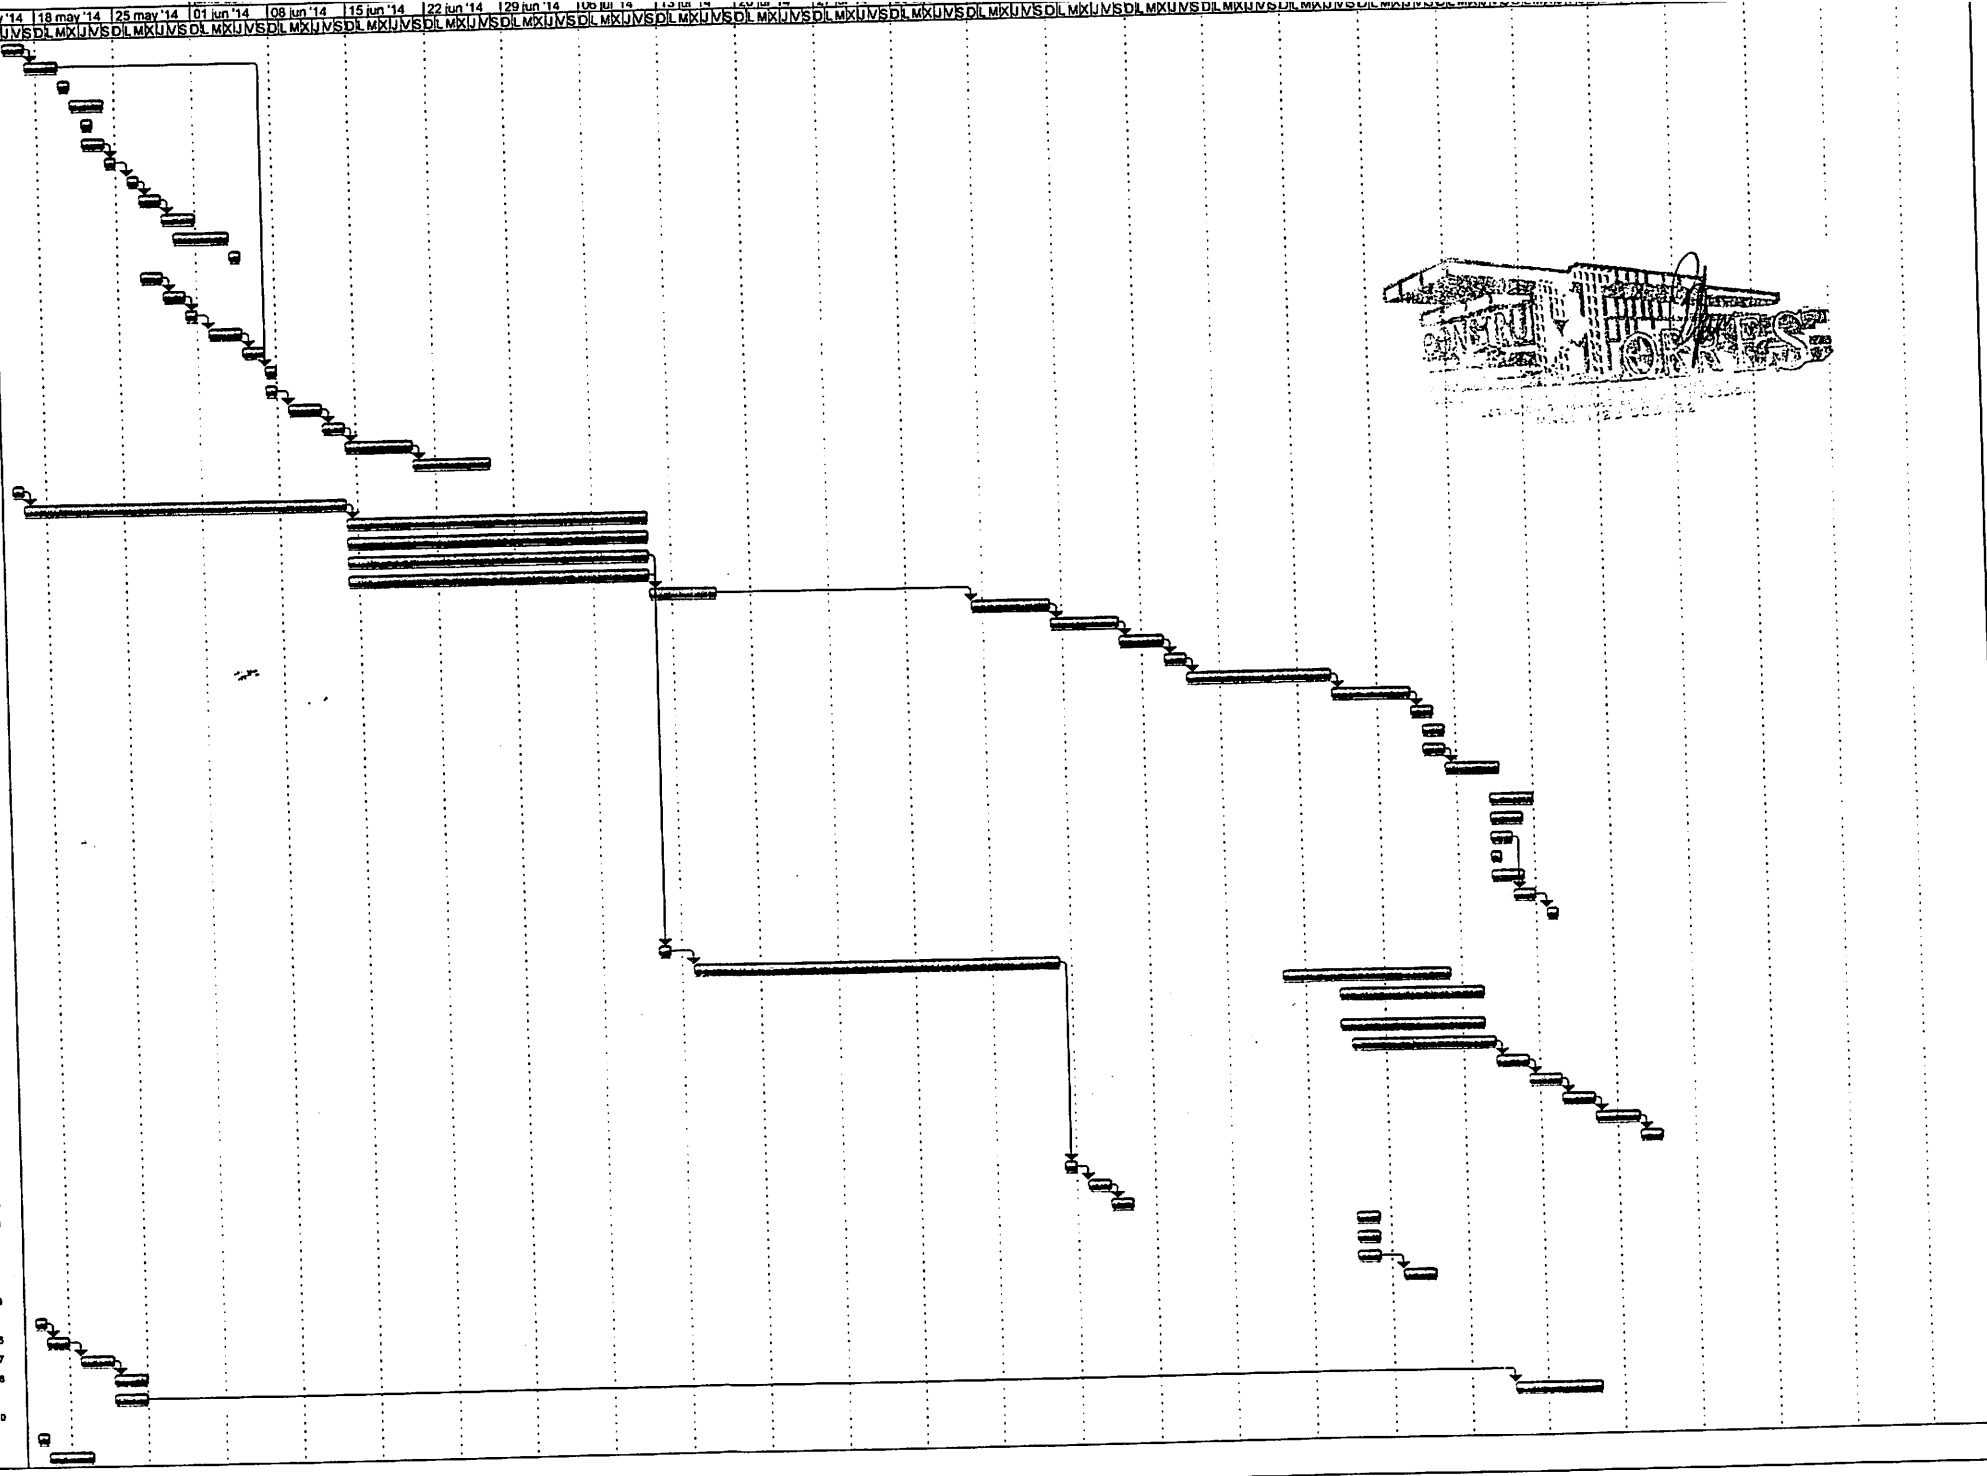

Proyecto: **Proyact1-QUITA CORAZA**
 Fecha: vie 25/04/14

Tarea: **Progreso**
 División: **Hito**

Resumen: **Resumen del proyecto**
 Tareas externas: **Hito externo**
 Fecha limite: **Fecha limite**
