


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Gantt Chart											
						2021	T4	T1	T2	T3	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023
1		LINEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCION, ACUEDUCTO MULTIPLE LAS TEJAS	523 días	lun 1/18/21	mié 1/18/23	[Gantt bar for task 1]											
2		INICIO	0 días	lun 1/18/21	lun 1/18/21	[Gantt bar for task 2]											
3		VALLA ANUNCIANDO OBRA	1 día	lun 1/18/21	lun 1/18/21	[Gantt bar for task 3]											
4		CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O SOLAR CON CASETA DE MATERIALES CON (U) BAÑO MOVIL)	522 días	mar 1/19/21	mié 1/18/23	[Gantt bar for task 4]											
5		RED DE DISTRIBUCION	522 días	mar 1/19/21	mié 1/18/23	[Gantt bar for task 5]											
6		REPLANTEO	20 días	mar 2/2/21	lun 3/1/21	[Gantt bar for task 6]											
7		CORTE, REMOCION Y BOTE DE ASFALTO (L=3,554.67M)	20 días	mar 3/2/21	lun 3/29/21	[Gantt bar for task 7]											
8		MOVIMIENTO DE TIERRA	190 días	mar 3/30/21	mar 10/18/22	[Gantt bar for task 8]											
9		SUMINISTRO DE TUBERIA	75 días	mar 1/19/21	lun 5/3/21	[Gantt bar for task 9]											
10		COLOCACION DE TUBERIA	80 días	mar 5/4/21	jue 5/12/22	[Gantt bar for task 10]											
11		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES	15 días	vie 5/13/22	jue 6/2/22	[Gantt bar for task 11]											
12		ANCLAJE	15 días	vie 6/3/22	jue 6/23/22	[Gantt bar for task 12]											
13		SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y VALVULA	25 días	vie 6/24/22	jue 7/28/22	[Gantt bar for task 13]											
14		CRUCES	30 días	vie 7/29/22	jue 9/8/22	[Gantt bar for task 14]											
15		CRUCE POR DENTRO DE ALCANTARILLA EXISTENTE EN TUBERIA DE Ø4" ACERO L=10.00 M (INCLUYE 2.00 M DE LADOS) (1UD)	10 días	vie 7/29/22	jue 8/11/22	[Gantt bar for task 15]											
16		CRUCE POR DENTRO DE CAÑADA EXISTENTE EN TUBERIA DE Ø3" ACERO L=10.00 M (INCLUYE 2.00 M DE LADOS) (1UD)	10 días	vie 8/12/22	jue 8/25/22	[Gantt bar for task 16]											
17		CRUCE POR DENTRO DE CAÑADA EXISTENTE EN TUBERIA DE Ø4" ACERO L=6.00 M (INCLUYE 2.00 M DE LADOS) (1UD)	10 días	vie 8/26/22	jue 9/8/22	[Gantt bar for task 17]											
18		ACOMETIDAS RURALES CON POLIETILENO (170 U)	85 días	vie 9/9/22	jue 1/5/23	[Gantt bar for task 18]											
19		REPOSICION CARPETA ASFALTICA (L=1,424.86M)	15 días	vie 6/24/22	jue 7/14/22	[Gantt bar for task 19]											
20		HIDRANTE EN TUBERIA Ø3"	5 días	vie 7/15/22	jue 7/21/22	[Gantt bar for task 20]											
21		PRUEBA HIDROSTATICA EN TUBERIA Ø3"	6 días	vie 7/22/22	vie 7/29/22	[Gantt bar for task 21]											
22		SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	522 días	mar 1/19/21	mié 1/18/23	[Gantt bar for task 22]											
23		LIMPIEZA CONTINUA	522 días	mar 1/19/21	mié 1/18/23	[Gantt bar for task 23]											
24		REPARACION DE SERVICIOS EXISTENTES	30 días	vie 1/29/21	jue 3/11/21	[Gantt bar for task 24]											
25		FIN	0 días	mié 1/18/23	mié 1/18/23	[Gantt bar for task 25]											

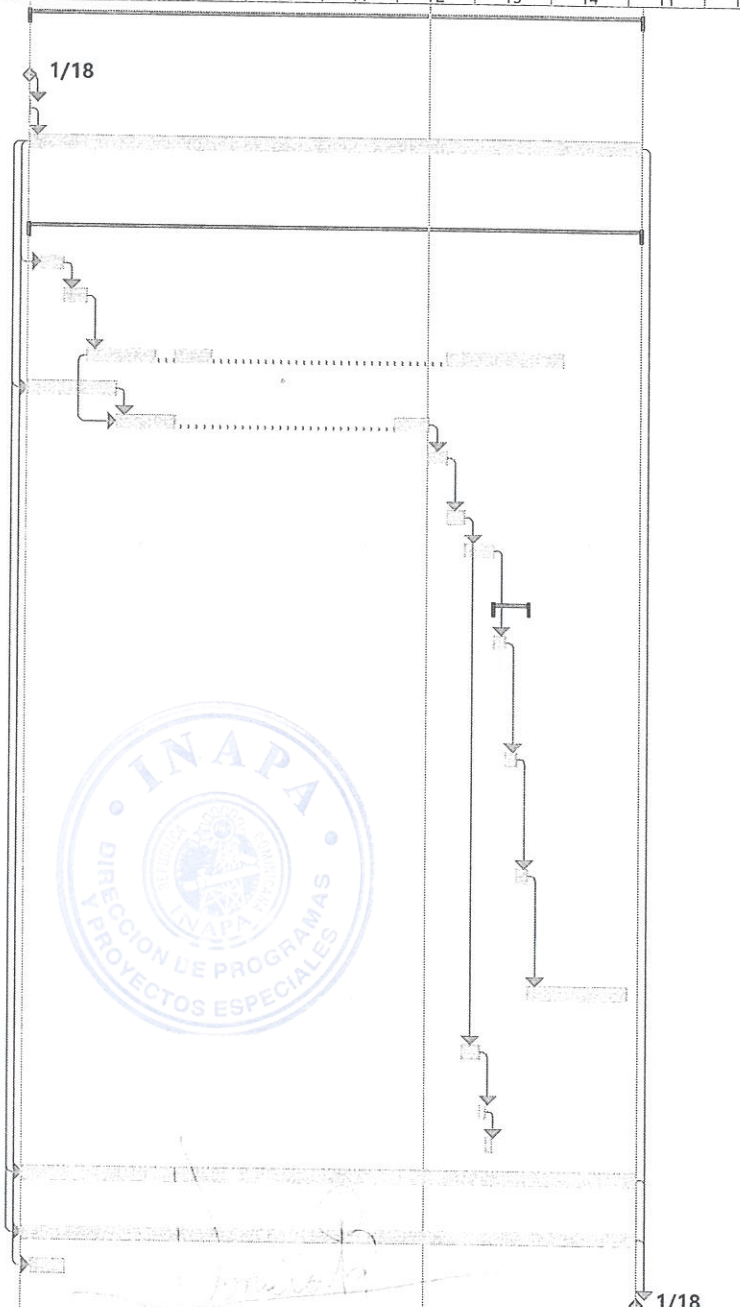

Ing. Luis Antonio Zorrilla Bovadilla
