


| Id | Modo de                                                                             | Nombre de tarea                                                                                                                                                     | Duración | Comienzo     | Fin          | Predecesoras | 17/24 | abr '24 | may '24 | jun '24 | jul '24 | ago '24 | sep '24 | oct '24 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  |    | AMPLIACION ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS                                                                                                                           | 118 días | lun 01/04/24 | lun 16/09/24 |              |       |         |         |         |         |         |         |         |
| 2  |    | INICIO                                                                                                                                                              | 0 días   | lun 01/04/24 | lun 01/04/24 |              |       |         |         |         |         |         |         |         |
| 3  |    | ESTUDIOS GEOTÉCNICOS                                                                                                                                                | 50 días  | lun 01/04/24 | mar 11/06/24 | 2            |       |         |         |         |         |         |         |         |
| 4  |    | Estudios Geotécnicos a realizar a Dique Caucasiano (1ud) , Estaciones de Bombeo (Cárcamo , (1ud) y Planta Potabilizadora cap. 500 Lps, depósitos reguladores (2 ud) | 50 días  | lun 01/04/24 | mar 11/06/24 | 2            |       |         |         |         |         |         |         |         |
| 5  |    | ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIALES                                                                                                                                | 50 días  | lun 01/04/24 | mar 11/06/24 | 2            |       |         |         |         |         |         |         |         |
| 6  |    | Elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental a partir de los Tdr entregados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales                          | 50 días  | lun 01/04/24 | mar 11/06/24 | 2            |       |         |         |         |         |         |         |         |
| 7  |    | LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS                                                                                                                                         | 38 días  | mié 12/06/24 | vie 02/08/24 | 3;4;5;6      |       |         |         |         |         |         |         |         |
| 8  |    | Obra de Toma (Dique Caucasiano) ( Fotogrametría con sistema lidar y drones)                                                                                         | 4 días   | mié 12/06/24 | lun 17/06/24 | 2            |       |         |         |         |         |         |         |         |
| 9  |    | Zona Planta Potabilizadora                                                                                                                                          | 4 días   | mar 18/06/24 | vie 21/06/24 | 8            |       |         |         |         |         |         |         |         |
| 10 |    | Zona Estación de bombeo                                                                                                                                             | 2 días   | mar 18/06/24 | mié 19/06/24 | 8            |       |         |         |         |         |         |         |         |
| 11 |    | Líneas impulsión                                                                                                                                                    | 10 días  | lun 24/06/24 | vie 05/07/24 | 9;10         |       |         |         |         |         |         |         |         |
| 12 |    | Zona de depósitos reguladores                                                                                                                                       | 10 días  | lun 08/07/24 | vie 19/07/24 | 11           |       |         |         |         |         |         |         |         |
| 13 |    | Lineas matriz y conducción                                                                                                                                          | 10 días  | lun 22/07/24 | vie 02/08/24 | 12           |       |         |         |         |         |         |         |         |
| 14 |    | ESTUDIOS HIDROLÓGICOS                                                                                                                                               | 25 días  | mar 18/06/24 | lun 22/07/24 | 8            |       |         |         |         |         |         |         |         |
| 15 |    | Descripción de la geología de la zona                                                                                                                               | 25 días  | mar 18/06/24 | lun 22/07/24 | 2            |       |         |         |         |         |         |         |         |
| 16 |    | DISEÑO                                                                                                                                                              | 30 días  | lun 05/08/24 | lun 16/09/24 | 15;13;14     |       |         |         |         |         |         |         |         |
| 17 |    | Obra de Toma (Dique Caucasiano)                                                                                                                                     | 20 días  | lun 05/08/24 | lun 02/09/24 | 15;3;6;8     |       |         |         |         |         |         |         |         |
| 18 |   | Estación de Bombeo ( Cárcamo y Caseta)                                                                                                                              | 15 días  | lun 05/08/24 | lun 26/08/24 | 15;4;6;9     |       |         |         |         |         |         |         |         |
| 19 |  | Planta Potabilizadora con Alta Tecnología (por medio de flotació                                                                                                    | 30 días  | lun 05/08/24 | lun 16/09/24 | 15;13;14     |       |         |         |         |         |         |         |         |
| 20 |  | Línea de Impulsión                                                                                                                                                  | 10 días  | lun 05/08/24 | lun 19/08/24 | 4;11         |       |         |         |         |         |         |         |         |
| 21 |  | Depositos Reguladores                                                                                                                                               | 30 días  | lun 05/08/24 | lun 16/09/24 | 4;6;12;15    |       |         |         |         |         |         |         |         |
| 22 |  | Lineas de conduccion                                                                                                                                                | 10 días  | lun 05/08/24 | lun 19/08/24 | 4;13         |       |         |         |         |         |         |         |         |
| 23 |  | FIN DEL PROYECTO                                                                                                                                                    | 0 días   | lun 16/09/24 | lun 16/09/24 | 3;5;7;14;16  |       |         |         |         |         |         |         |         |

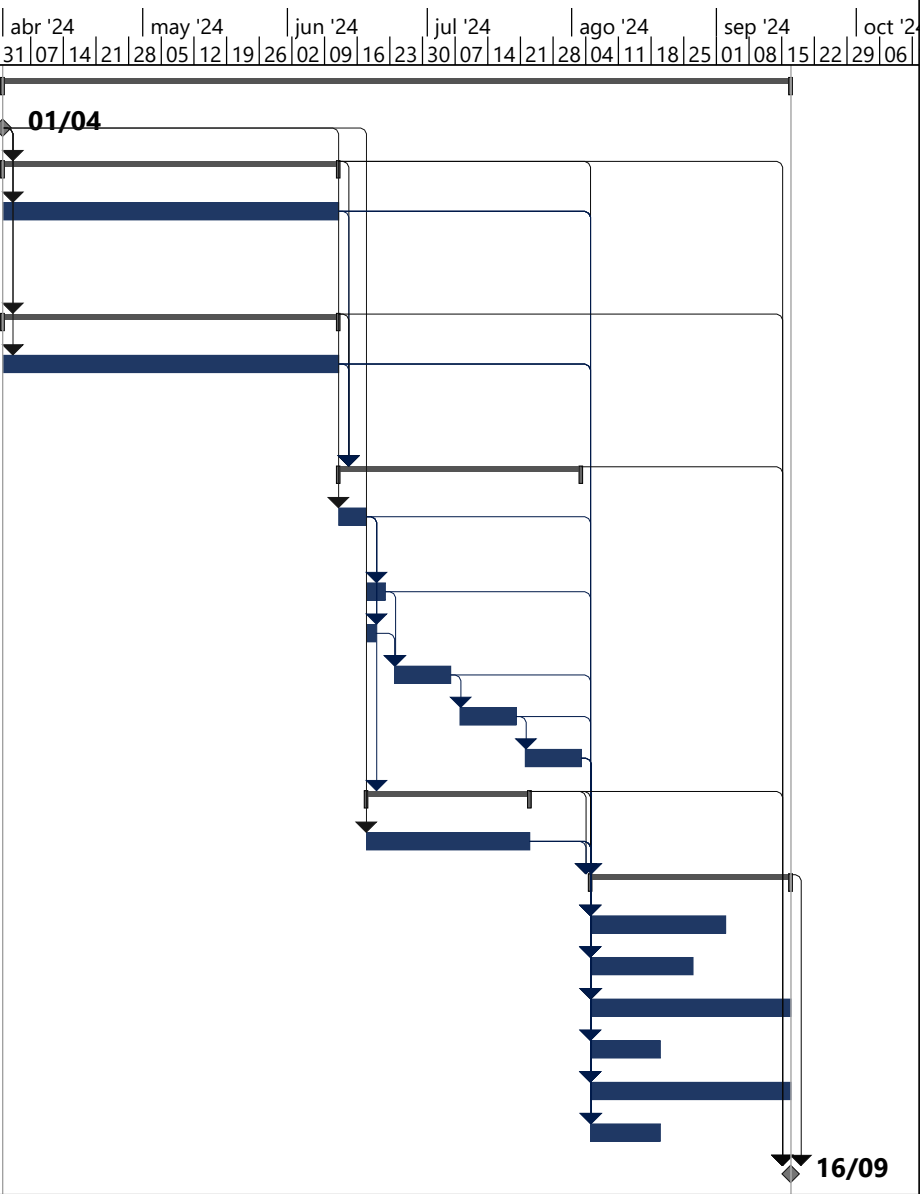

Proyecto: Programacion Const.  
Fecha: mar 05/03/24

Tarea

División

Hito

Resumen

◆

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

◆

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

◆

Tarea manual

solo el comienzo

Tareas externas

Hito externo

◆

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

PROGRAMACION PROYECTO AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS

Página 1
