

INAPA | INSTITUTO NACIONAL
DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS

INFORME SEGUIMIENTO SEGUNDO
TRIMESTRE 2024

**PROGRAMA SANEAMIENTO UNIVERSAL CIUDADES
TURÍSTICAS Y COSTERAS**

No. 5630/OC-DR y 5638/KI-DR

Periodo: Abril a junio de 2024.



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS ESPECIALES
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA

ÍNDICE

I.- Descripción y Contexto del Programa.	3
II.- Resumen de las actividades, gestión Financiera y Administrativa.	4
ANEXO I: Procesos de Adquisiciones y Seguimiento.	9
ANEXO II: Fotos de Actividad.....	10

I.- Descripción y Contexto del Programa.

El “*Programa de Saneamiento Universal de Ciudades Turísticas y Costeras*” de la República Dominicana firmado entre el Gobierno dominicano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el financiamiento de recursos económicos del BID, de la Facilidad de Corea para el Cofinanciamiento del Desarrollo de la Infraestructura de América Latina y el Caribe (KIF) y posteriormente se adicionará un aporte de contrapartida del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE). Este Contrato fue firmado el 23 de diciembre de 2022 y aprobado por el Congreso Nacional mediante la Resolución Núm 50-23 de fecha 02 de agosto de 2023. El Programa está estructurado en dos (2) componentes:

Componente I. Expansión y optimización de la infraestructura de saneamiento y **Componente II.** Fortalecimiento Institucional y Mejoras de Eficiencia en el Sector.

También incluye el financiamiento para el desarrollo de la gestión administrativa, auditoría, monitoreo y evaluación del Programa.

El Acuerdo para la Gestión del Programa entre INAPA y CORAABO fue firmado el 12 de septiembre de 2023 y el Acuerdo Subsidiario entre el Ministerio de Hacienda y el INAPA fue firmado en fecha 07 de diciembre de 2023.

El BID emite la No Objeción al Reglamento Operativo del Programa en fecha 24 de noviembre de 2023.

El Taller de Arranque del Programa fue realizado el 16 de febrero de 2024, y el primer desembolso del Programa se ejecuta en abril de 2024.

La Unidad Ejecutora del Programa tiene conformado un equipo contratado y del INAPA que realiza las funciones de ejecución del Programa, entre ellos: i) Coordinador del Programa, ii) Encargado de Planificación del Programa, iii) Especialista Financiera y personal adicional de la Dirección de Programas y Programas Especiales (DPPE).

En el Programa se reciben trimestralmente las Misiones de Supervisión y Evaluación y se realizan las revisiones de carteras entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), INAPA, MEPyD, Ministerio de Hacienda con los objetivos específicos de: (i) revisar los aspectos fiduciarios y técnicos, y los instrumentos de planificación e implementación con la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), INAPA y las contrapartes de CORAABO, (ii) revisar los aspectos ambientales y sociales del Programa y (iii) se realizan visita técnica a Boca Chica.

El cierre del Programa está indicado en los documentos del Convenio para la fecha del 19 de agosto de 2028 por tanto el tiempo restante es de 50 meses.

La ejecución financiera de los Programas se realiza mediante el módulo de Unidades Ejecutoras de Programas con Recursos Externos (UEPEX). En esta herramienta todas las operaciones están asociada a los Módulos de Tesorería y Contabilidad Nacional. La implantación del SIGEF es obligatoria para todas las instituciones del gobierno central y las instituciones descentralizadas autónomas que manejan recursos públicos, según el Artículo núm. 3 del Decreto Núm 9-04, de fecha 06 de enero de 2004, que crea el SIGEF.

El control interno de las operaciones es realizado por dos (2) unidades ubicadas en el INAPA, una es el área de Revisión y Control del INAPA y la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Contraloría General de la República Dominicana (CGR) con la responsabilidad de asegurar la gestión de los aspectos financieros y de adquisiciones del Programa.

Asimismo, los pagos son revisados y autorizados por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) que es una dependencia subordinada, normativa, administrativa y financiera de la CGR. bajo el ámbito de la Ley 10-07 y su reglamento de aplicación No. 491-07, a los fines de evidenciar el cumplimiento de los controles previos y la revisión documental del expediente de pago, y los contratos son registrados en el Sistema de Tramite Estructurado (TRE) de la Contraloría General de la República Dominicana (CGR).

Las conciliaciones de cuentas del Programa se realizan mensualmente y los Estados Financieros se elaboran en periodo semestrales, las cuentas e inversiones del Programa son auditadas por una Firma Auditora Externa anualmente conforme lo indica el documento del Convenio de Préstamo.

Actualmente la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) elabora la versión final del Convenio que complementa este Programa con el Ministerio de Hacienda para su aprobación, el documento de borrador inicial fue compartido al INAPA en diciembre de 2023.

Este informe resumen los avances de las actividades, indicadores, gestión ambiental y social, y la gestión financiera del Programa para el trimestre abril a junio de 2024.

II.- Resumen de las actividades, gestión Financiera y Administrativa.

2.1 Gestión Administrativa y Financiera del Programa.

Los Datos Generales del Programa se distribuyen en:

- ✓ **Monto Actual total Aprobado del Programa:** USD 140,000,000.0
- ✓ **Monto Desembolsado a junio, 2024:** USD 156,825.00
- ✓ **Monto Comprometido:** USD 167,520.71
- ✓ **Monto Pagado a junio 2024:** USD 36,277.61
- ✓ **Avance Desembolsados:** 0.11% con relación al monto total del Programa

El presupuesto del Programa y los avances de la Ejecución a la fecha por componente se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 1: Presupuesto y avances de la ejecución a junio de 2024.

Componentes	Valores en USD				% Ejecución acumulada
	Presupuesto Actual	Monto Comprometido/ Contratado	Ejecutado acumulado	Por ejecutar	
Componente 1 -Expansión y optimización de la infraestructura de saneamiento	119,000,000	-	-	119,000,000	0.00%
Componente 2 - Fortalecimiento Institucional y mejora de eficiencia en el sector	15,500,000	-	-	15,500,000	0.00%

Componentes	Valores en USD				% Ejecución acumulada
	Presupuesto Actual	Monto Comprometido/Contratado	Ejecutado acumulado	Por ejecutar	
Administración u otros gastos contingentes	5,000,000	167,521	36,278	4,963,722	0.73%
Auditoría, monitoreo y evaluación	500,000	-	-	500,000	0.00%
TOTAL	140,000,000	167,521	36,278	139,963,722	0.03%

Los componentes 1 y 2, no presentan ejecución financiera, mientras que los gastos de Administración, presenta un movimiento de USD 36,278, lo que representa un 0.73% del monto asignado al mismo. La ejecución acumulada del Programa respecto al monto total corresponde a un 0.03%.

Del total ejecutado corresponde al presente trimestre la suma de USD 36,278, para un porcentaje de avance del 2do trimestre 2024 de 23% con relación al monto desembolsado al Programa.


El detalle por semestre de los ingresos y egresos del Programa a junio 2024, se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro no. 2: Ingresos y egresos del Programa por semestre en USD.

Semestre	Ingresos Acumulado al periodo (USD) (a)	Egresos acumulados (USD) (b)	Por ejecutar (USD) (a-b)
Enero a junio, 2024	156,825	36,278	120,547

Programación de Desembolsos para el Programa:

En millones US\$

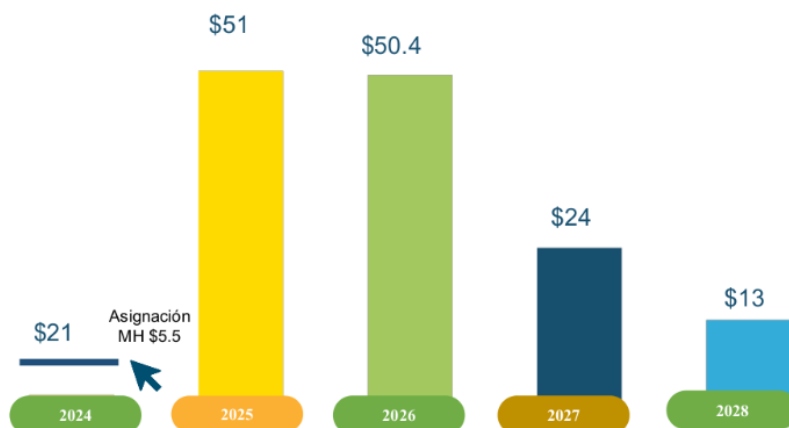

2.2 Gestión Técnica y Avances de las Actividades.

El cronograma del Programa se resume a continuación:

Cuadro no. 3: Programación estimada de avance del Programa.

Componente	Descripción	2024		2025		2026		2027	
		1er S	2do S	1er S	2do S	1er S	2do S	1er S	2do S
Componente 1 -Expansión y optimización de la infraestructura de saneamiento	Programado	D-50%	D-50%	E-15%	E-25%	E-25%	E-25%	E-10%	OPE R
	Avance	D-25%							
Componente 2 - Fortalecimiento Institucional y mejora de eficiencia en el sector	Programado	0%	D-50%	D-75%	E-15%	E-25%	E-25%	E-25%	E-10%
	Avance								

D: Diseño y proceso de contratación (% de actividades de contratación y diseño).

E: Ejecución- % de avance Físico a la fecha y Programado para el segundo semestre.

El detalle para cada uno de los componentes es el siguiente:

1.- Expansión y optimización de la infraestructura de saneamiento.

Del componente 1 se espera completar los procesos de selección y contratación de obras, y la supervisión de los proyectos durante el 2do. semestre de 2024. El Diseño de detalle se encuentra incluido en el Proceso de LPI-O-2023: *Licitación Macro Infraestructura de Saneamiento de Boca Chica: Diseño y Construcción de Obras de Alcantarillado Sanitario; Diseño y Construcción de Microtunelación; Diseño y Construcción de Emisario Submarino y la operación de Instalaciones de bombeo y tratamiento de aguas residuales.*

2.- Fortalecimiento Institucional y mejora de eficiencia en el sector.

Del componente 2 está en proceso de determinación y preparación de Especificaciones Técnicas y Términos de referencia de los procesos que se incluirán en este Componente tanto para la CORAABO como para el INAPA.

Las principales actividades realizadas entre enero a junio de 2024, son las siguientes:

- ✓ La DPPE a través del Director de la Dirección trabaja de forma conjunta con el BID desde junio de 2023 en la preparación de los (dos) documentos de licitación claves para el inicio del Programa, estos son: i) *LPI-001-2023-INAPA-CORAABO-BID: Licitación Macro Infraestructura de Saneamiento de Boca Chica: Diseño y Construcción de Obras de Alcantarillado Sanitario; Diseño y Construcción de Microtunelación; Diseño y Construcción de Emisario Submarino y la operación de Instalaciones de bombeo y tratamiento de aguas residuales* y ii) *SBCC-001-2023-INAPA-CORAABO-BID: Supervisión de Obras de Diseño + Construcción + Operación y Redes Secundarias por Resultados*; estos procesos se encuentran a nivel de recepción al finalizar el presente trimestre, su fecha límite de entrega es 11 de julio y 27 de junio de 2024, respectivamente.

-
- ✓ Se cumplieron todas las condiciones previas para realizar el primer desembolso que fue efectuado en abril de 2024, tales como registros de firmas, cuentas habilitadas y las cuentas específicas en los sistemas gubernamentales.
 - ✓ Talleres y entrenamientos del BID para el equipo del Programa en los meses de febrero a abril de 2024.
 - ✓ Se elaboraron los Términos de Referencias para todo el personal (en total 11 TDR) clave de la Unidad Coordinadora del Programa, para ser utilizados en los procesos para la Selección y contratación:
 - ✓ **Especialista Financiero**- NO del BID en fecha 21/02/2024
 - ✓ **Especialista Adquisiciones**- NO del BID en fecha 21/02/2024
 - ✓ **Coordinador del Componente 1 y DT 2**
 - ✓ **Ingenieros Auxiliares y apoyo a Supervisión**
 - ✓ **Ingenieros de obras Junior**- remitido al BID en fecha 23 de marzo de 2024
 - ✓ **Encargado de Planificación- Asistente del Coordinador**- Comentarios del BID en fecha 27/03/2024
 - ✓ **Diseño y Evaluación de Programas**
 - ✓ **Especialista Componente II-Fortalecimiento Institucional**
 - ✓ **Especialista Contador/a**
 - ✓ **Especialista Legal**-remitido al BID en fecha 15/02/2024.
 - ✓ **Especialista Gestión Ambiental**
 - ✓ **Especialista Monitoreo y Evaluación**- remitido al BID en fecha 15/02/2024.
 - ✓ **Especialista Gestión Social y de Género**
 - ✓ **Ingeniero Senior Supervisión**
 - ✓ **Especialista en Comunicaciones**
 - ✓ **Especialista Contador/a**
 - ✓ **Especialista en Tecnología y Comunicación** - remitido al BID en fecha 24 de abril de 2024.
 - ✓ **Especialista en Electromecánica**- remitido en fecha 11 de marzo de 2024.
-
- El BID prepara la Segunda Fase de este Programa para las ciudades de Higüey, San Pedro de Macorís y La Romana; por tanto, con los fondos de Cooperación Técnica elabora los documentos Ambientales y Sociales de la Nueva Operación, el INAPA a través de la DPPE ha revisado los documentos y se encuentran publicados en la página WEB del INAPA:
<https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/106-programa-saneamiento-universal-localidades-costeras-y-turisticas-ii>
 - Además, fueron realizadas las consultas públicas de estos Programas en las ciudades de Higüey, San Pedro de Macorís y La Romana, los días 01 y 02 de mayo de 2024 con una amplia participación de la sociedad y sus entidades organizativas- juntas de vecinos, instituciones educativas, autoridades gubernamentales, entre otros.
 - Se trabajó de manera conjunta con el BID en la preparación de los documentos para la Selección y contratación de firmas para el Proceso LPI-O-001-2024: Construcción de Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias por Resultados del Alcantarillado Sanitario de Boca Chica, publicando el llamado a licitación el 16 de julio de 2024 a través de la prensa escrita y en las páginas del INAPA y la ONU.
 - Visitas técnicas a las provincias de la Altagracia, San Pedro de Macorís y La Romana durante los meses de febrero y abril de 2024.
 - Visita técnica con los posibles oferentes de los procesos de Supervisión y de la Construcción del sistema de Alcantarillado en Boca Chica el 06 de mayo de 2024.

- Reuniones semanales con el BID para el seguimiento técnico del Programa.
- Se inició el proceso de catastro de redes de acueductos en las ciudades de Higüey, San Pedro de Macorís, La Romana y Boca Chica.
- Se realizan reuniones periódicas con el Ministerio de Medio Ambiente durante el mes de mayo y junio de 2024, la última reunión realizada fue el 26 de junio de 2024

2.3 Indicadores del Programa y Avances.

Los avances en los indicadores del Programa iniciarán su medición una vez realizada las contrataciones de las Firmas Consultoras y los procesos de obras que se encuentran programados en el marco de desarrollo de este Programa.

Cuadro no. 4: Lista de Indicadores y valores metas.

Descripción	Valores Metas	2026-2027
1.1 Hogares con acceso a saneamiento gestionando de forma segura	40,000	-
2.1 Tasa de micro-medición de las localidades intervenidas	40%	-
2.2 Porcentaje de clientes facturados en las localidades intervenidas	80%	-
2.3 Consumo de energía en los sistemas electromecánicos (bombeo de agua potable en las localidades intervenidas)	85	-

ANEXO I: Procesos de Adquisiciones y Seguimiento.

Descripción	Detalles del Avance	Monto de los Servicios USD
LPI-O-001-2023-INAPA-CORAABO-BID: Licitación Macro Infraestructura de Saneamiento de Boca Chica: Diseño y Construcción de Obras de Alcantarillado Sanitario; Diseño y Construcción de Microtunelación; Diseño y Construcción de Emisario Submarino y la operación de Instalaciones de bombeo y tratamiento de aguas residuales	El 11 de julio de 2024 fueron recibidas las ofertas técnicas y económicas.	N/A
SBCC-001-2023-INAPA-CORAABO-BID: Supervisión de Obras de Diseño + Construcción + Operación y Redes Secundarias por Resultados	El 04 de julio de 2024 fueron recibidas las ofertas técnicas y económicas.	N/A
-LPI- O-001-2024: Construcción de Redes Secundarias y conexión de domiciliarias por Resultados del Alcantarillado Sanitario de Boca Chica	Proceso publicado el 16 de julio de 2024.	N/A


N/A: No tienen contrato a la fecha.

Otros procesos de adquisiciones del Programa:

- Selección y Contratación del **Coordinador General del Programa** (UCP-INAPA-CORAABO-BID/001-2024) en fecha 11 de diciembre de 2024 al 10 de junio de 2024, y actualmente está en proceso de renovación por un periodo de un (1) año.
- Selección y Contratación de la **Especialista Financiera del Programa** (UCP-INAPA-CORAABO-BID/003-2024) en fecha 01 de junio de 2024.
- Selección y Contratación del **Especialista en Planificación** (UCP-INAPA-CORAABO-BID/004-2024) en fecha 01 de mayo de 2024.

ANEXO II: Fotos de Actividad.

Invitaciones Publicadas para las Consultas Públicas en La Romana, Higüey y San Pedro de Macorís.

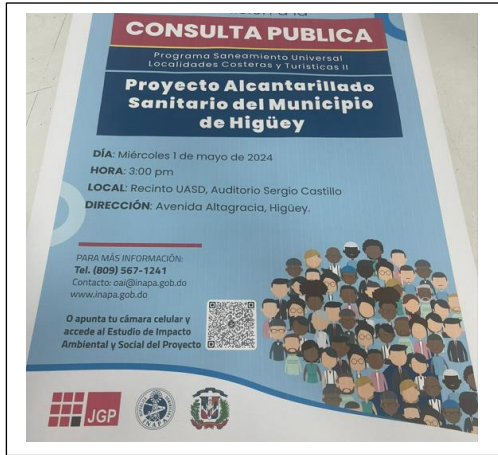

Fotos de la actividad de Consultas Públicas los días 01 y 02 de mayo de 2024.

