


ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Base Cost	% Complete	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	MC	Construcción de Depósitos Reguladores, Estación de Bombeo y Línea de Irrigación en Acueducto Cambita, Piedad	1874.6 days?	Mon 09/12/19	Fri 12/12/24		\$31,458,411.87	85%							
2	MC	Obra Cambita Piedad	0 days	Mon 09/12/19	Mon 09/12/19		\$0.00	0%							
3	MC	Tramo Línea Matriz desde Depósito Regulador 00"	33.6 days?	Mon 12/01/20	Wed 12/02/20	E	\$2,978,808.87	90%							
4	MC	Campamento	10 days	Mon 13/01/20	Sat 23/01/20	2	\$0.00	100%							
5	MC	Replanteo y Control Topográfico	10 days	Wed 15/01/20	Tue 28/01/20	4SS+3 days	\$3,504.85	100%							
6	MC	Suministro de tubería y piezas	15 days	Mon 20/01/20	Fri 07/02/20	7SS+4 days	\$1,009,214.64	100%							
7	MC	Movimiento de tierra	18 days	Mon 20/01/20	Wed 12/02/20	5SS+2 days	\$1,180,105.17	100%							
8	MC	Colocación de tubería y piezas	16 days	Mon 20/01/20	Mon 10/02/20	6SS+8 days	\$364,944.18	100%							
9	MC	Incremento	1 day?	Thu 23/01/20	Thu 23/01/20	8FF	\$399,312.25	100%							
10	MC	Limpieza Continua y final	3 days	Mon 20/01/20	Mon 10/02/20	8FF	\$16,514.55	50%							
11	MC	Depósito Regulador de 700 M3	609.5 days?	Mon 01/06/20	Mon 02/10/25	D2	\$2,246,103.06	87%							
12	MC	Replanteo y Control Topográfico	2 days	Mon 01/06/20	Tue 02/06/20	5SS+2 days	\$20,000.00	100%							
13	MC	Inicio Estudio de Suelo	4 days	Wed 03/06/20	Mon 08/06/20	12SS+2 days	\$0.00	100%							
14	MC	Movimiento de tierra	20 days	Mon 08/06/20	Mon 05/07/20	13	\$307,947.22	100%							
15	MC	Accondicionamiento de Camino 1 day?	Mon 15/06/20	Mon 15/06/20	13	\$49,601.20	100%								
16	MC	Hormigones Armados F'c=280 kg/cm2	150 days	Mon 15/07/20	Mon 16/08/21	14SS+15 days	\$5,725,222.15	28%							
17	MC	Terrazamientos de Superficie	63 days	Wed 19/02/20	Thu 14/05/20	16SS+27 days	\$365,450.81	100%							
18	MC	Aplicaciones de banda e impermeabilizante	10 days	Tue 31/12/19	Wed 22/01/20	14SS+6 days	\$172,103.34	100%							
19	MC	Construcción entrada y salida, rbores y by pass	5 days	Wed 29/01/20	Mon 17/02/20	16SS+11 days	\$993,711.34	100%							
20	MC	Movimiento de tierra	4 days	Thu 13/02/20	Tue 18/02/20	16SS+23 days	\$20,374.33	100%							
21	MC	Suministro y colocación de escalera y tapas	15 days	Sat 22/02/20	Fri 13/03/20	17SS+3 days	\$53,000.00	100%							
22	MC	Verja de Malla Ciénega	43 days	Wed 23/01/20	Thu 19/03/20	16SS+6 days	\$474,822.67	100%							
23	MC	Caseta de Materiales	2 days	Mon 01/06/20	Tue 02/06/20	12SS	\$30,000.00	100%							
24	MC	Embaldecimiento con Gravilla	3 days	Tue 01/06/21	Fri 23/06/23	17	\$27,170.00	100%							
25	MC	Limpieza final	2 days	Fri 11/06/21	Mon 05/07/23	24	\$15,000.00	100%							
26	MC	Caseta de Cloración	45 days	Tue 01/06/23	Mon 02/08/23	J	\$1,861,880.39	18%							
27	MC	Caseta de Cloro	45 days	Tue 01/06/22	Mon 02/05/23		\$1,861,080.39	10%							
28	MC	Red de Distribución 08" y 04"	778.06 days	Thu 02/01/20	Thu 18/12/23	F	\$2,679,231.96	83%							
29	MC	Replanteo y Control Topográfico	5 days	Mon 27/09/21	Wed 30/11/22	10	\$6,877.75	36%							
30	MC	Movimiento de tierra	16 days	Mon 05/07/20	Wed 30/11/22	29	\$1,116,816.87	95%							
31	MC	Suministro de tubería y piezas	16 days	Wed 08/04/20	Fri 02/12/22	30FF+2 days	\$483,943.68	95%							
32	MC	Colocación de tubería y piezas	8 days	Thu 02/01/20	Wed 07/12/22	31FF+3 days	\$179,445.86	95%							

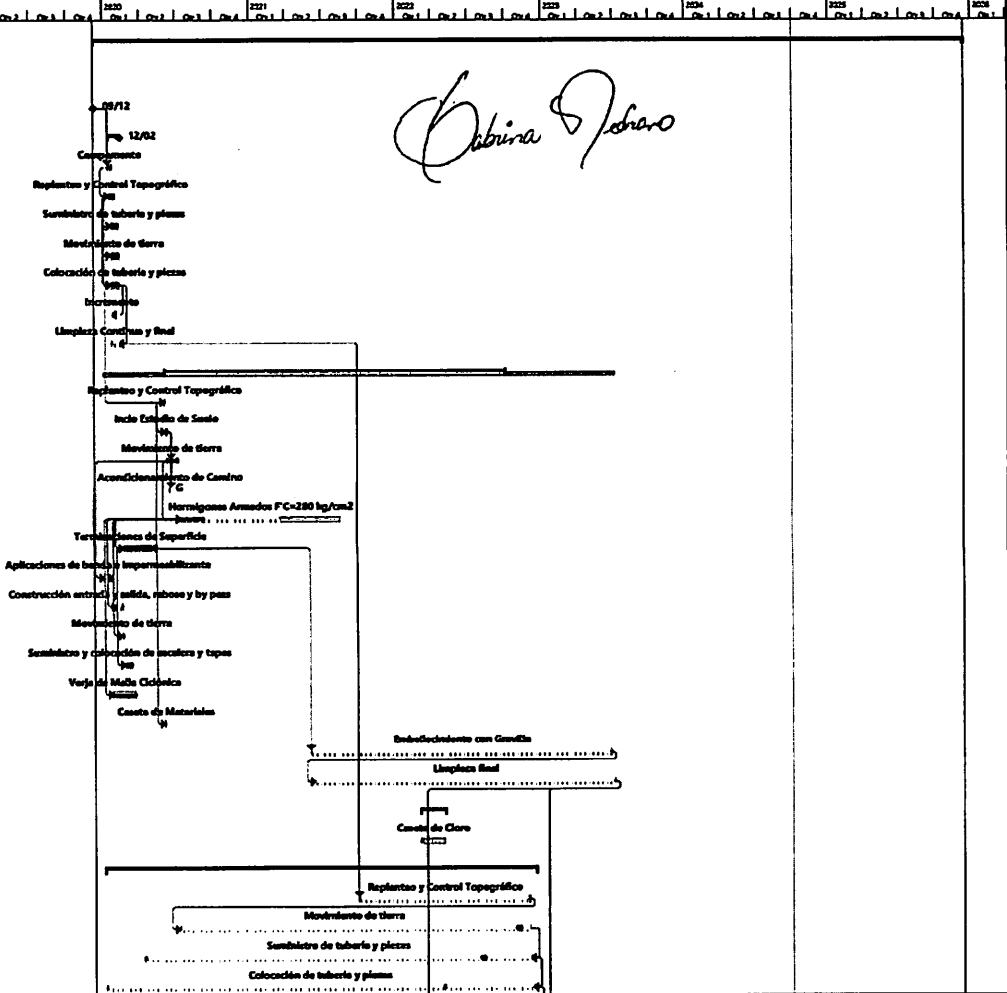

Project: CONSTRUCCION DE DEPÓSITOS REGULADORES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y LÍNEA DE IRRIGACIÓN EN ACUEDUCTO CAMBITA, PIEDAD
 Date: Wed 02/10/24
