


Id	Modo de tarea	Task Name	Duración
1		OBRA DE TOMA, CÁRCAMO DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN RIO JOVERO - MICHES	185 días
2		REINICIO TRABAJOS	0 días
3		VIA DE ACCESO	169 días
4		LIMPIEZA GENERAL	3 días
5		COMPLETIVO CORTE	3 días
6		RELLENO	30 días
7		COLOCACIÓN / VACIADO CABEZAL ALCANTARILLA	20 días
8		CONFORMACIÓN CUNETAS	15 días
9		ENCACHADO CUNETAS	21 días
10		INTERSECCIÓN C/VÍA PRINCIPAL	3 días
11		ASFALTADO GENERAL	5 días
12		SEÑALIZACIÓN	2 días
13		LIMPIEZA FINAL	2 días
14		FIN TRABAJOS VIA DE ACCESO	0 días
15		DESVIO RIO JOVERO	153 días
16		COMPLETIVO CORTE	5 días
17		CONFORMACIÓN ATAGUÍAS	10 días
18		LIMPIEZA Y BOTE	3 días
19		FIN TRABAJOS DESVIO RIO JOVERO	0 días
20		REMOCIÓN ATAGUÍAS / RESTABLECIMIENTO CAUCE	2 días
21		DIQUE / OBRA DE TOMA / CÁRCAMO DE BOMBEO	157 días
22		MOV. DE TIERRAS / EXCAVACIÓN GENERAL	7 días
23		HORMIGÓN CICLÓPEO EN FUNDACIÓN DIQUE	10 días
24		OBRA CIVIL DIQUE	60 días
25		OBRA CIVIL OBRA DE TOMA	45 días
26		OBRA CIVIL CÁRCAMO DE BOMBEO	45 días
27		SUMINISTRO EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO	125 días
28		INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO ELETROMECÁNICO	25 días
29		TERRACERÍA GENERAL ZONA GARITA / MURO PERIMETR	10 días
30		GARITA SEGURIDAD	21 días
31		MURO PERIMETRAL	21 días
32		LIMPIEZA GENERAL FINAL	5 días
33		FIN TRABAJOS DIQUE / OBRA DE TOMA / CÁRCAMO DE BOMBEO	0 días
34		ELECTRIFICACIÓN	155 días
35		AJUSTES DISEÑO Y TRAMITACIÓN	45 días
36		SUMINISTRO EQUIPOS ELÉCTRICOS	120 días
37		INSTALACIÓN EQUIPOS ELÉCTRICOS	30 días
38		ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA	45 días
39		ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA	30 días
40		LIMPIEZA GENERAL FINAL	5 días
41		FIN TRABAJOS ELECTRIFICACIÓN	0 días
42		LÍNEA DE IMPULSIÓN	180 días
43		RECEPCIÓN TUBERÍAS Y LOGÍSTICA INICIAL	15 días
44		COLOCACIÓN TUBERÍAS (INC. MOV. TIERRAS)	160 días
45		LIMPIEZA GENERAL FINAL	5 días
46		FIN TRABAJOS LÍNEA DE IMPULSIÓN	0 días
47		PRUEBAS FINALES Y PUESTA EN MARCHA	5 días
48		PRUEBAS FINALES Y PUESTA EN MARCHA	5 días
49		FINAL TRABAJOS	0 días

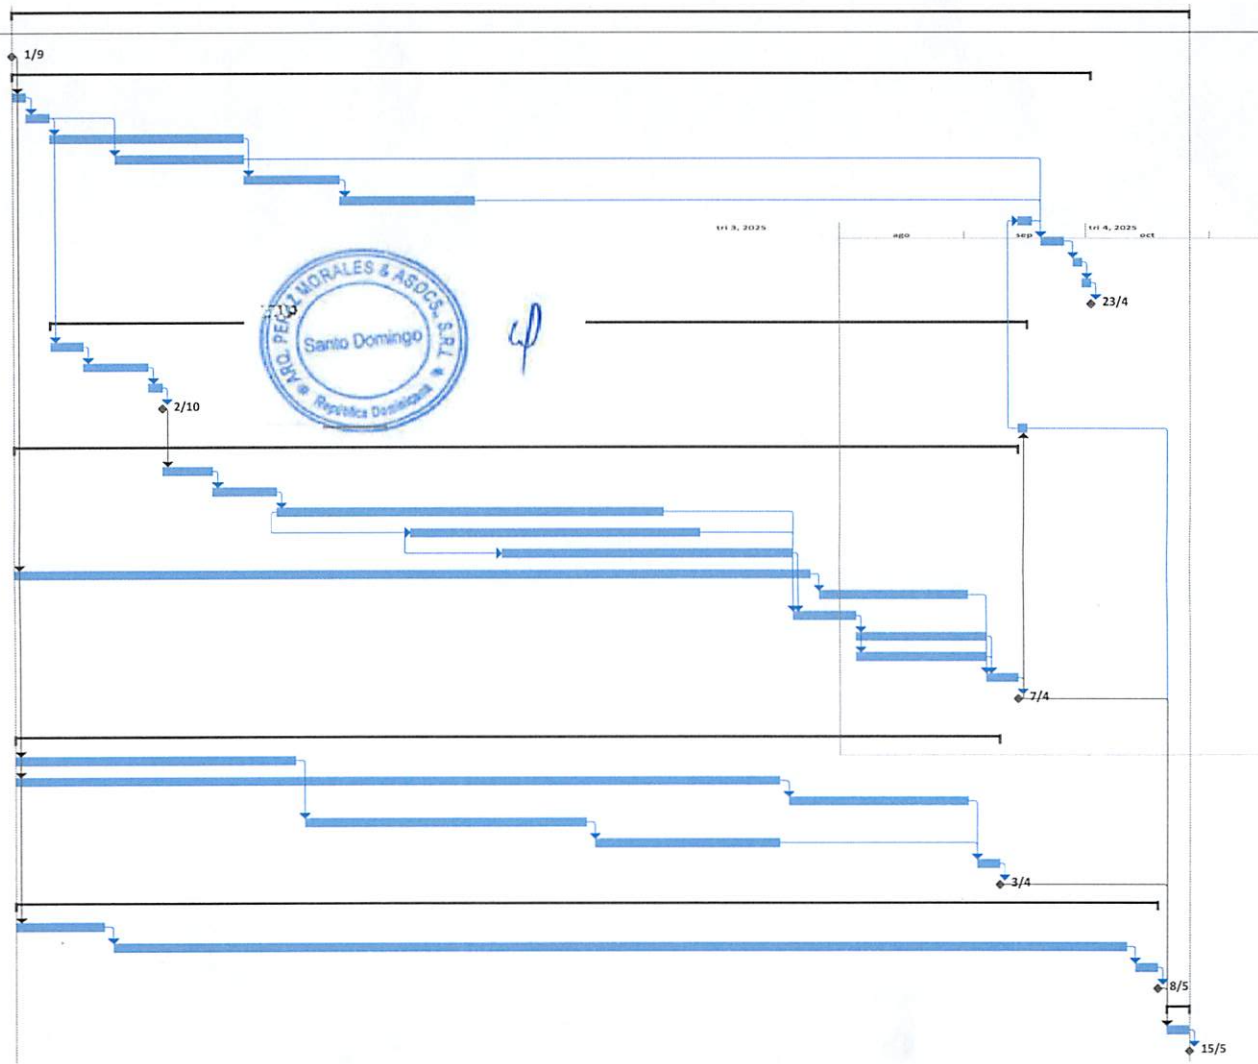

Task
Split
Milestone

Summary
Project Summary
External Tasks

External Milestone
Inactive Task
Inactive Milestone

Inactive Summary
Manual Task
Duration-only

Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only

Finish-only
Deadline
Progress

Manual Progress
