


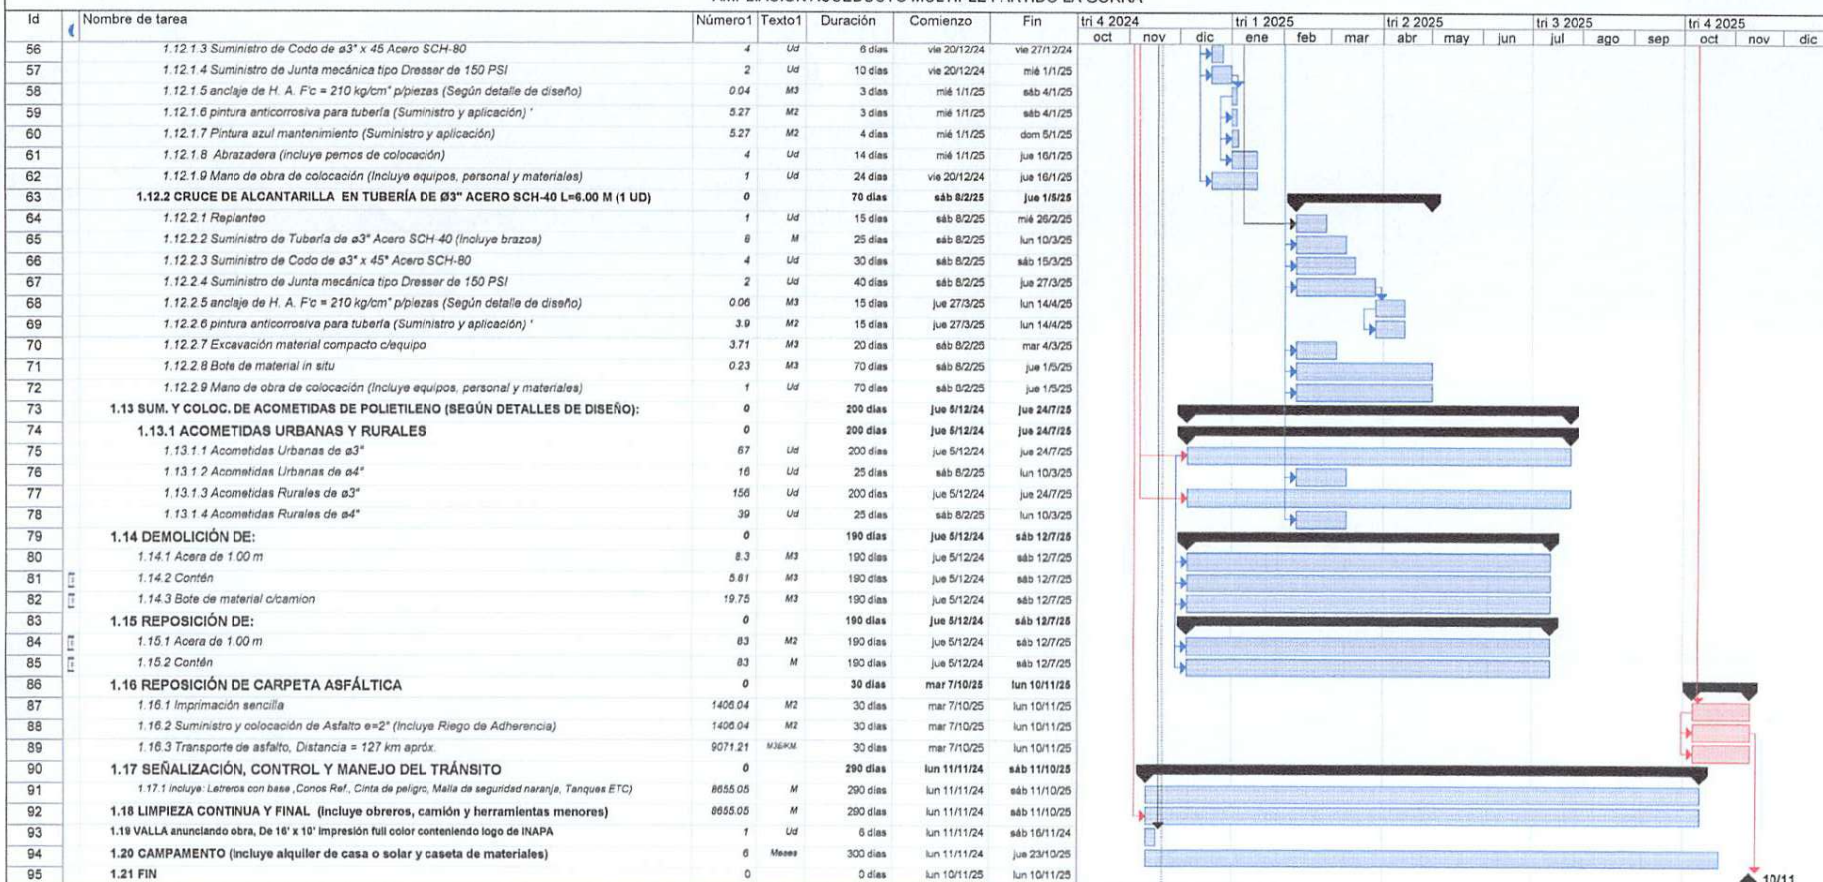

10/11


Proyecto: PROG ENM EQUIL ECO
Fecha: mié 20/11/24

Tarea Hito
Tarea crítica Resumen
Progreso Tarea resumida

Tarea crítica resumida
Hito resumido
Progreso resumido

División
Tareas externas
Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis
Fecha límite

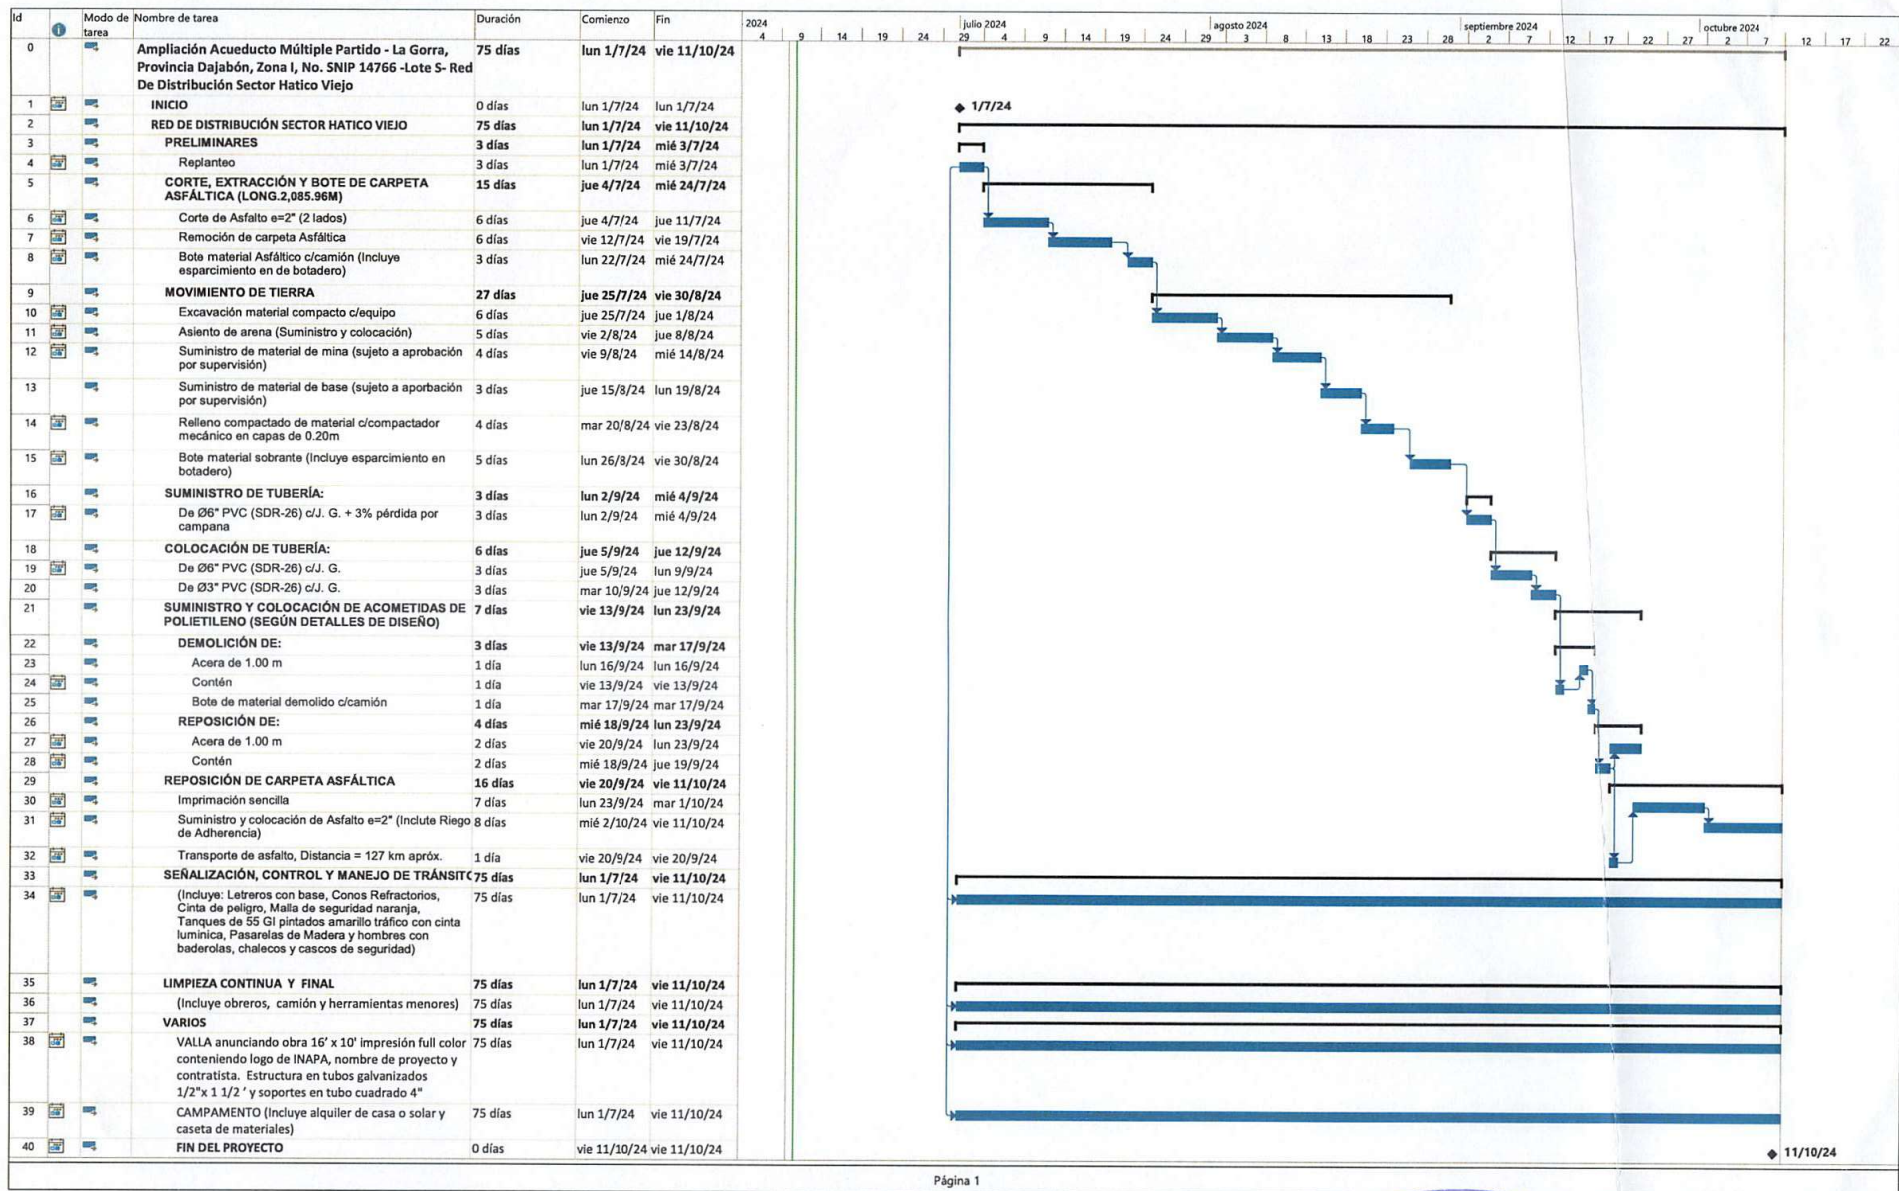

Benito S

Id	Modo de	Nombre de tareas	Duración	Comienzo	Fin	2, 2022	Semana 1, 2023	Semana 2, 2023	Semana 1, 2024	Semana 2, 2024	Semana 3, 2024	
						S	N	M	M	J	S	N
1	✓	Línea de Conducción	263 días?	mié 01/11/23	vie 01/11/24							
2	✓	Preliminares	2 días	mar 14/11/23	mié 15/11/23							
3	✓	Replanteo	2 días	mar 14/11/23	mié 15/11/23							
4	✓	Movimiento de tierra	19 días?	jue 16/11/23	mar 12/12/23							
5	✓	Excavación material no clasificado c/equipo	15 días	jue 16/11/23	mié 06/12/23							
6	✓	Asiento de arena (suministro y colocación)	1 día?	jue 07/12/23	jue 07/12/23							
7	✓	Suministro de material de mina para relleno	1 día?	vie 08/12/23	vie 08/12/23							
8	✓	Relleno compactación material de relleno c/compactador mecánico en capas de 0.20 m	1 día?	lun 11/12/23	lun 11/12/23							
9	✓	Bota de material con camión d=5km (incluye carguo y espesamiento en botadero)	1 día?	mar 12/12/23	mar 12/12/23							
10	✓	Suministro de Tubería	0 días?	mar 12/12/23	mar 12/12/23							
11	✓	De Ø 4" PVC (SDR-26) C/LG+ 2% pérdida por campana										
12	✓	Colocón de Tubería	2 días?	mié 13/12/23	jue 14/12/23							
13	✓	De Ø 4" PVC (SDR-26) C/LG	1 día?	mié 13/12/23	mié 13/12/23							
14	✓	Suministro y Colocación de Piezas Especiales de:	1 día	jue 14/12/23	jue 14/12/23							
15	✓	PVC SCH-40 (c/cemento solvente Tangit):	4 días?	vie 15/12/23	mié 20/12/23							
16	✓	Codo 4" X 45"	1 día?	vie 15/12/23	vie 15/12/23							
17	✓	Tee 4" X 4"	1 día?	lun 18/12/23	lun 18/12/23							
18	✓	Reducción 4" X 3"	1 día?	mar 19/12/23	mar 19/12/23							
19	✓	Anclaje de H.S. F=180 kg/cm2 p/cm2 p/piezas (según detalle del diseño)	1 día?	mié 20/12/23	mié 20/12/23							
20	✓	Acero SCH-40 (c/protcción anticorrosiva):	4 días?	jue 21/12/23	mar 26/12/23							
21	✓	Reducción 6" X 4"	1 día?	jue 21/12/23	jue 21/12/23							
22	✓	Junta mecánica tipo Dresser Ø 6" 150 PSI	1 día?	vie 22/12/23	vie 22/12/23							
23	✓	Junta mecánica tipo Dresser Ø 4" 150 PSI	1 día?	lun 25/12/23	lun 25/12/23							
24	✓	Anclaje de H.S. F=210 kg/cm2 p/cm2 p/piezas (según detalle del diseño)	1 día?	mar 26/12/23	mar 26/12/23							
25	✓	Cruce de Puente en Tubería de Ø 6" Acero SCH-40 L=6.00 M (UD)	280 días?	mar 22/11/22	lun 01/01/24							
26	✓	Replanteo	1 día?	mié 27/12/23	mié 27/12/23							
27	✓	Suministro de Tubería de Ø 6" Acero SCH-40 (incluye brazos)	1 día?	jue 28/12/23	jue 28/12/23							
28	✓	Suministro de Codo Ø 6" X 45 Acero SCH-40 c/protcción anticorrosiva	1 día?	vie 29/12/23	vie 29/12/23							
29	✓	Suministro de Junta Mecánica tipo Dresser de Ø 6" 150 PSI	1 día?	lun 01/01/24	lun 01/01/24							
30	✓	Anclaje de H.A. F=210 kg/cm2 p/piezas (según detalle de diseño)	1 día?	mar 22/11/22	mar 22/11/22							
31	✓	Pintura anticorrosiva para tubería (suministro y aplicación)	1 día?	mié 27/12/23	mié 27/12/23							
32	✓	Pintura Azul mantenimiento (suministro y aplicación)	1 día?	jue 28/12/23	jue 28/12/23							
33	✓	Abrazadera 6" (incluye pernos)	1 día?	vie 29/12/23	vie 29/12/23							
34	✓	Mano de obra de colocación (incluye equipos, personal y materiales)	1 día?	lun 01/01/24	lun 01/01/24							
35	✓	Suministro y Colocación de Válvulas	5 días?	mar 02/01/24	lun 08/01/24							
36	✓	Válvula de aire de Ø 3/4" 150 PSI, completa	1 día?	mar 02/01/24	mar 02/01/24							
37	✓	Válvula de desagüe de Ø 2" 150 PSI, completa	1 día?	mié 03/01/24	mié 03/01/24							
38	✓	Válvula compuerta de Ø 4" H.F. 150 PSI pintada, completa	1 día?	jue 04/01/24	jue 04/01/24							
39	✓	Caja Telescópica p/válvula H.F.	1 día?	vie 05/01/24	vie 05/01/24							
40	✓	Registro P/válvula de aire (según diseño)	1 día?	lun 08/01/24	lun 08/01/24							
41	✓	Señalización, Control y Manejo de Tránsito	0 días?	lun 08/01/24	lun 08/01/24							
42	✓	(incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gls pintados amarillo tráfico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chalecos y cascos de seguridad)										
43	✓	Limpieza Continua y Final	0 días?	lun 08/01/24	lun 08/01/24							
44	✓	(incluye obreros, camión y herramientas menores)										

Proyecto: Ampliación Acueducto

Fecha: mié 07/08/24

Tarea: ☒ Inactivo

División: ☒ Inactivo

Resumen: ☒ Inactivo

Resumen del proyecto: ☒ Inactivo

Informe de resumen manual: ☒ Inactivo

Resumen manual: ☒ Inactivo

Resumen: ☒ Inactivo

Resumen del proyecto: ☒ Inactivo

Informe de resumen manual: ☒ Inactivo

Resumen manual: ☒ Inactivo

Resumen: ☒ Inactivo

Resumen del proyecto: ☒ Inactivo

Informe de resumen manual: ☒ Inactivo

Resumen manual: ☒ Inactivo

Resumen: ☒ Inactivo

Resumen del proyecto: ☒ Inactivo

Informe de resumen manual: ☒ Inactivo


Resumen manual: ☒ Inactivo


Resumen: ☒ Inactivo

Resumen del proyecto: ☒ Inactivo

MUSALEX SRL

URV 10-9
UNION HERFA NO.53

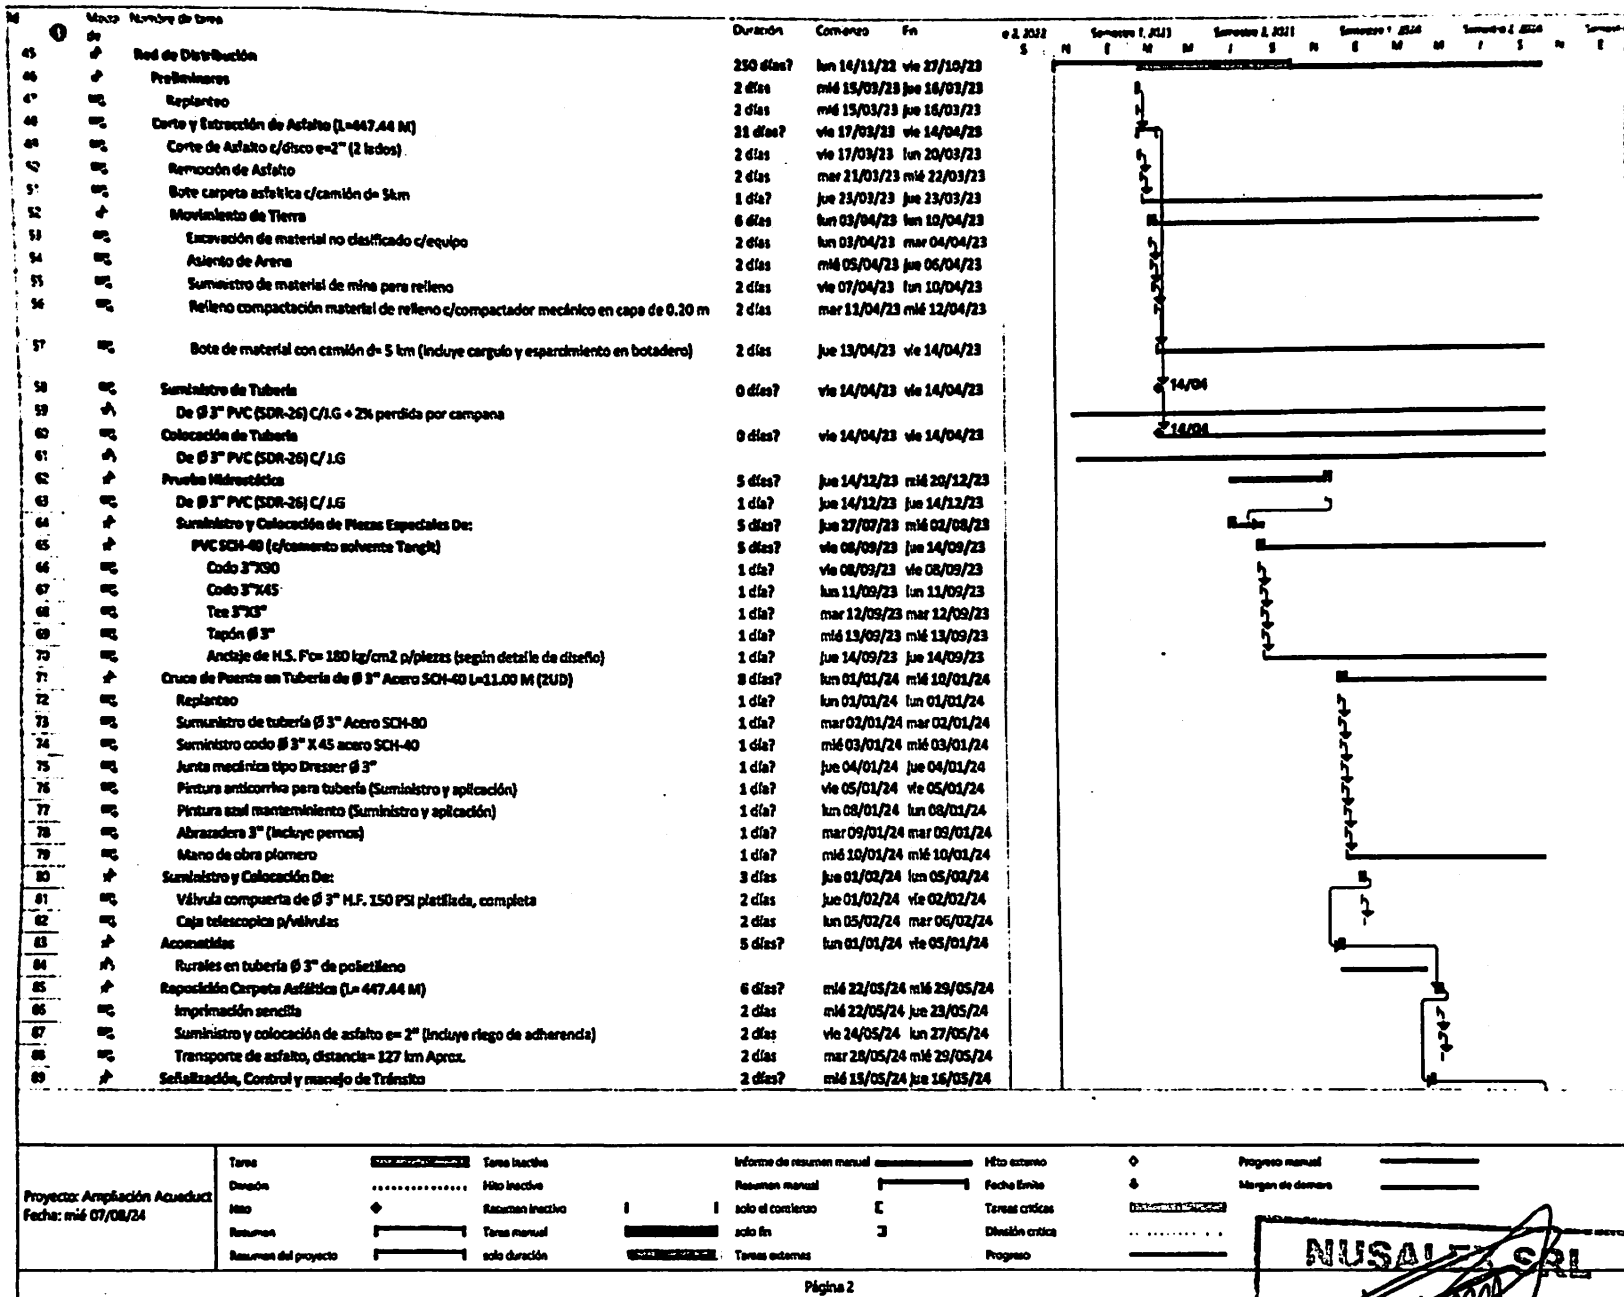

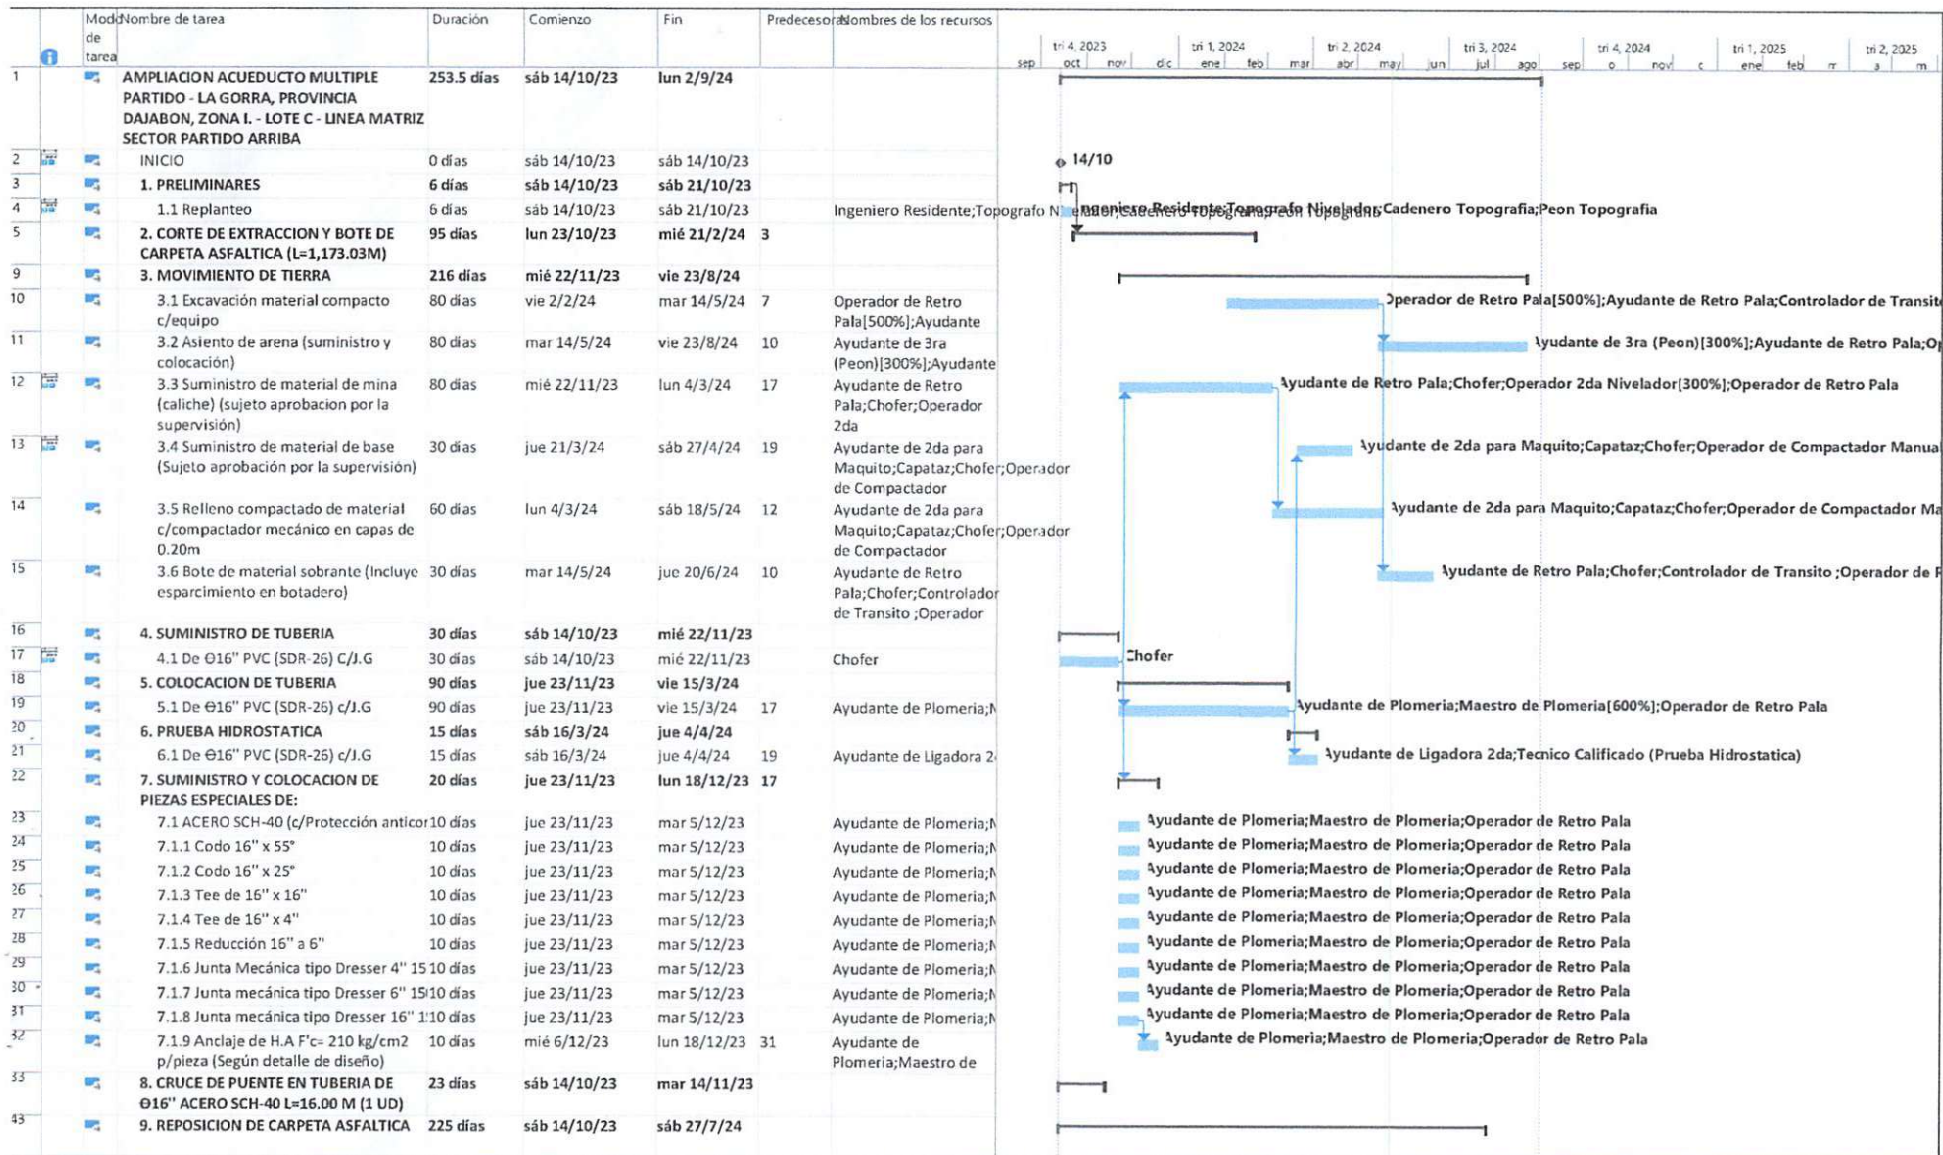

Mod	Nombre de tarea de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Nombres de los recursos	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may
7	10. SEÑALIZACION, CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO	253 días	sáb 14/10/23	lun 2/9/24																							
8	10.1 Señalización Control y Manejo de Transito (incluye letreros con bade,	253 días	sáb 14/10/23	lun 2/9/24		Ayudante de 3ra (Peon);Chofer																					
9	11. LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	253 días	sáb 14/10/23	lun 2/9/24																							
0	11.1 Limpieza Final (incluye obreros, camión y herramientas menores)	253 días	sáb 14/10/23	lun 2/9/24		Ayudante de 3ra (Peon)[400%];Chofer																					
1	Varios	253 días	sáb 14/10/23	lun 2/9/24																							
2	Valla	253 días	sáb 14/10/23	lun 2/9/24																							
3	Campamento	253 días	sáb 14/10/23	lun 2/9/24																							
4	Gastos Indirectos	253.5 días	sáb 14/10/23	lun 2/9/24																							
5	Honorarios Profesionales	253 días	sáb 14/10/23	lun 2/9/24																							
6	Gastos Administrativos	253 días	sáb 14/10/23	lun 2/9/24																							
7	Seguros, Polizas y Fianzas	253 días	sáb 14/10/23	lun 2/9/24																							
8	Gastos de Transporte	253 días	sáb 14/10/23	lun 2/9/24																							
9	Supervision de la Obra	253 días	sáb 14/10/23	lun 2/9/24																							
0	Puesta en Marcha y Estabilizacion del Sistema	253 días	sáb 14/10/23	lun 2/9/24																							
1	Medida de Compensacion Ambiental	253 días	sáb 14/10/23	lun 2/9/24																							
2	ITBIS Honorarios Profesionales (Ley 07-2007)	253.5 días	sáb 14/10/23	lun 2/9/24																							
3	Ley 6-86	253 días	sáb 14/10/23	lun 2/9/24																							
4	CODIA	253 días	sáb 14/10/23	lun 2/9/24																							
5	Imprevistos	253 días	sáb 14/10/23	lun 2/9/24																							
6	Fin	0 días	lun 2/9/24	lun 2/9/24	50																						



Victor Adames

Proyecto: Proyecto_INAPA_TIEM	Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha limite
cha: vie 24/5/24	División	Tarea inactiva	solo duracion	solo fin	Progreso
	Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
	Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

CRONOGRAMA DE OBRA

AMPLIACION ACUEDUCTO MULT. PARTIDO-LA GORRA, PROV. DAJABON, RED DIST. PARTIDO Y VILLA GARCIA (LOTE E)-CONTRATO 100/2022

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	
1	AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE PARTIDO - LA GORRA-...PROV.	106 días?	jue 30/5/24	jue 24/10/24	
2	PRESUPUESTO BASE 01/03/2022	76 días	jue 30/5/24	jue 12/9/24	
3	PRELIMINARES	7 días	jue 30/5/24	vie 7/6/24	
4	CORTE, EXTRACC. Y BOTE DE CARPETA ASF.	10 días	lun 3/6/24	vie 14/6/24	
5	MOVIMIENTO DE TIERRA	15 días	vie 7/6/24	jue 27/6/24	
6	SUMINISTRO TUBERIA	11 días	vie 7/6/24	vie 21/6/24	
7	COLOCACION DE TUBERIA	15 días	jue 20/6/24	lun 22/7/24	
8	PRUEBA HIDROSTATICA	17 días	lun 5/8/24	vie 6/9/24	
9	SUMIN. Y COLOC. DE PIEZAS ESPECIALES	11 días	lun 8/7/24	lun 22/7/24	
10	CRUCES	16 días	jue 11/7/24	jue 1/8/24	
11	SUMIN. Y COLOC. DE ACOMETIDAS POLIETILENO	13 días	lun 15/7/24	mié 31/7/24	
12	DEMOLICION ACERA	7 días	lun 3/6/24	mar 11/6/24	
13	REPOSICION ACERA	11 días	lun 10/6/24	lun 24/6/24	
14	REPOSICION CARPETA AFALTICA	15 días	mar 13/8/24	lun 2/9/24	
15	SEÑALIZACION, CONTROL Y MAN. TRANS	36 días	jue 30/5/24	lun 26/8/24	
16	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	26 días	mié 10/7/24	jue 12/9/24	
17	VARIOS (VALLA)	12 días	jue 30/5/24	jue 27/6/24	
18	CAMPAMENTO	26 días	lun 3/6/24	vie 2/8/24	
19	AUMENTO DE CANTIDAD -PRESUP. ACTUALIZADO No. 1 -	20 días	vie 14/6/24	jue 11/7/24	
20	PRELIMINARES	3 días	vie 14/6/24	mar 18/6/24	
21	CORTE Y EXTRACCION DE CARPETA ASFALTICA	15 días	mié 19/6/24	mar 9/7/24	
22	MOVIMIENTO DE TIERRA	18 días	mié 10/7/24	vie 2/8/24	
23	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA	10 días	dom 8/9/24	jue 19/9/24	
24	SEÑALIZACION, CONTROL Y MAN. TRANS	12 días	lun 29/7/24	mar 13/8/24	
25	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	44 días	mié 7/8/24	mié 9/10/24	
26	NUEVAS PARTIDAS -PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 1-	74 días	vie 7/6/24	mié 18/9/24	
27	SUMINISTRO DE TUBERIA	6 días	lun 5/8/24	lun 12/8/24	
28	COLOCACION DE TUBERIA	5 días	lun 12/8/24	vie 16/8/24	
29	PRUEBA HIDROSTATICA	7 días	mar 10/9/24	mié 18/9/24	
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES	8 días	lun 19/8/24	mié 28/8/24	
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS	6 días	lun 19/8/24	lun 26/8/24	
32	SUMIN. Y COLOC. DE ACOMETIDAS POLIETILENO	5 días	lun 19/8/24	vie 23/8/24	
33	PRELIMINARES (CATEOS EN TUBERIAS 6" PVC)	6 días	vie 7/6/24	vie 14/6/24	
34	MOV.DE TIERRA (EXC. EN ROCA)	8 días	mié 24/7/24	vie 2/8/24	
35	REPOS. DE TUBERIAS ROTAS DURANTE EXCAV.	10 días	vie 28/6/24	mié 31/7/24	
36	DEMOLICION DE: PUENTE BADEN... ENCACHE...	9 días	vie 28/6/24	mié 24/7/24	
37	REPOSICION DE: PUENTE BADEN..ENCACHE..	12 días	lun 29/7/24	mar 13/8/24	
38	AUMENTO DE CANTIDAD-PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 2 -	28 días	lun 26/8/24	mié 2/10/24	
39	CORTE, EXTRACC. Y BOTE DE CARPETA ASF.	7 días	lun 26/8/24	mar 3/9/24	
40	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA	13 días	lun 16/9/24	mié 2/10/24	
41	NUEVAS PARTIDAS-PRESUPUESTO ACTUALIZADO No. 2 -	1 día	jue 30/5/24	jue 30/5/24	
42	CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø 3" ACERO	8 días	lun 19/8/24	mié 28/8/24	
43	CRUCE DE ALCANTARILLA EN TUBERIA DE Ø 6" ACERO	13 días	vie 30/8/24	mar 17/9/24	
44	REPOSICION DE TUBERIAS EXISTENTES AFECTADAS	5 días	lun 16/9/24	vie 20/9/24	
45	HORM. S. PARA FIJACION DE CAJAS REGISTRADORAS	37 días	lun 19/8/24	mar 8/10/24	
46	PRESUPUESTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO-MAYO-2024				
47	PARTIDAS NO CUBICADAS-FASE A				
48	PARTIDAS CUBICADAS-FASE A				
49	GASTOS INDIRECTOS	93 días	jue 30/5/24	lun 7/10/24	

CRONOGRAMA DE EJECUCION ACUEDUCTO PARTIDO TRAMO G

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	CANTIDAD A EJECUTAR	Nombres de los recursos	11 febrero					11 abril				
									1 marzo					21 marzo				
1		TERMINACION ACUEDUCTO PARTIDO TRAMO G	184 días	mar 12/3/24	vie 22/11/24				PORCENTAJE A VALOR POR EJECUTAR					CUBICAR				
2		PRELIMINARES	1 día	jue 20/6/24	jue 20/6/24													
3		Replanteo	1 día	jue 20/6/24	jue 20/6/24		0.12 %	3,745.10										
4		CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA (L=2,137.61 M) EJECUTADAS	10 días	jue 20/6/24	mié 3/7/24													
5		Corte de Asfalto e=2" (2 lados)	3 días	vie 21/6/24	mar 25/6/24	3	0.12 %	23,996.79										
6		Remoción de carpeta Asfáltica	3 días	mié 26/6/24	vie 28/6/24	5	0.11%	6,806.00										
7		Bote material Asfáltico c/camión (Incluye esparcimiento en lugar de botadero)	3 días	lun 1/7/24	mié 3/7/24	6	0.11%	2,301.60										
8			0 días	jue 20/6/24	jue 20/6/24													
9		MOVIMIENTO DE TIERRA	35 días	vie 14/6/24	jue 1/8/24													
10		Excavación material compacto c/equipo	1 día	mié 26/6/24	mié 26/6/24	5	0.12 %	30,542.43										
11		Asiento de arena (Suministro y colocación)	3 días	jue 20/6/24	lun 24/6/24		0.17%	40,269.37										
12		Suministro de material de mina (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión)	15 días	vie 21/6/24	jue 11/7/24	17	0.19%	69,747.40										
13		Suministro de material de base (Sujeto aprobación por la supervisión)	15 días	jue 27/6/24	mié 17/7/24	10	100%	306,782.00										
14		Relleno compactado de material c/compactador mecánico en capas de 0.20m	15 días	mié 19/6/24	mar 9/7/24	18	0.12 %	30,665.12										
15		Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero)	15 días	jue 4/7/24	mié 24/7/24	7	0.25%	44,830.80										
16		SUMINISTRO DE TUBERÍA:	35 días	vie 14/6/24	jue 1/8/24													
17		De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G. + 3% pérdida por camoana	3 días	mar 18/6/24	jue 20/6/24	11CC-2 días	0.00	1,213.77										
18		De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G. + 2% pérdida por camoana	3 días	vie 14/6/24	mar 18/6/24	17CC-2 días	0.26%	140,439.48										
19		COLOCACIÓN DE TUBERÍA:	6 días	jue 20/6/24	jue 27/6/24													
20		De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G.	3 días	jue 20/6/24	lun 24/6/24	11CC	0.00	23.98										
21		De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G.	3 días	mar 25/6/24	jue 27/6/24	20	0.26	7,126.22										
22		PRUEBA HIDROSTÁTICA	18 días	mar 9/7/24	jue 1/8/24	21												
23		De Ø6" PVC (SDR-26) c/J. G.	8 días	mar 9/7/24	jue 18/7/24	20FC+10 días	100%	64,277.06										
24		De Ø3" PVC (SDR-26) c/J. G.	5 días	vie 26/7/24	jue 1/8/24	21FC+20 días	100%	50,022.48										
25		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE:	95 días	mié 13/3/24	mar 23/7/24													
26		ACERO SCH-40 (c/protección anticorrosiva):	3 días	jue 20/6/24	lun 24/6/24													
27		PVC SCH-40 (c/cemento solvente Tangit):	95 días	mié 13/3/24	mar 23/7/24	23												
28		Codo 3" x 45°	3 días	vie 19/7/24	mar 23/7/24	21	100%	1,823.10										
29		Codo 3" x 90°	3 días	mié 13/3/24	vie 15/3/24	21	100%	444.16										
30		Tee 3" x 3"	3 días	vie 19/7/24	mar 23/7/24	21	100%	11,329.80										
31		Tee 4" x 4"	3 días	vie 19/7/24	mar 23/7/24	21	100%	3,504.08										
32		Reducción 4" x 3"	3 días	vie 19/7/24	mar 23/7/24	21	100%	2,435.72										
33		Anclaje de H. S. Fc = 180 kg/cm² p/plazas (Según detalle de diseño)	3 días	vie 19/7/24	mar 23/7/24	21	100%	9,590.13										
34		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS	10 días	mié 24/7/24	mar 6/8/24	33												
35		Válvula de Compuerta de Ø3" H.F. de 150 PSI, Platlilada, Completa (Incluye cuerpo de 3 días válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser)	3 días	vie 2/8/24	mar 6/8/24	24	0.50%	33,288.44										
36		Válvula de Compuerta de Ø4" H.F. de 150 PSI, Platlilada, Completa (Incluye cuerpo de 3 días válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser)	3 días	vie 2/8/24	mar 6/8/24	24	0.50 %	39,985.64										
37		Válvula de Compuerta de Ø6" H.F. de 150 PSI, Platlilada, Completa (Incluye cuerpo de 3 días válvula, niple, tornillos, tuercas, juntas de goma y junta dresser)	3 días	mié 24/7/24	vie 26/7/24	23												
38		Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Según diseño)	3 días	lun 29/7/24	mié 31/7/24	37	0.33%	10,980.08										
39		CRUCES:	9 días	mar 25/6/24	vie 5/7/24													
40		CRUCE DE PUENTE EN TUBERÍA DE Ø6" ACERO SCH-40 L=20.00 M (1 UD)	9 días	mar 25/6/24	vie 5/7/24													
41		Replanteo	1 día	mar 25/6/24	mar 25/6/24	20	100%	600.00										
42		Suministro de Tubería de Ø6" Acero SCH-40 (Incluye brazos)	3 días	mar 25/6/24	jue 27/6/24	20	100%	78,844.04										
43		Suministro de Codo de Ø6" x 45° Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva	3 días	mar 25/6/24	jue 27/6/24	20	100%	15,264.48										
44		Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de Ø6" 150 PSI	3 días	mar 25/6/24	jue 27/6/24	20	100%	4,620.88										
45		Anclaje de H. A. Fc = 210 kg/cm² p/plazas (Según detalle de diseño)	3 días	vie 28/6/24	mar 2/7/24	44	100%	1,048.88										
46		Pintura anticorrosiva para tubería (Suministro y aplicación)	3 días	vie 28/6/24	mar 2/7/24	42	100%	1,570.44										
47		Pintura azul mantenimiento (Suministro y aplicación)	3 días	vie 28/6/24	mar 2/7/24	42	100%	1,924.04										
48		Abrazadera (Incluye pernos)	3 días	vie 28/6/24	mar 2/7/24	42	100%	11,200.00										
49		Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales)	3 días	mié 3/7/24	vie 5/7/24	48	100%	14,787.97										
50		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDAS DE POLIETILENO (SEGÚN DETALLES DE DISEÑO):	29 días	jue 20/6/24	mar 30/7/24													

444.16

RMACG

CRONOGRAMA DE EJECUCION ACUEDUCTO PARTIDO TRAMO G

Id	Modo de tarea	Task Name	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	CANTIDAD A EJECUTAR	Nombres de los recursos	11 febrero	1 marzo	21 marzo	11 abril	1
51			2 días	jue 20/6/24	vie 21/6/24								
52		ACOMETIDAS URBANAS	2 días	jue 20/6/24	vie 21/6/24								
53		De Ø3 " 76 UND	8 días	vie 19/7/24	mar 30/7/24	21FC+15 días	100%	227,535.36					
54		De Ø6 " 81 UND	10 días	mar 16/7/24	lun 29/7/24	20FC+15 días							
55		DEMOLICIÓN DE:	5 días	mié 31/7/24	mar 6/8/24								
56		Acera de 1.00 m	3 días	mié 31/7/24	vie 2/8/24	53	100%	4,580.50					
57		Contén	3 días	mié 31/7/24	vie 2/8/24	53	100%	3,206.35					
58		Bote de material demolido c/camión	2 días	lun 5/8/24	mar 6/8/24	57	100%	2,228.10					
59		REPOSICIÓN DE:	4 días	lun 5/8/24	jue 8/8/24								
60		Acera de 1.00 m	2 días	lun 5/8/24	mar 6/8/24	57	100%	53,429.76					
61		Contén	4 días	lun 5/8/24	jue 8/8/24	57	100%	58,540.80					
62		REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA	71 días	vie 21/6/24	vie 27/9/24								
63		Imprimación sencilla	5 días	vie 30/8/24	jue 5/9/24	24FC+20 días	100%	175,044.65					
64		Suministro y colocación de Asfalto e=2 " (Incluye Riego de Adherencia)	3 días	mié 25/9/24	vie 27/9/24	63FC+13 días	100%	1,033,876.25					
65		Transporte de asfalto, Distancia = 127 km apróx.	3 días	mié 25/9/24	vie 27/9/24	63FC+13 días	100%	216,840.82					
66		SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO (Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 Gls pintados amarillo tráfico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chachelo	1 día	vie 21/6/24	vie 21/6/24	3CC+1 día	0.12 %	6,331.19					
67		LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL (Incluye obreros, camión y herramientas menores)	184 días	mar 12/3/24	vie 22/11/24								
68		Limpiezas final	184 días	mar 12/3/24	vie 22/11/24	64FC+10 días							
69		CAMPAMENTO (Incluye alquiler de casa o solar y caseta de materiales)	1 día	mar 12/3/24	mar 12/3/24	3	0.12 %	3,829.35					


Project: REMODELACION EDIFICIO
Date: mar 30/7/24

Task	Summary	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	External Milestone	Critical Split
Split	Project Summary	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Deadline	Progress
Milestone	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	External Tasks	Critical	Manual Progress

BRACG

CRONOGRAMA DE EJECUCION ACUEDUCTO PARTIDO TRAMO G

1 mayo 21 mayo 11 junio 1 julio 21 julio 11 agosto 1 septiembre 21 septiembre 11 octubre 1 noviembre 21 noviembre

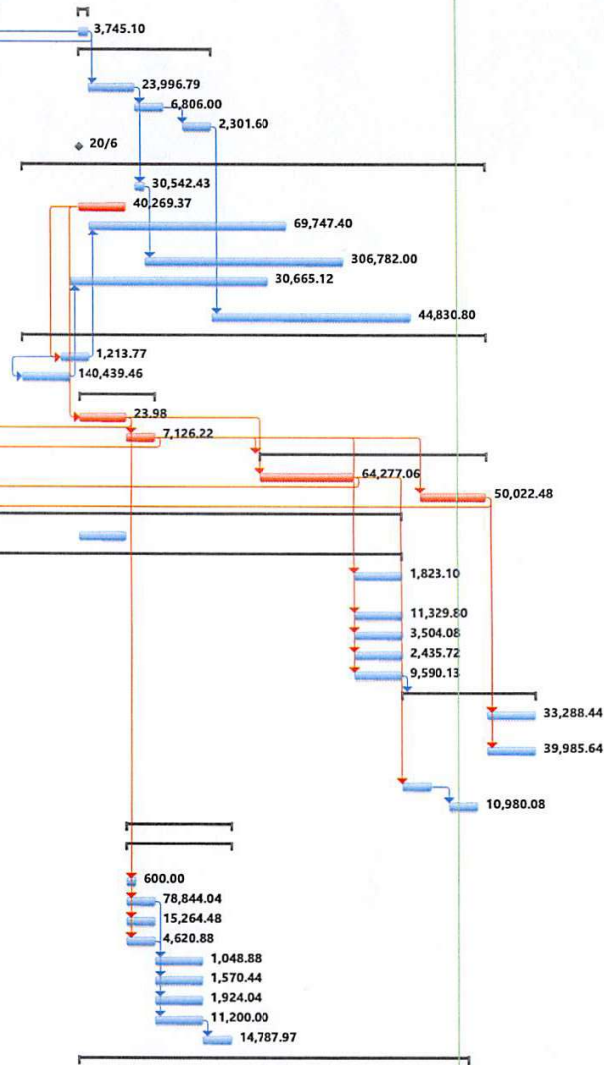


Project: REMODELACION EDIFICIO
Date: mar 30/7/24

Task	Summary	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	External Milestone	Critical Split
Split	Project Summary	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Deadline	Progress
Milestone	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	External Tasks	Critical	Manual Progress

RMAAG

CRONOGRAMA DE EJECUCION ACUEDUCTO PARTIDO TRAMO G

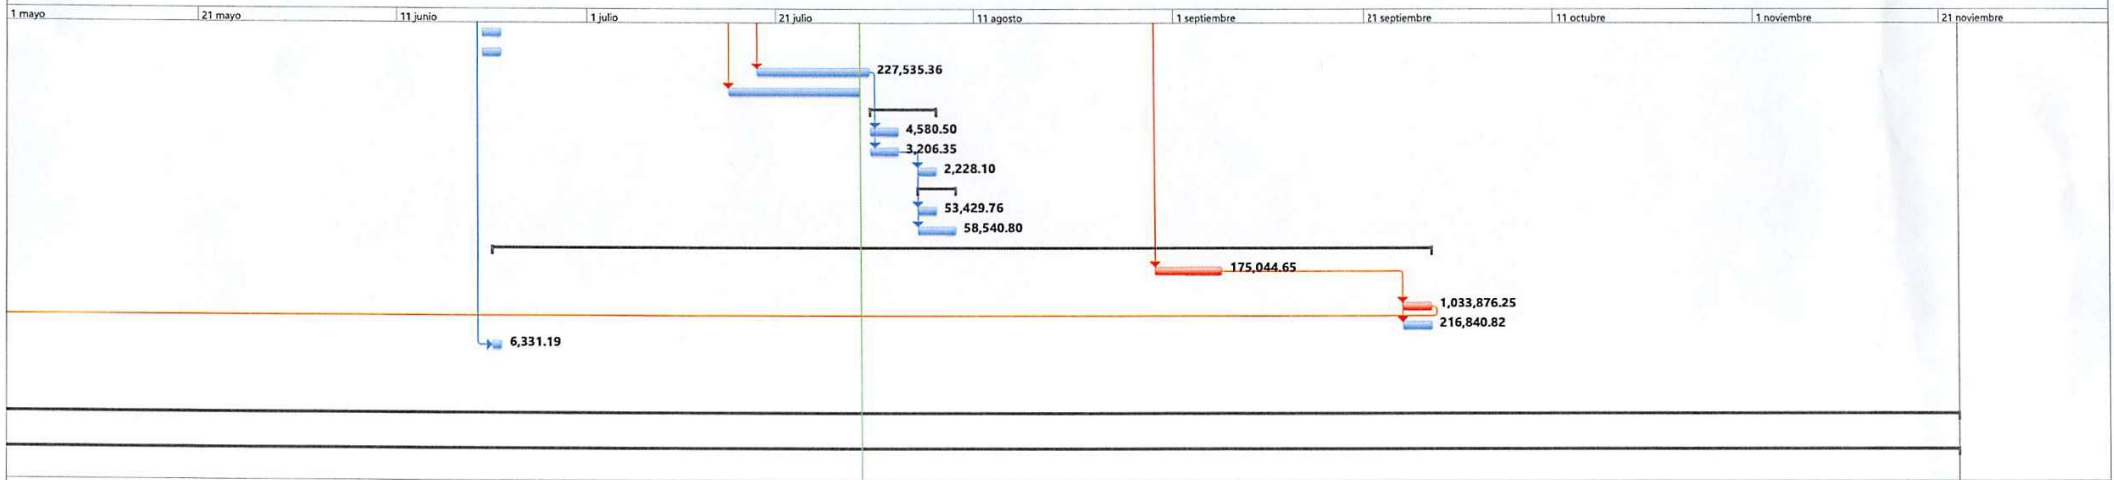


Handwritten signature in blue ink.

Project: REMODELACION EDIFICIO
Date: mar 30/7/24

Task	Summary	Inactive Milestone	Duration-only	Start-only	External Milestone	Critical Split
Split	Project Summary	Inactive Summary	Manual Summary Rollup	Finish-only	Deadline	Progress
Milestone	Inactive Task	Manual Task	Manual Summary	External Tasks	Critical	Manual Progress

CRONOGRAMA

Adicionales - Equilibrio Economico Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón, Zona I. No. SNIP 14766 lote H- Red De Distribucion Sector Partido.

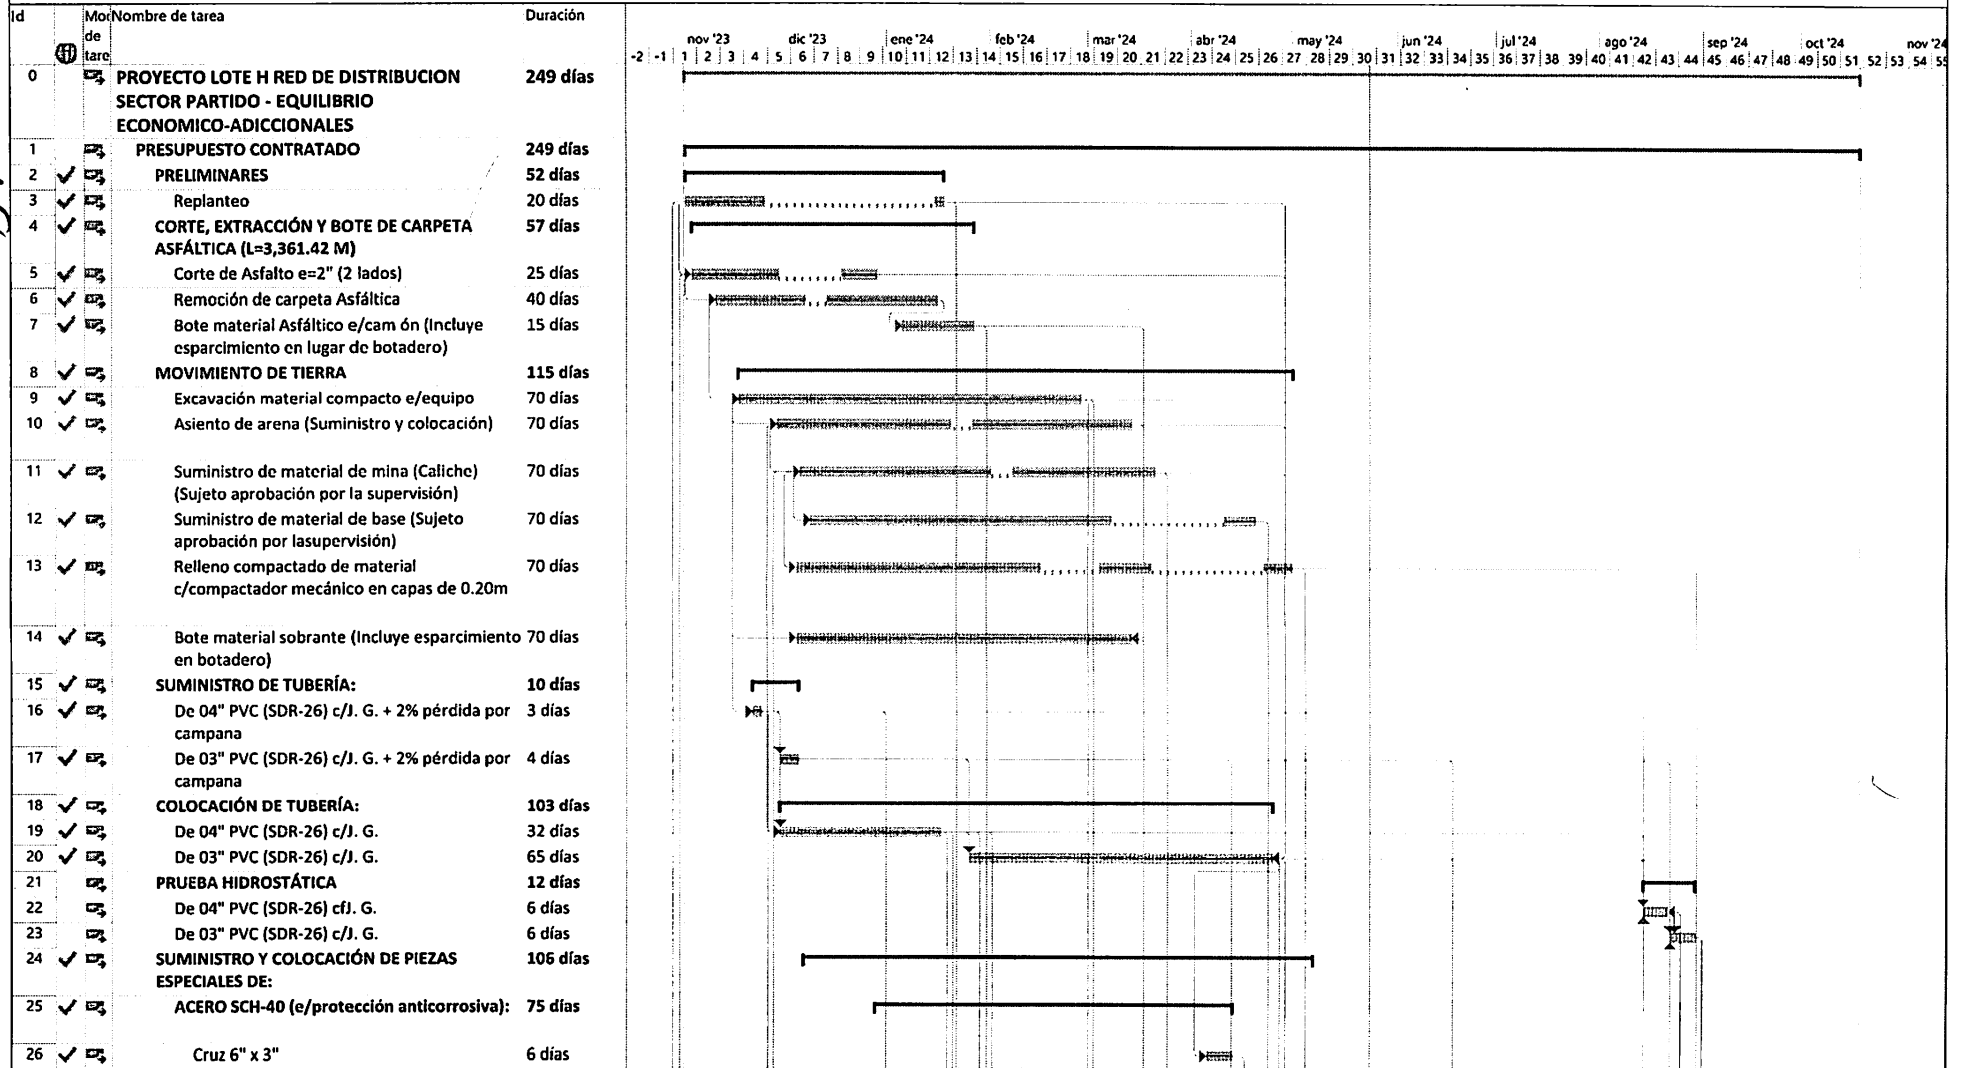


Proyecto: PROYECTO LOTE H R
Fecha: vie 24/5/24

Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Hito de línea base	
División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite		Resumen de línea base	
Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas		Progreso	
Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Línea base			

CRONOGRAMA

Adicionales - Equilibrio Economico Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón, Zona I. No. SNIP 14766 lote H- Red De Distribucion Sector Partido.

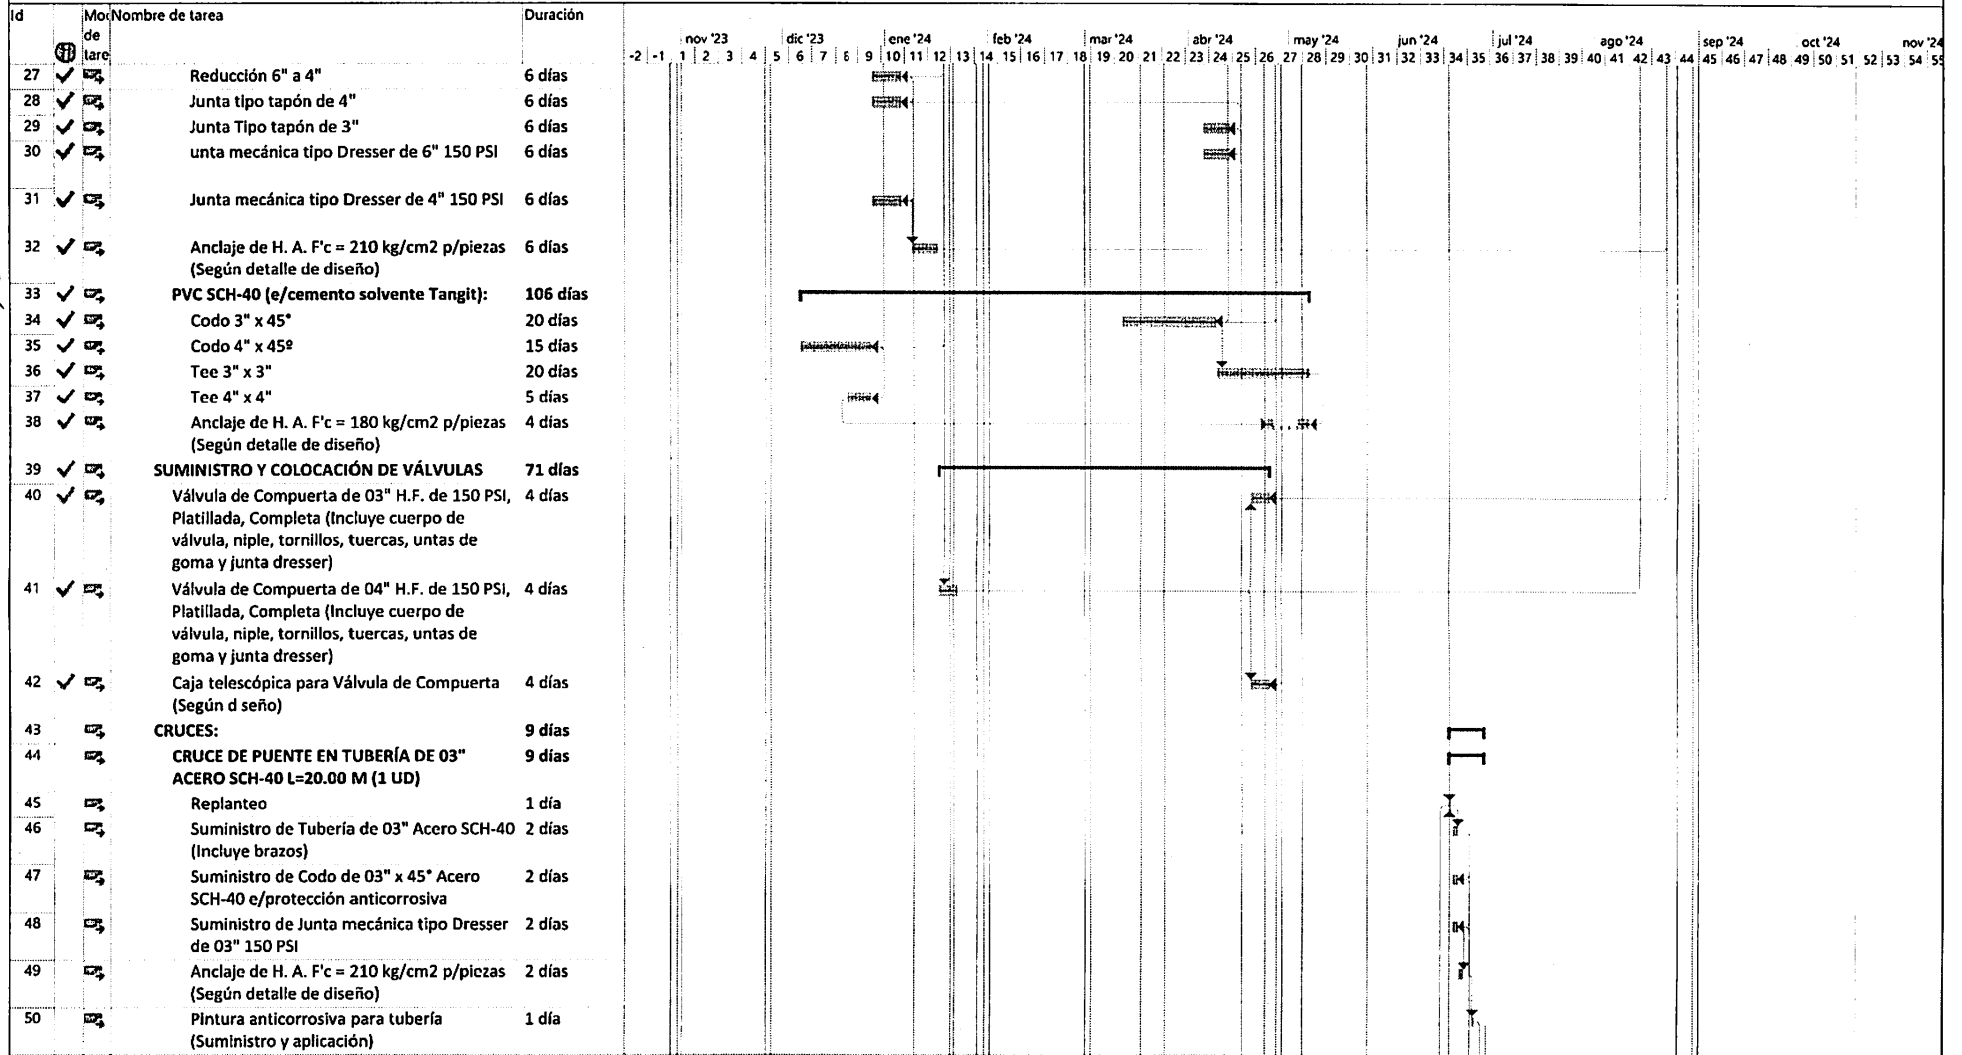

Proyecto: PROYECTO LOTE H R
Fecha: vie 24/5/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto

Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración


Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas

Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Línea base

Hito de línea base
Resumen de línea base
Progreso
Progreso manual

CRONOGRAMA

Adicionales - Equilibrio Economico Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón, Zona I. No. SNIP 14766 lote H- Red De Distribucion Sector Partido.

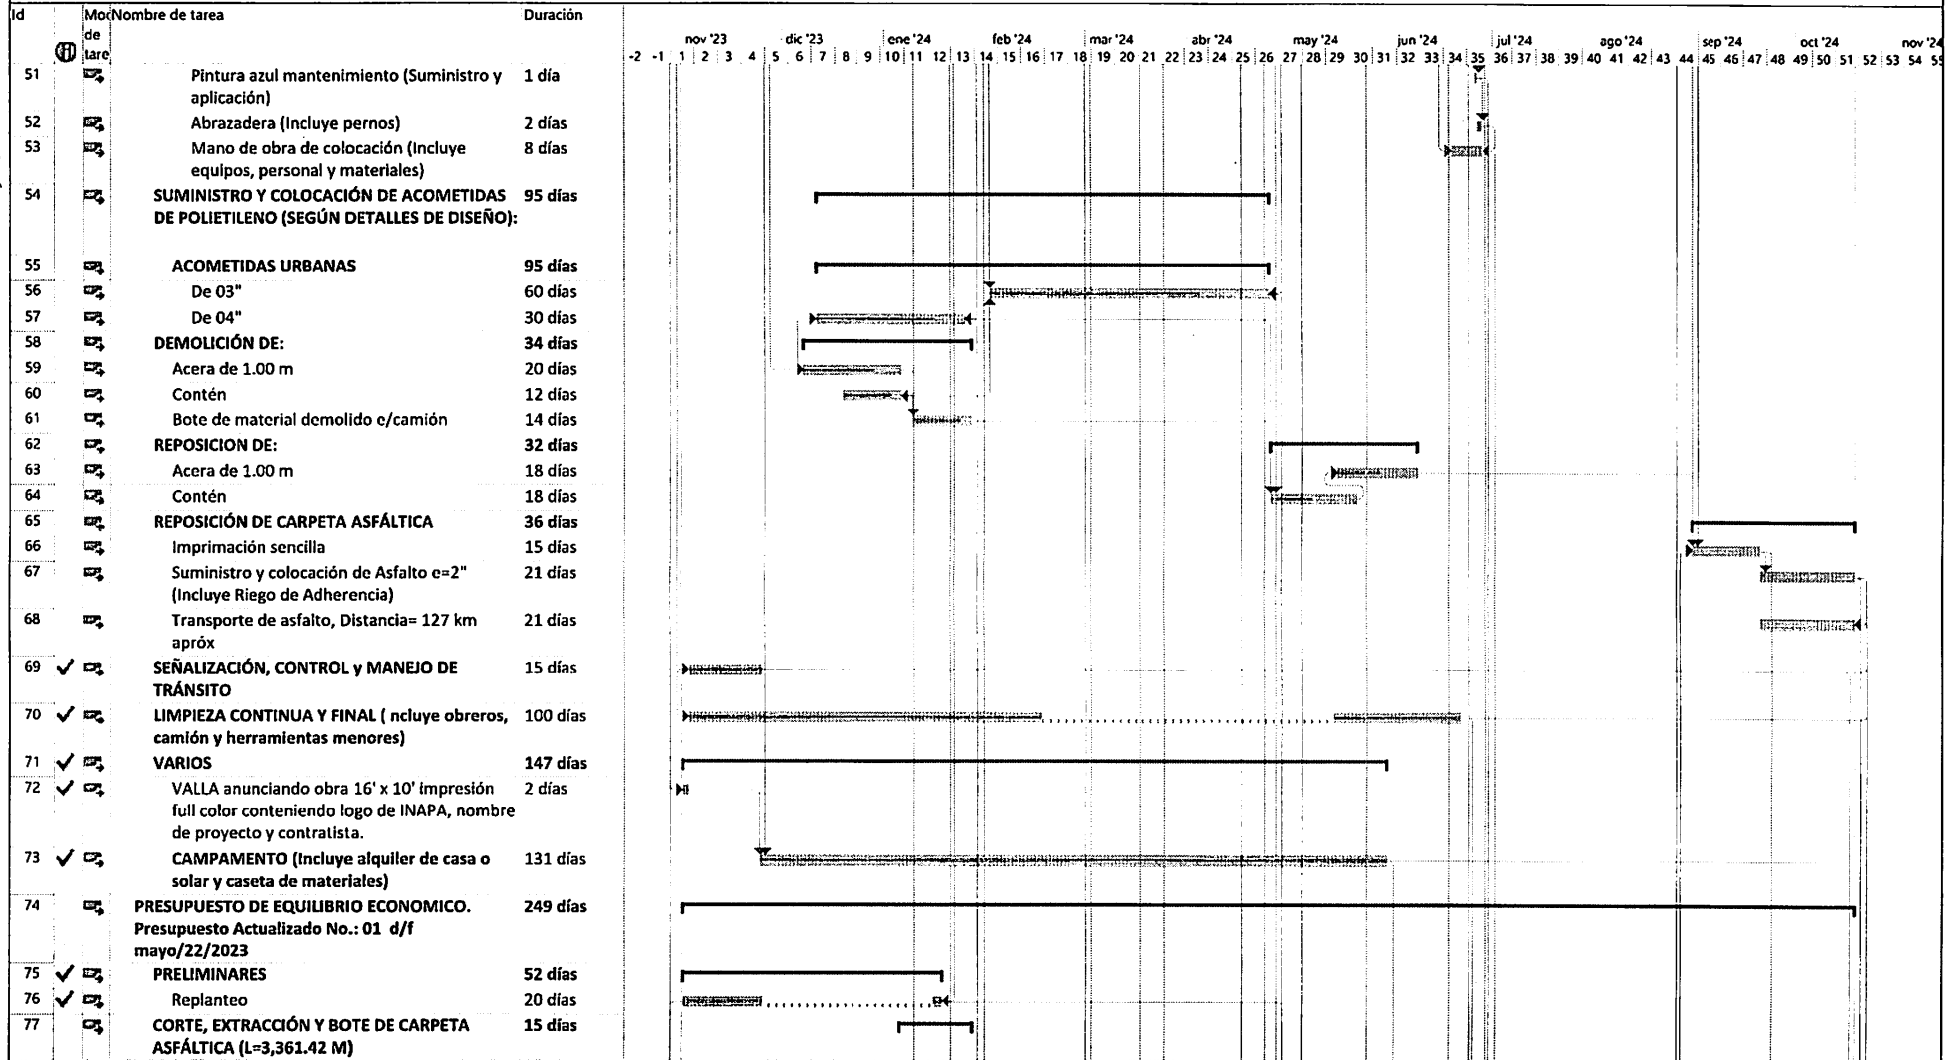


Proyecto: PROYECTO LOTE H R Fecha: vie 24/5/24	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Hito de línea base
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha limite		Resumen de línea base
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas criticas		Progreso
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División critica		Progreso manual
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Línea base		Línea base

CRONOGRAMA

Adicionales - Equilibrio Economico Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón, Zona I. No. SNIP 14766 lote H- Red De Distribucion Sector Partido.


Y.J.F.

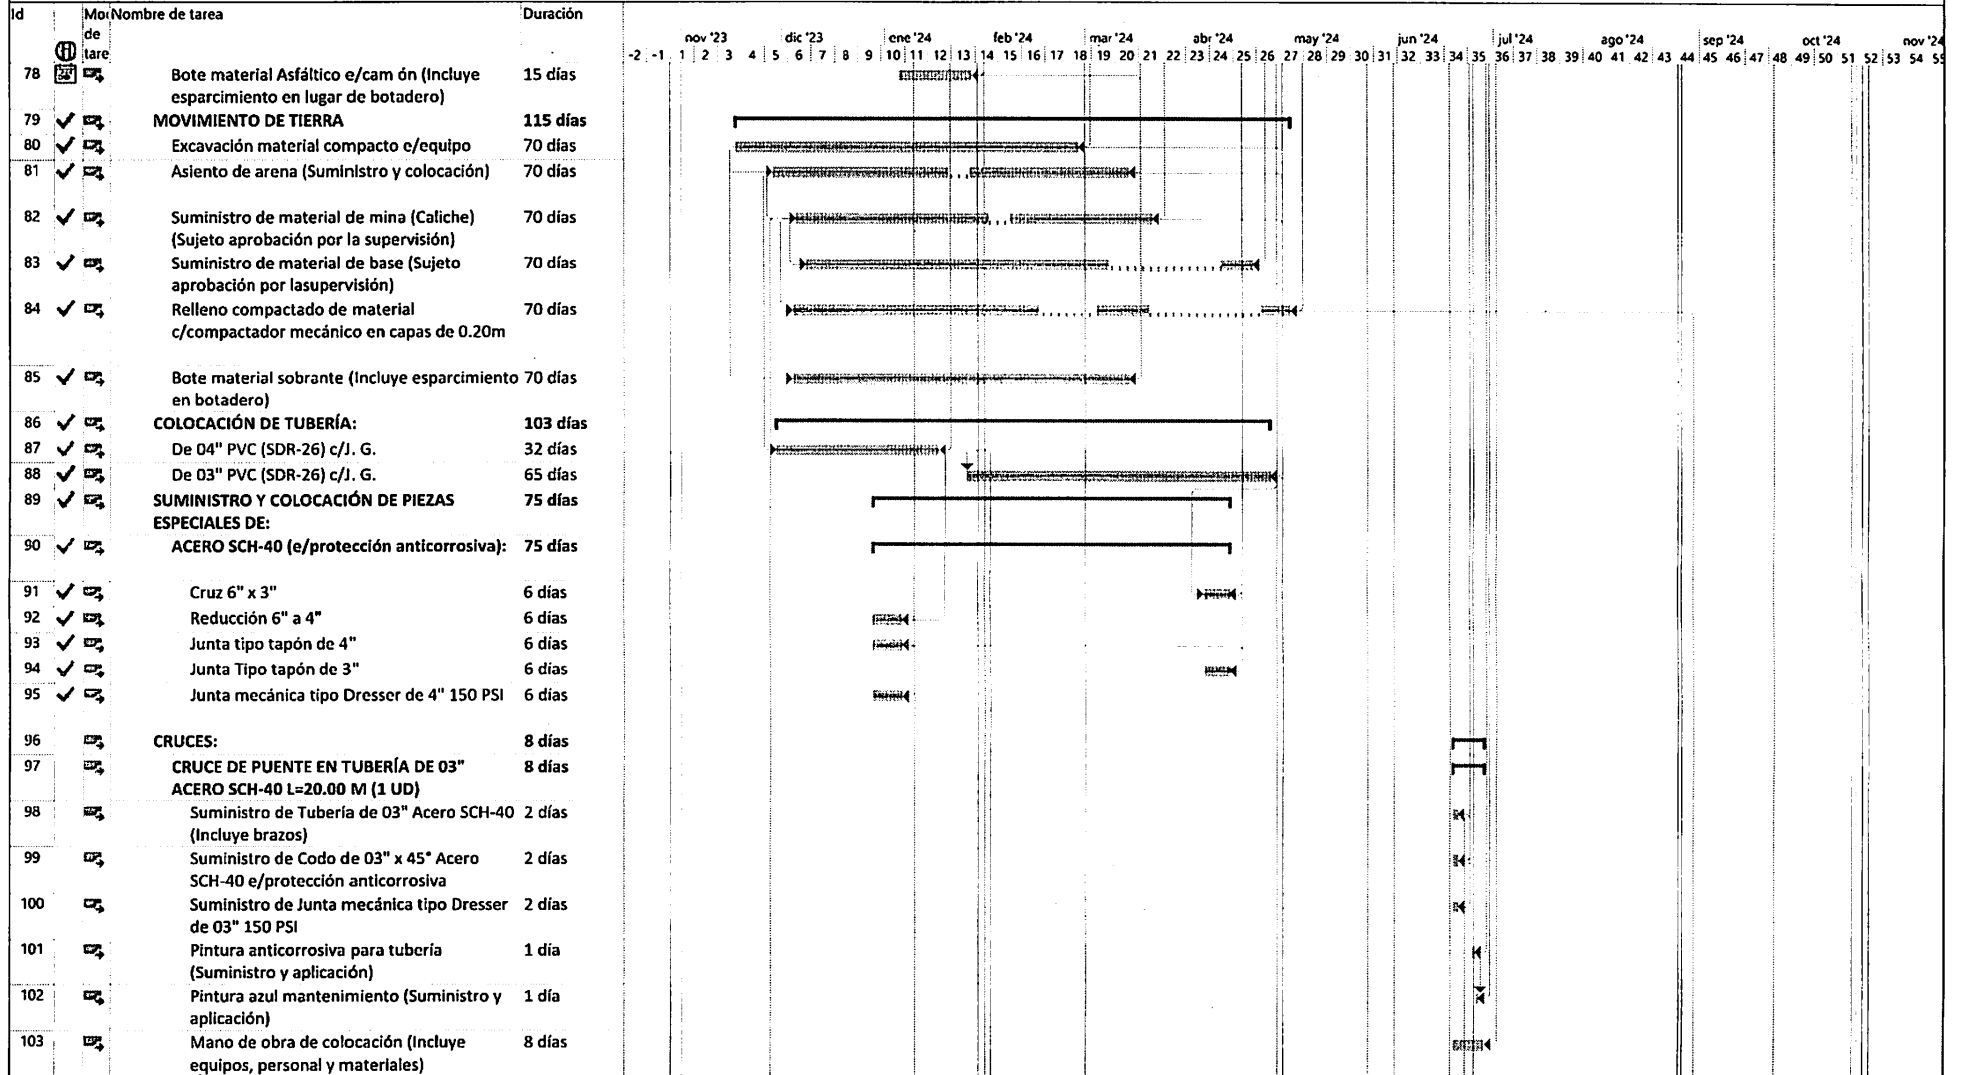

Proyecto: PROYECTO LOTE H R Fecha: vie 24/5/24	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Hito de línea base	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha limite		Resumen de línea base	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas criticas		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		División critica		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duracion		Tareas externas		Línea base			

CRONOGRAMA

Adicionales - Equilibrio Economico Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón, Zona I. No. SNIP 14766 lote H- Red De Distribucion Sector Partido.

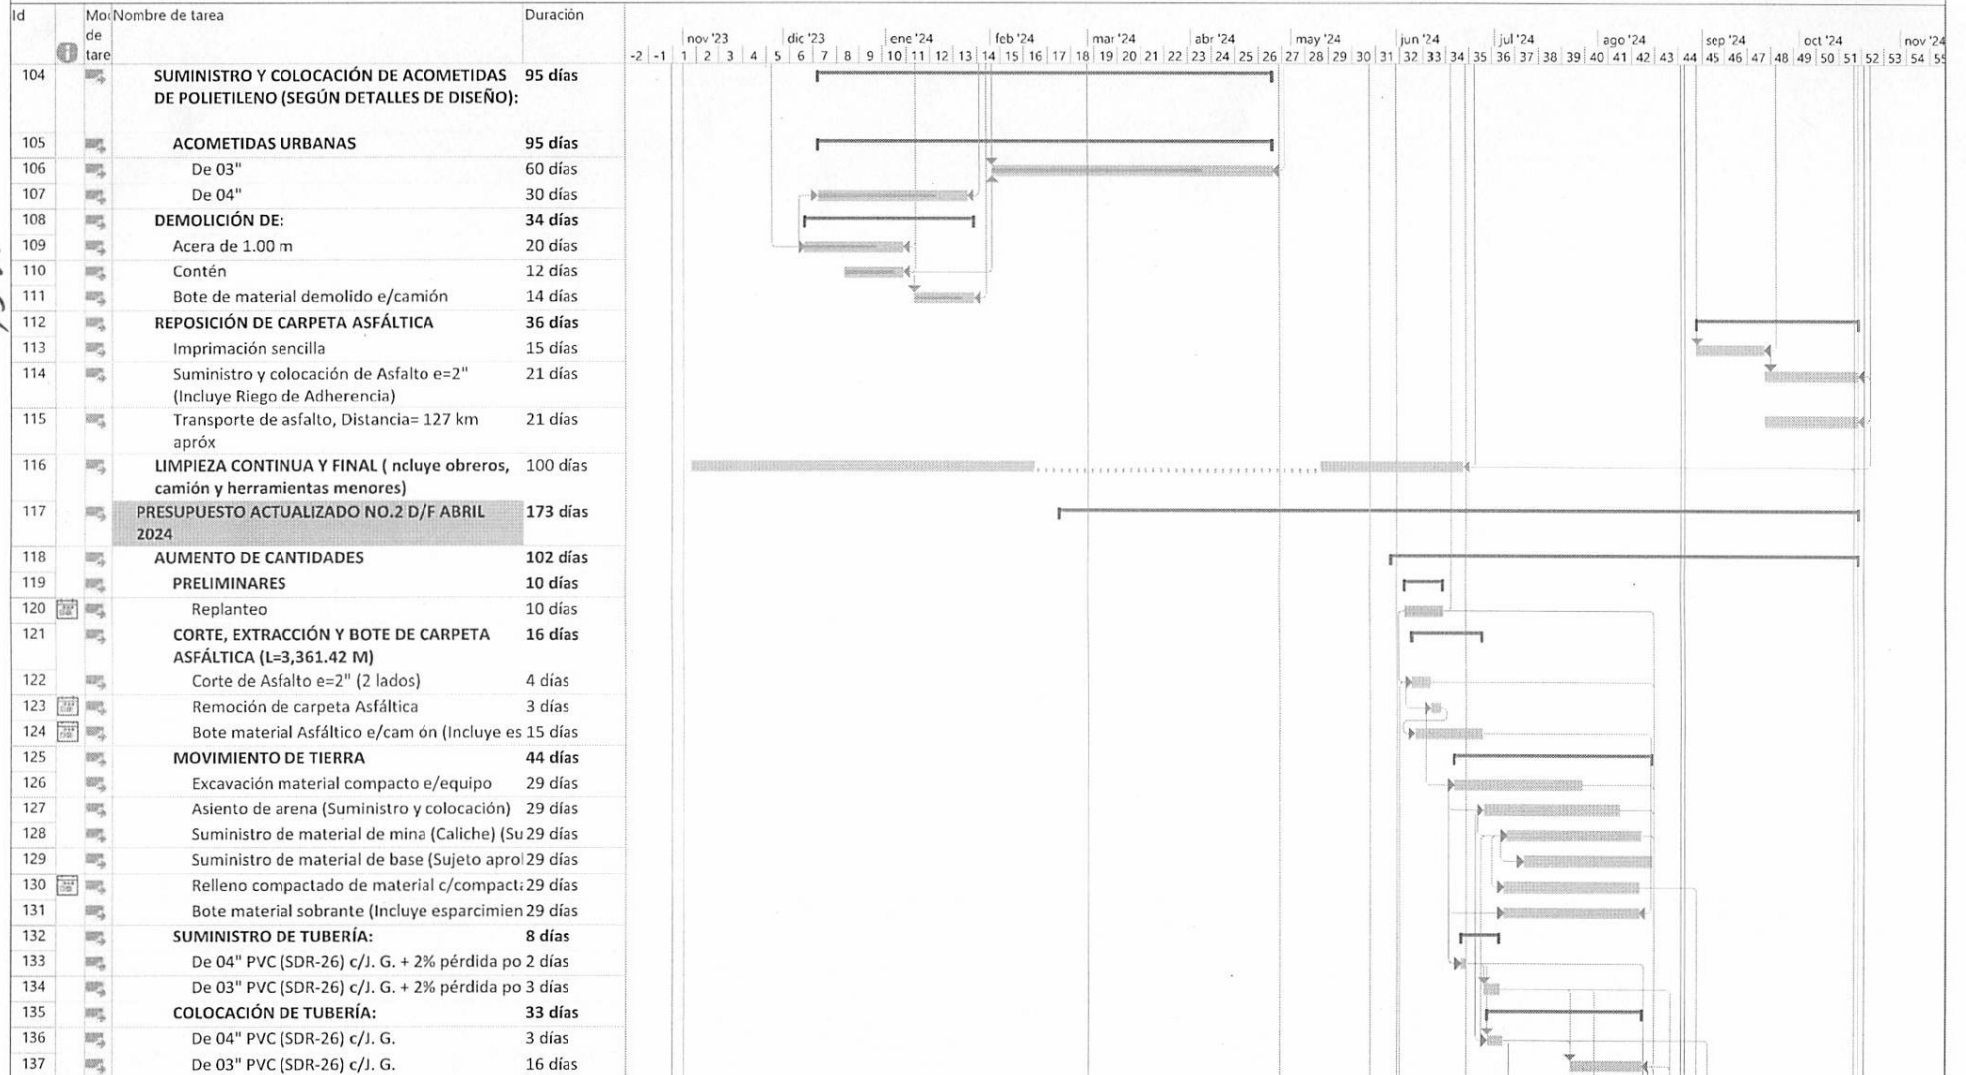


Proyecto: PROYECTO LOTE H R
Fecha: vie 24/5/24

Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Hito de línea base	
División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha limite		Resumen de línea base	
Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas criticas		Progreso	
Resumen		Tarea manual	solo fin		División critica		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Línea base			

CRONOGRAMA

Adicionales - Equilibrio Economico Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón, Zona I. No. SNIP 14766 lote H- Red De Distribucion Sector Partido.

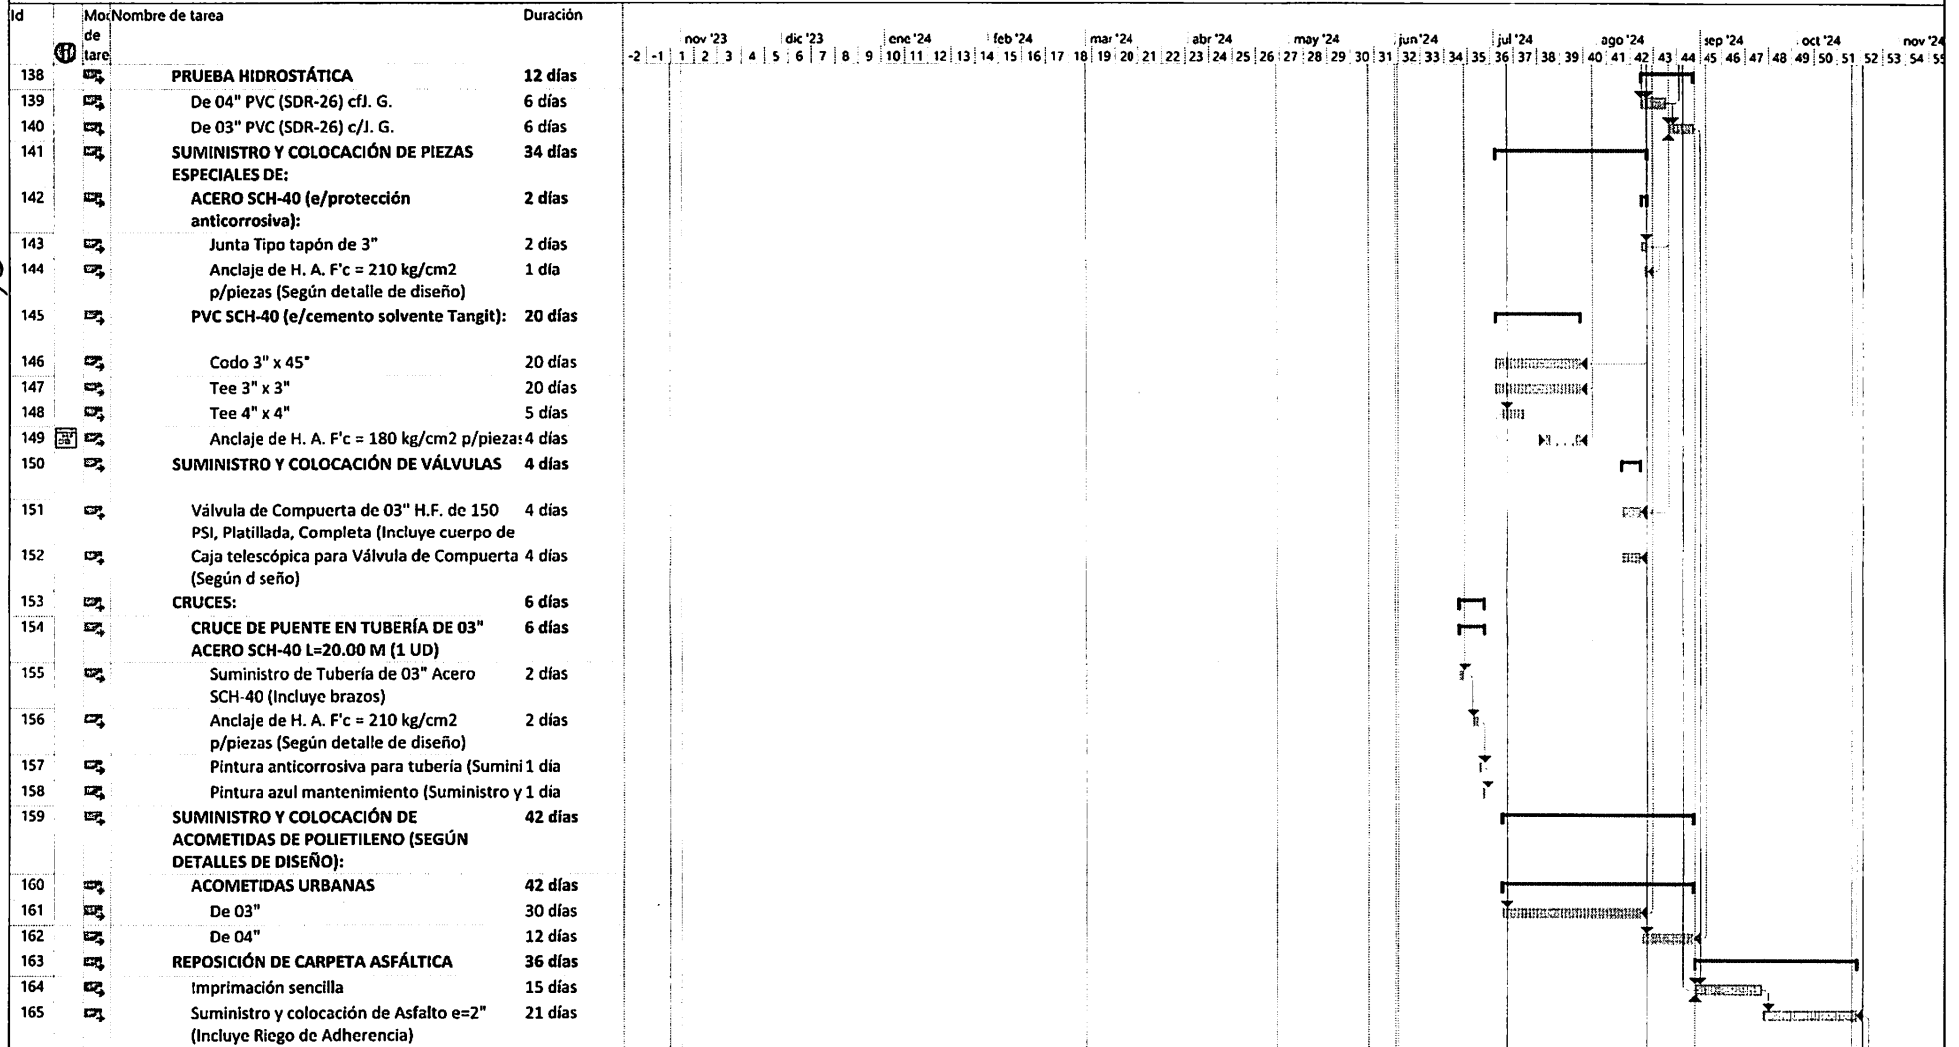


Proyecto: PROYECTO LOTE H R
Fecha: vie 24/5/24

Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Hito de línea base	
División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite		Resumen de línea base	
Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas		Progreso	
Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Línea base			

CRONOGRAMA

Adicionales - Equilibrio Economico Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón, Zona I. No. SNIP 14766 lote H- Red De Distribucion Sector Partido.

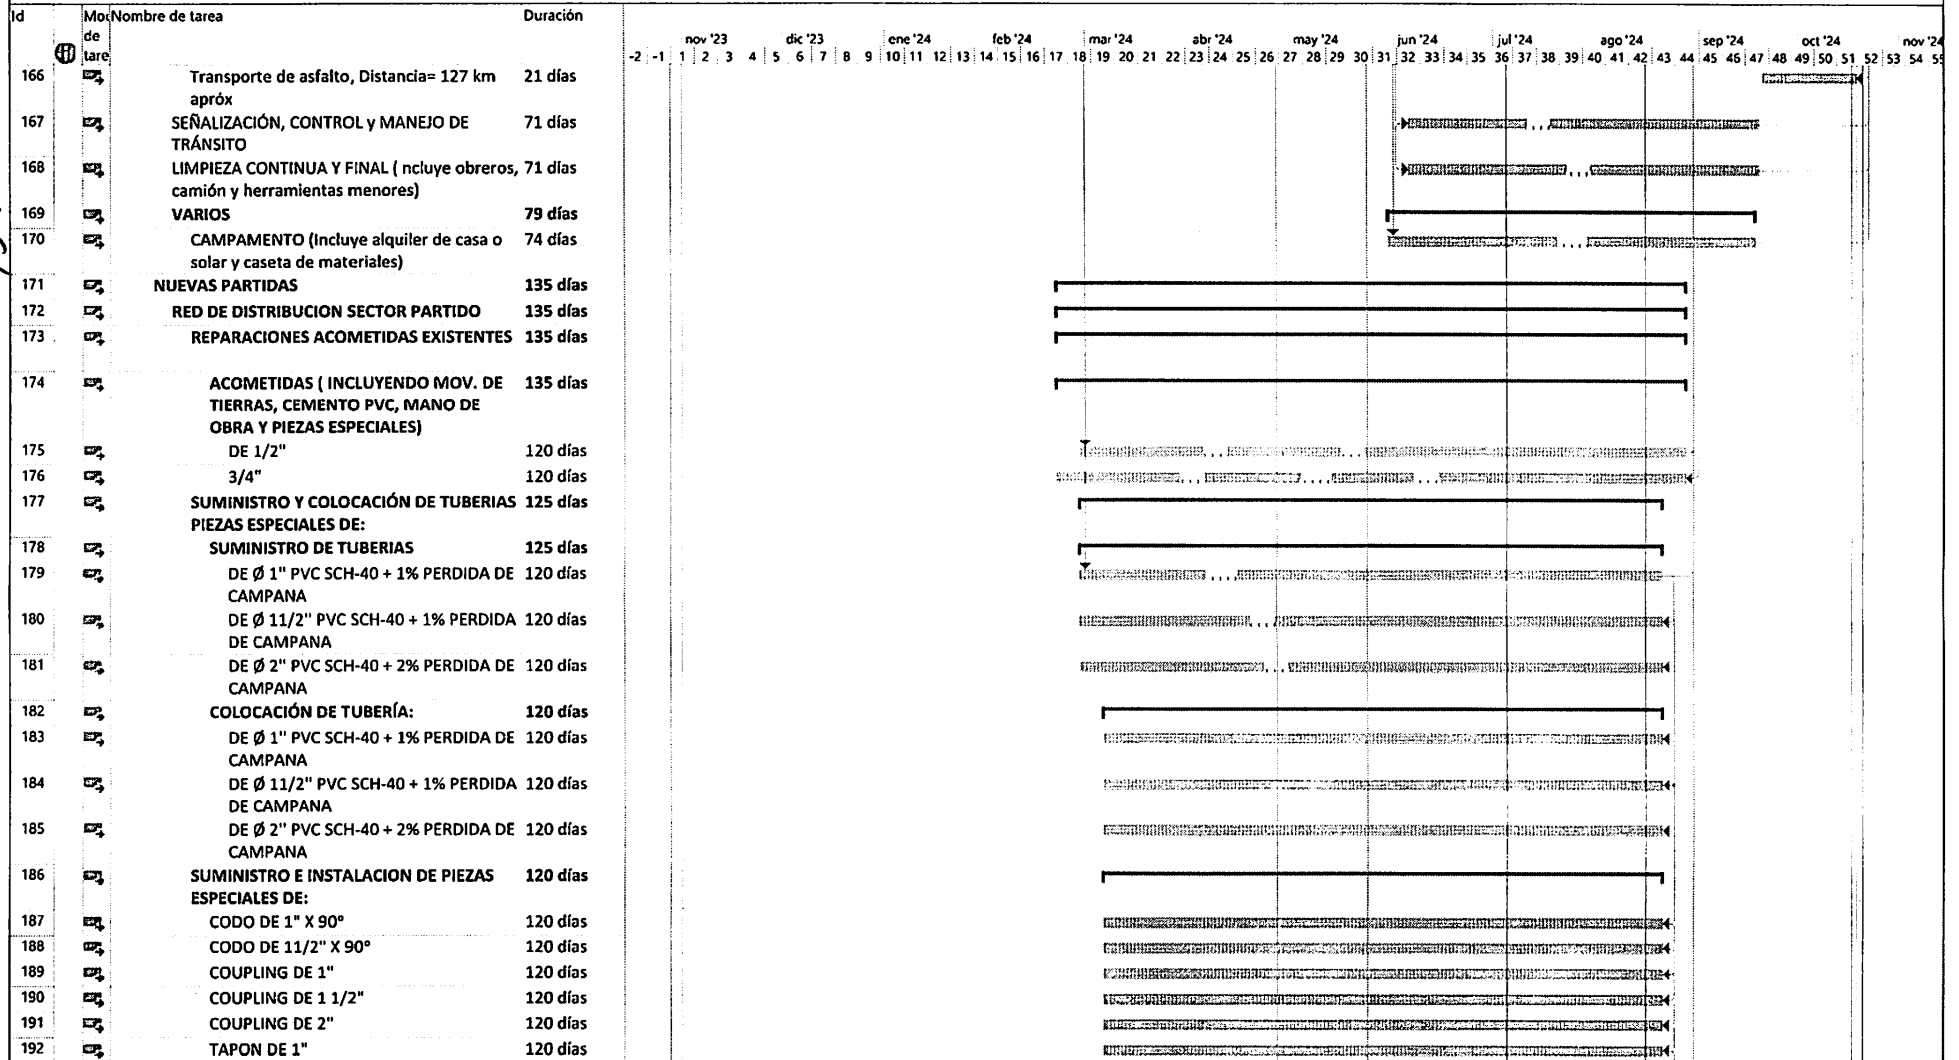


Proyecto: PROYECTO LOTE H R
Fecha: vie 24/5/24

Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Hito de línea base	
División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite		Resumen de línea base	
Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas		Progreso	
Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Línea base			

CRONOGRAMA

Adicionales - Equilibrio Economico Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón, Zona I. No. SNIP 14766 lote H- Red De Distribucion Sector Partido.

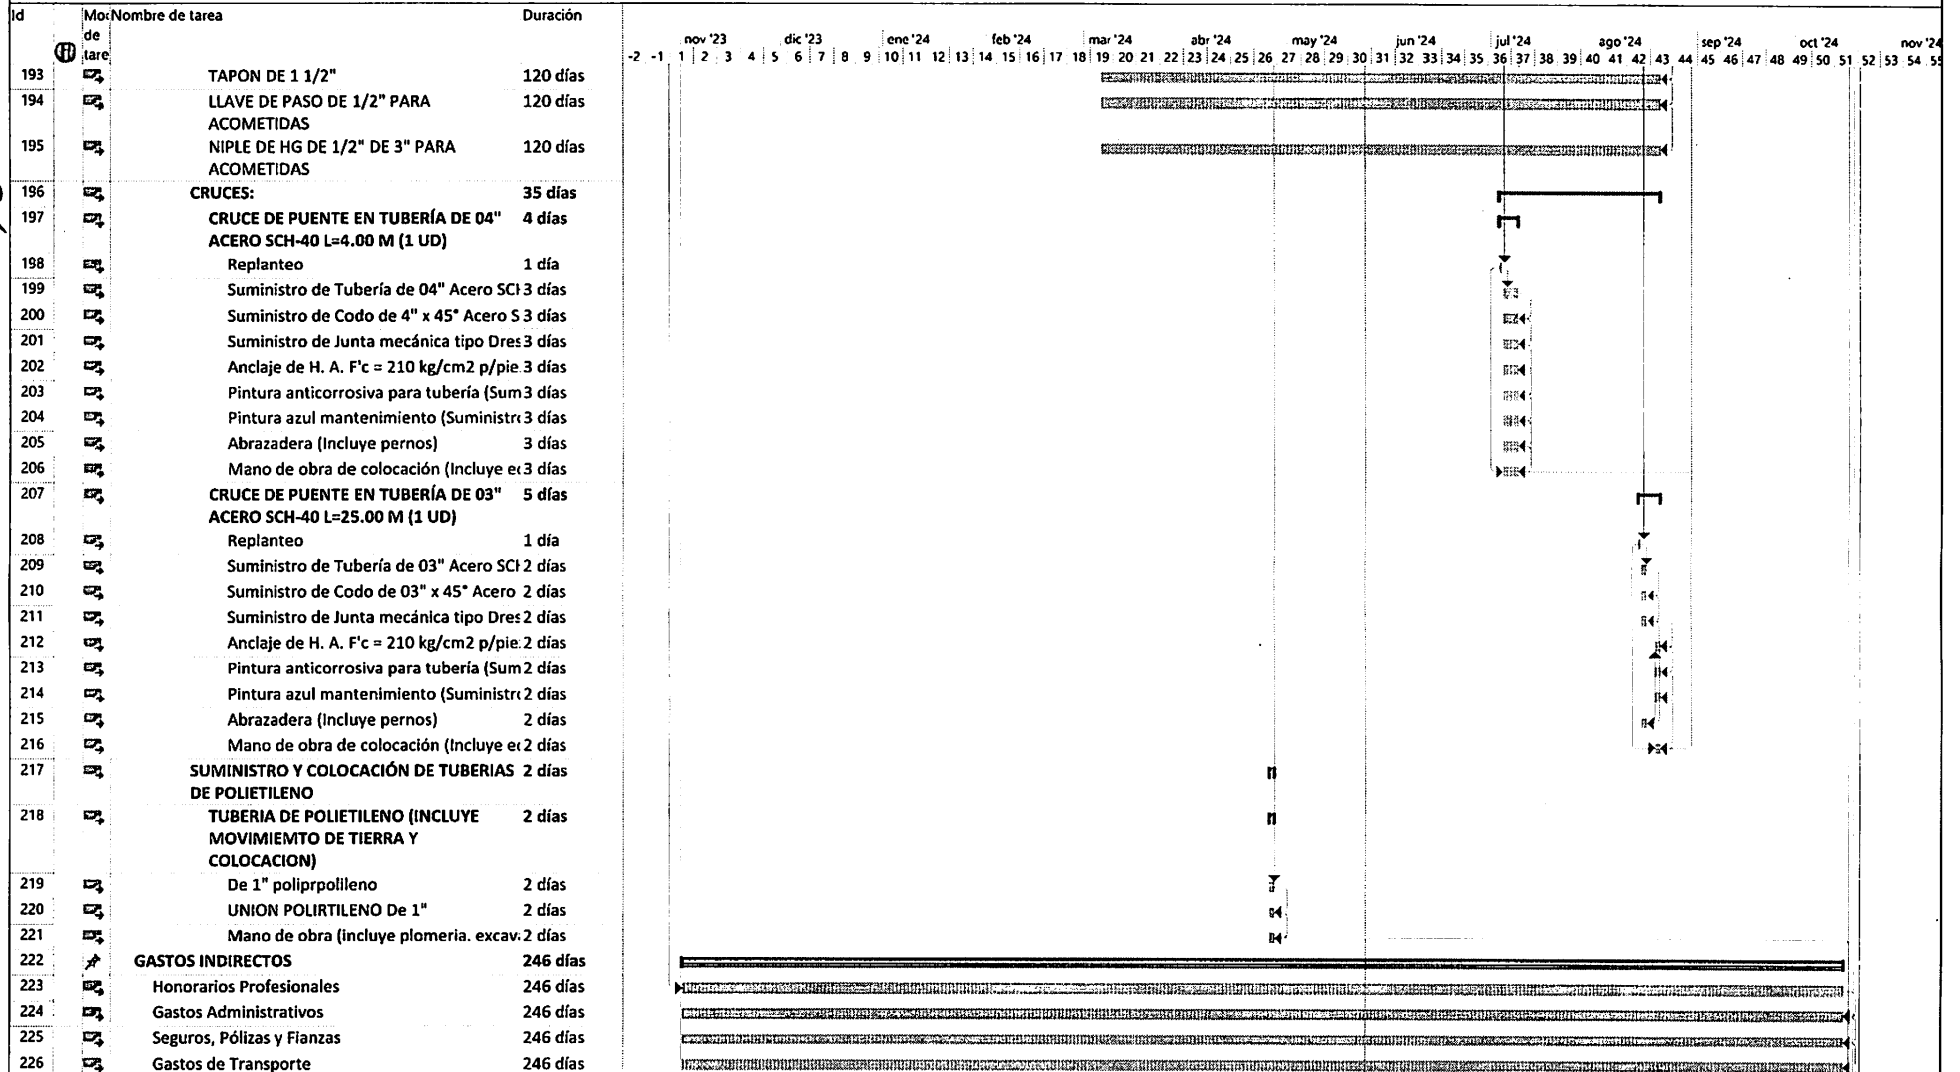

Proyecto: PROYECTO LOTE H R Fecha: vie 24/5/24	Tarea		Tarea inactiva	Informe de resumen manual		Hito externo		Hito de línea base	
	División		Hito inactivo	Resumen manual		Fecha límite		Resumen de línea base	
	Hito		Resumen inactivo	solo el comienzo		Tareas críticas		Progreso	
	Resumen		Tarea manual	solo fin		División crítica		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración	Tareas externas		Línea base			

Adicionales - Equilibrio Economico Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Provincia Dajabón, Zona I. No. SNIP 14766 lote H- Red De Distribucion Sector Partido.

Yours Truly,

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo		Hito de línea base	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite		Resumen de línea base	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Tareas críticas		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		División crítica		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas		Línea base			

Presupuesto Equilibrio Economico Red de Distribucion Sector Mata Tuna

Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2024				2025			
				M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	
INICIO	0 días	18/09/2024	18/09/2024			18/09					
RED DE DISTRIBUCION SECTOR MATA DE TUNA	368 días	18/09/2024	18/08/2025								
PRELIMINARES	120 días	18/09/2024	13/01/2025								
Replanteo	120 días	18/09/2024	13/01/2025			18/09	13/01				
MOVIMIENTO DE TIERRA	280 días	25/11/2024	31/08/2025								
Excavación material compacto c/equipo	90 días	25/11/2024	22/02/2025			25/11	22/02				
Asiento de arena (Suministro y colocación)	150 días	05/03/2025	01/08/2025				05/03			01/08	
Suministro de material de mina (Caliche) (Sujeto aprobación por la supervisión)	150 días	05/03/2025	01/08/2025				05/03			01/08	
Relleno compactado de material c/compactador mecanico en capas de 0.20m b	120 días	04/05/2025	31/08/2025					04/05		31/08	
Bote material sobrante (Incluye esparcimiento en botadero)	120 días	04/05/2025	31/08/2025					04/05		31/08	
SUMINISTRO DE TUBERÍA:	120 días	23/02/2025	22/08/2025								
De 06 PVC (SDR-26) C, G. + 3% pérdida por campana	120 días	23/02/2025	22/08/2025				23/02		22/08		
COLOCACIÓN DE TUBERÍA:	120 días	04/04/2025	01/08/2025								
De 06 PVC (SDR-26) J G+3 % de Perdida por campana	120 días	04/04/2025	01/08/2025				04/04		01/08		
PRUEBA HIDROSTATICA S1 De 06 PVC (SDR-26) J. G	30 días	18/08/2025	18/09/2025								
De 06 PVC (SDR-26) J G	30 días	18/08/2025	18/09/2025						18/08	18/09	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE:	16 días	02/08/2025	17/08/2025								
ACERO SCH-40 (c/protección anticorrosiva):	6 días	02/08/2025	07/08/2025								
Codo 6 x 35	5 días	02/08/2025	08/08/2025						02/08	08/08	
Codo 6 x 15	5 días	02/08/2025	08/08/2025						02/08	08/08	
Junta mecanica tipo Dresser de 6 150 PSI	5 días	02/08/2025	08/08/2025						02/08	08/08	
Anclaje de H. A Fc-210 kg/cm p/piezas (Según detalle de diseño)	6 días	02/08/2025	07/08/2025						02/08	07/08	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS	10 días	08/08/2025	17/08/2025								
Válvula de Compuerta de 04 HF de 150 PSI Platilada Completa (Incluye cuerpo de válvula, niple, tornillos tuercas juntas de goma y junta dresser	5 días	08/08/2025	12/08/2025						08/08	12/08	
Caja telescópica para Válvula de Compuerta (Segon diseño)	5 días	13/08/2025	17/08/2025						13/08	17/08	
CRUCES:	22 días	02/08/2025	23/08/2025								
CRUCE DE PUENTE EN TUBERIA DE 06 ACERO SCH-40) L-20.00 M (1 UD)	22 días	02/08/2025	23/08/2025								



Handwritten signature

Presupuesto Equilibrio Economico Red de Distribucion Sector Mata Tuna

2 de 2

Task Name	Duración	Comienzo	Fin	2024								2025							
				m2	m3	m4	m1	m2	m3	m4	m1	m2	m3	m4	m1	m2	m3	m4	m1
Replanteo	1 día	02/08/2025	02/08/2025										02/08	02/08					
Suministro de Tubería de Ø6" de Acero (Incluye brazos)	4 días	03/08/2025	06/08/2025										03/08	06/08					
Suministro de Codo de Ø6" x 45" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva	4 días	07/08/2025	10/08/2025										07/08	10/08					
Suministro de Junta mecánica tipo Dresser de Ø6" 150 PSI	4 días	11/08/2025	14/08/2025										11/08	14/08					
Andaje de HA Fc-210 kg/cm piezas (Según detalle de diseño)	3 días	15/08/2025	17/08/2025										15/08	17/08					
Pintura anticorrosiva para tubería (Suministro y aplicación)	1 día	18/08/2025	18/08/2025										18/08	18/08					
Pintura azul mantenimiento (Suministro y aplicación)	1 día	19/08/2025	19/08/2025										19/08	19/08					
Abrazadera (Incluye pemos)	1 día	20/08/2025	20/08/2025										20/08	20/08					
Mano de obra de colocación (Incluye equipos, personal y materiales)	3 días	21/08/2025	23/08/2025										21/08	23/08					
SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRANSITO (Incluye letreros con base, conos retráctiles, cinta de peligro mata de seguridad naranja, tariques de 55 Gls pintados amarillo trafico con cinta fumínica, pasarelas de madera y hombres con banderolas, chacheos)	350 días	16/09/2024	31/08/2025		16/09									31/08					
LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	350 días	16/09/2024	31/08/2025		16/09									31/08					
VARIOS	2 días	16/09/2024	17/09/2024		16/09														
1 VALLA anunciando obra 16' x 10' Impresión full color conteniendo logo de INA	2 días	16/09/2024	17/09/2024		16/09	17/09													
CAMPAMENTO (Incluye alquiler de casa o solar y caseta de materiales)	2 días	18/09/2024	19/09/2024		18/09	19/09													
FIN DEL PROYECTO	0 días	16/09/2025	16/09/2025											16/09					



[Handwritten signature]

Task	Roll Up Critical Task	Project Summary	solo duración	Tareas externas
Critical Task	Roll Up Milestone	Group By Summary	Informe de resumen manual	Hito externo
Milestone	Roll Up Progress	Hito inactivo	Resumen manual	Progreso
Summary	Split	Resumen inactivo	solo el comienzo	Deadline
Roll Up Task	External Tasks	Tarea manual	solo fin	

CRONOGRAMA DE EJECUCION

Contratista : Ing. Maritza J. Adonis T.

Contrato No. 107/2022

Presupuesto de Equilibrio Actualizado



90

90

90

90

90

90

CRONOGRAMA DE EJECUCION	
-------------------------	--

Contratista : Ing. Maritza J. Adonis T.

Contratista : Ing. Maritza J. Adonis T.	Contrato No. 107/2022
--	------------------------------

Contratista : Ing. Maritza J. Adonis T.	Contrato No. 107/2022	Presupuesto de Equilibrio Actualizado
--	------------------------------	--

[illegible]

4/4

PROYECTO :Obra: Ampliación Acueducto Múltiple Partido - La Gorra, Prov. Dajabón, Zona I. No. SNIP 14766 - Lote L- Red De Distribucion Sector Los Babosos.


FLUJOGRAMA


Contratista : Ing. Maritza J. Adonis T.

Contrato No. 107/2022

Presupuesto de Equilibrio Actualizado

MONTO CONTRATO .RD\$	8,759,029.26
MONTO EQUILIBRIO...RD\$	2,096,414.35

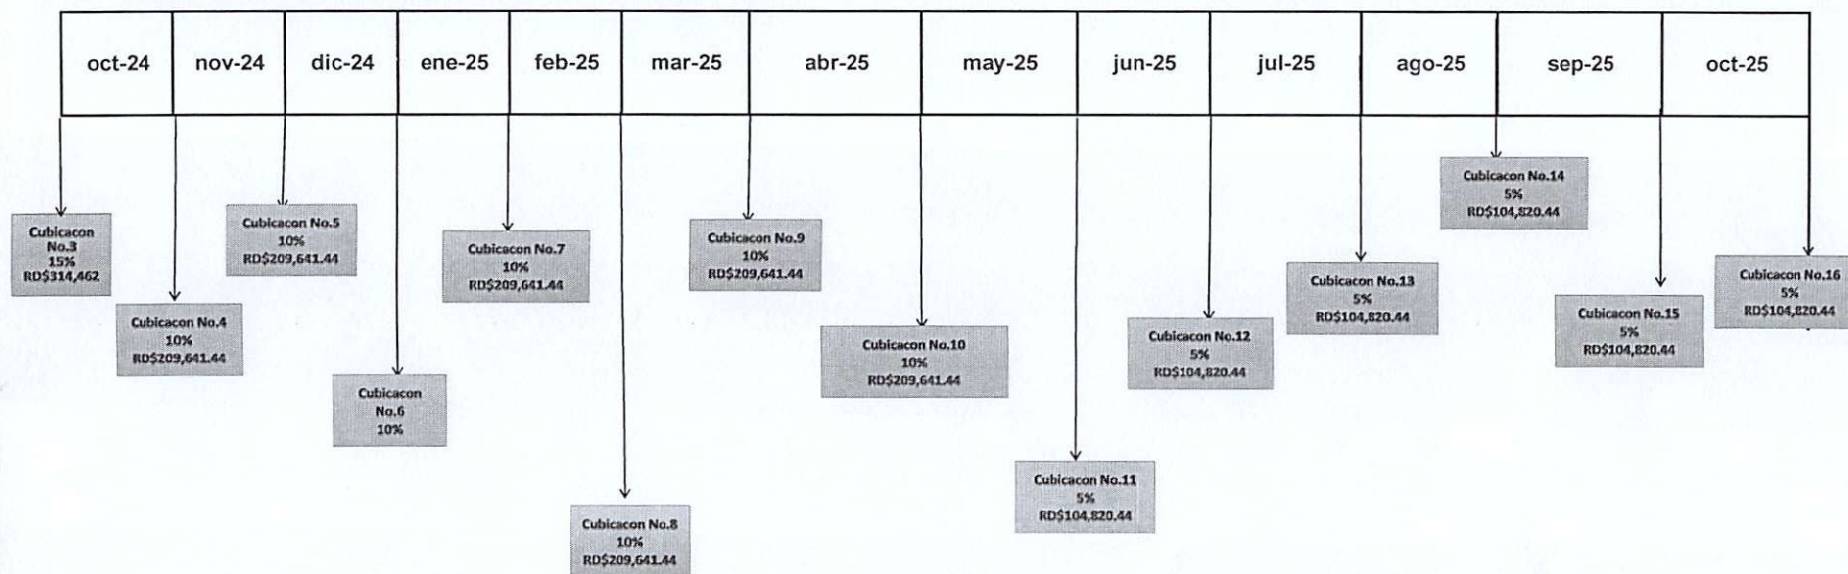


Ing.  **ING. MARITZA J. ADONIS T.**
CONTRATISTA

FECHA DE ELABORACION

[PROYECTO]

CRONOGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION ACUEDUCTO
MULLTIPLS PARTIDO- LA GORRA. DAJABON. ZONA I N° SNIP 147966-LÑOTE M.
RED DE DISTRIBUCUION. SECTOR SANGRE LINDA.

REALIZADO POR:



ING. CARLOS JULIO PEREZ
CEDULA: 018-0025583-6

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Qtr 4, 2023			Qtr 1, 2024			Qtr 2, 2024			Qtr 3, 2024			Qtr 4, 2024			Qtr 1, 2025			
					Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb		
1	1	Acueducto Mulp Sangre Linda-Lote M. Dajabon	300 days	Sat 28/10/23	Acueducto Mulp Sangre Linda-Lote M. Dajabon																		28/12
2	1.1	Inicio del Proyecto	0 days	Sat 28/10/23	CODIA: 28236																		
3	1.2	Trabajos Preliminares	3 days	Tue 14/11/23	Trabajos Preliminares 14/11 14/11																		
4	1.2.1	Replanteo	3 days	Tue 14/11/23	14/11 14/11																		
5	1.3	Corte de Extracion y Bole de Carpeta Asfaltica (Long =	23 days	Mon 30/10/23	Corte de Carpeta Asfaltica (Long = 2815.17) 1/11 29/11																		
6	1.3.1	Corte de Asfalto 6" (2	10 days	Mon 30/10/23	30/10 10/11																		
7	1.3.2	Remocion de Carpeta Asfaltica	10 days	Mon 13/11/23	13/11 24/11																		
8	1.3.3	Bole de Material Asfaltico c/ camion Incluye Esparcimiento en lugar de Boladero)	3 days	Mon 27/11/23	27/11 29/11																		
9	1.4	Movimiento de Tierra	36 days	Tue 28/11/23	Movimiento de Tierra 28/11 12/1																		
10	1.4.1	Excavacion de Material c/ equipo	12 days	Tue 5/12/23	5/12 28/12																		
11	1.4.2	Asiento de Arena (Suministro y Colocacion)	7 days	Tue 28/11/23	28/11 5/12																		
12	1.4.3	Suministro de Material de Mina (Sujeto Aprobacion por la Supervicion)	7 days	Thu 7/12/23	7/12 15/12																		
13	1.4.4	Suministro de Material de Base, (Sujeto Aprobacion por la Supervicion)	5 days	Mon 18/12/23	18/12 22/12																		
14	1.4.5	Relleno Compactado de Material c/ compactador Mecanico en capas de 20 cm	12 days	Tue 26/12/23	26/12 11/1																		
15	1.4.6	Bole de Material Sobreante (Incluye Esparcimiento en Boladero)	5 days	Fri 12/1/24	12/1 18/1																		

ID	WBS	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Qtr-1, 2023					Qtr-2, 2024					Qtr-3, 2024					Qtr-4, 2024					Qtr-1, 2025				
						Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb								
16	1.5	EQ	Suministro de Tuberías	15 days	Wed 13/12/23																									
17	1.5.1	EQ	De ø 6" PVC) SDR-26) ø/LG=3% Pérdida de	8 days	Wed 13/12/23																									
18	1.5.2	EQ	De ø 3" PVC) SDR-26) ø/LG=2% Pérdida de	7 days	Tue 26/12/23																									
19	1.6	EQ	Colocación de Tuberías	22 days	Tue 26/12/23																									
20	1.6.1	EQ	De ø 6" PVC) SDR-26) ø/LG	10 days	Tue 26/12/23																									
21	1.6.2	EQ	De ø 3" PVC) SDR-26) ø/LG	10 days	Fri 12/1/24																									
22	1.7	EQ	Prueba Hidrostática	14 days	Fri 28/1/24																									
23	1.7.1	EQ	De ø 6" PVC) SDR-26) ø/LG	7 days	Fri 28/1/24																									
24	1.7.2	EQ	De ø 3" PVC) SDR-26) ø/LG	7 days	Tue 6/2/24																									
25	1.8	EQ	Suministro de Colocación de Placas Especiales PVC SCH -40 (Cemento Boliviano	88 days	Thu 15/2/24	Suministro de Colocación de Placas Especiales PVC SCH -40 (Cemento Boliviano Tipo g)																								
26	1.8.1	EQ	Codo 3" x 90°	6 days	Thu 15/2/24	15/2																								
27	1.8.2	EQ	Tee 3" x 3"	6 days	Fri 23/2/24	23/2																								
28	1.8.3	EQ	Anclaje de H:S Fo= 180 kg/cm² p/ Placas según	6 days	Mon 4/3/24	4/3																								
29	1.8.4	EQ	Codo 3" x 25°	3 days	Wed 13/3/24	13/3																								
30	1.8.5	EQ	Codo 3" x 30°	3 days	Mon 18/3/24	18/3																								
31	1.8.6	EQ	Codo 3" x 45°	3 days	Thu 21/3/24	21/3																								
32	1.8.7	EQ	Codo 6" x 15°	3 days	Tue 26/3/24	26/3																								
33	1.8.8	EQ	Codo 6" x 20°	3 days	Mon 1/4/24	1/4																								
34	1.8.9	EQ	Codo 6" x 25°	2 days	Thu 4/4/24	4/4																								
35	1.8.10	EQ	Codo 6" x 40°	3 days	Mon 8/4/24	8/4																								
36	1.8.11	EQ	Codo 6" x 80°	3 days	Thu 11/4/24	11/4																								
37	1.8.12	EQ	Tee 6" x 6"	3 days	Tue 16/4/24	16/4																								
38	1.8.13	EQ	Tee 6" x 3"	3 days	Fri 18/4/24	18/4																								
39	1.8.14	EQ	Reducción ø 6" a ø 4"	3 days	Wed 24/4/24	24/4																								
40	1.8.15	EQ	Junta Tapon de 3"	3 days	Mon 29/4/24	29/4																								
41	1.8.16	EQ	Junta Mecánica Tipo Dresser 3" 160 Psi	3 days	Fri 3/5/24	3/5																								
42	1.8.17	EQ	Junta Mecánica Tipo Dresser 4" 160 Psi	3 days	Wed 8/5/24	8/5																								
43	1.8.18	EQ	Junta Mecánica Tipo Dresser 6" 160 Psi	3 days	Mon 13/5/24	13/5																								
44	1.8.19	EQ	Anclaje de H:S Fo= 180 kg/cm² p/ Placas según	3 days	Thu 18/5/24	18/5																								
45	1.8.20	EQ	Anclaje de H:S Fo= 210 kg/cm² p/ Placas según	3 days	Tue 21/5/24	21/5																								

[illegible]

ID	WBS	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Oct 4, 2023			Oct 1, 2024			Oct 2, 2024			Oct 3, 2024			Oct 4, 2024			Oct 1, 2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
69	1.13	EQ	Reposicion de Carpeta Asfaltica	25 days	Wed 20/11/24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

REALIZADO POR:

Carlos Julio P. Perez

ING. CARLOS JULIO PEREZ

CEDULA: 018-0025583-6

CODIA: 28236
