




AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO

INAPA-CCC-LPN-2022-0029

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Half 1, 2025														Half 2, 2025							Half 1, 2026							Half 2, 2026						
					N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A													
1	AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO	294 days	12/12/24	12/12/25																																			
2	LOTE III	294 days	12/12/24	12/12/25																																			
3	INICIO	294 days	12/12/24	12/12/25																																			
4	Acta de Inicio de Obra	1 day	12/12/24	12/12/24																																			
5	Movilización e instalación	3 days	13/12/24	17/12/24																																			
6	A - LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE Ø6" PVC SDR-26 A EMPALMAR DE LA TUBERÍA DE Ø24" HACIA LA COMUNIDAD DE VILLA NUEVA	46 days	17/12/24	12/02/25																																			
7	Preliminares	3 days	17/12/24	20/12/24																																			
8	Replanteo y marcado de corte	3 days	17/12/24	20/12/24																																			
9	Corte y Extracción de Asfalto	8 days	20/12/24	31/12/24																																			
10	Corte de asfalto c=2" (ambos lados)	5 days	20/12/24	26/12/24																																			
11	Extracción de asfalto c/equipo c=2"	2 days	26/12/24	30/12/24																																			
12	Bote de material c/camión (d= de 5 km)	1 day	30/12/24	31/12/24																																			
13	Movimiento de tierra	30 days	31/12/24	05/02/25																																			
14	Excavación material compacto	10 days	31/12/24	11/01/25																																			
15	Nivelación en fondo de zanja	10 days	01/01/25	13/01/25																																			
16	Suministro y coloc. Asiento de arena	10 days	02/01/25	14/01/25																																			
17	Relleno compactado	4 days	28/01/25	01/02/25																																			
18	Bote de material con camón (d= 5 km)	3 days	03/02/25	05/02/25																																			
19	Suministro y colocación de tuberías	11 days	14/01/25	28/01/25																																			
20	Suministro y colocación de tuberías Ø6" PVC (SDR-26) y accesorios	6 days	14/01/25	22/01/25																																			
21	Prueba hidrostática	2 days	25/01/25	28/01/25																																			
22	Suministro y colocación de válvulas	3 days	22/01/25	25/01/25																																			
23	Suministro y colocación de válvulas	3 days	22/01/25	25/01/25																																			
24	Reposición de Carpeta Asfáltica	3 days	06/02/25	10/02/25																																			
25	Imprimación y colocación de asfalto	3 days	06/02/25	10/02/25																																			
26	Limpieza Continua y Final	2 days	10/02/25	12/02/25																																			
27	B - REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS SI	85 days	28/01/25	14/05/25																																			
28	Preliminares	5 days	28/01/25	03/02/25																																			
29	Replanteo y marcado de corte	5 days	28/01/25	03/02/25																																			
30	Corte y Extracción de Asfalto	17 days	04/02/25	25/02/25																																			
31	Corte de asfalto c=2" (ambos lados)	10 days	04/02/25	15/02/25																																			
32	Extracción de asfalto c/equipo c=2"	4 days	15/02/25	20/02/25																																			
33	Bote de material c/camión (d= de 5 km)	3 days	20/02/25	25/02/25																																			
34	Movimiento de tierra	54 days	20/02/25	29/04/25																																			
35	Excavación material compacto	15 days	20/02/25	11/03/25																																			
36	Suministro y coloc. Asiento de arena	15 days	21/02/25	12/03/25																																			
37	Relleno compactado	10 days	16/04/25	29/04/25																																			
38	Suministro y colocación de tuberías	28 days	12/03/25	16/04/25																																			
39	Suministro y colocación de tuberías Ø6" PV 8 days	8 days	12/03/25	22/03/25																																			
40	Suministro y colocación de tuberías Ø4" PV 8 days	8 days	22/03/25	01/04/25																																			



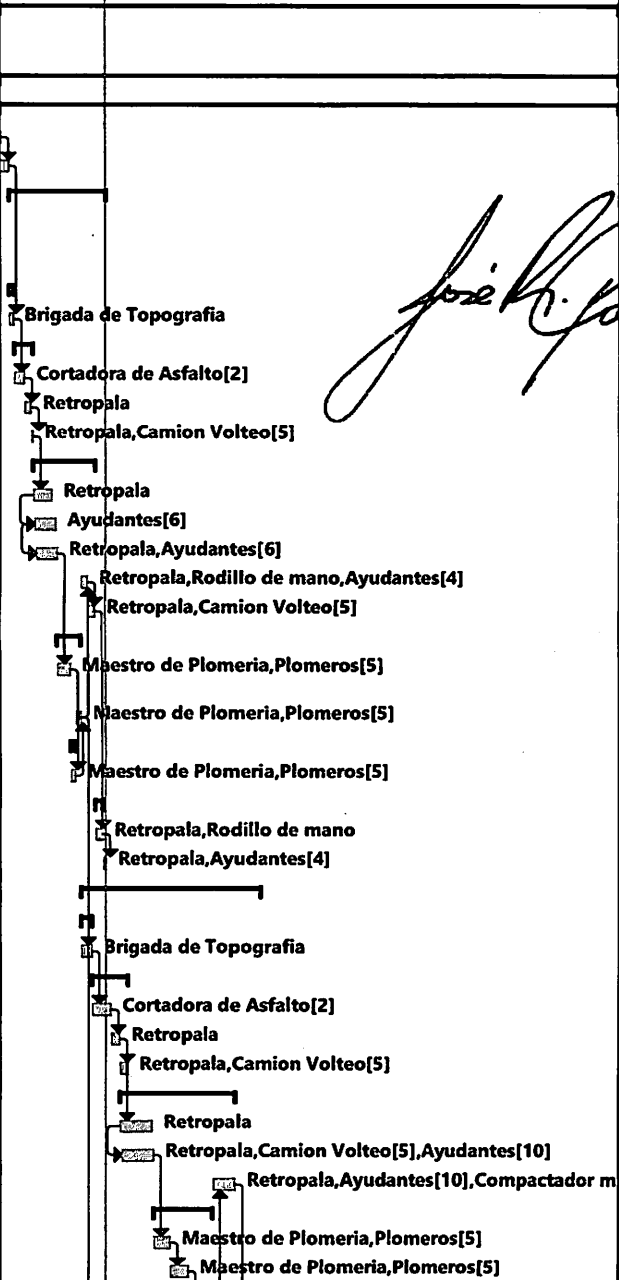

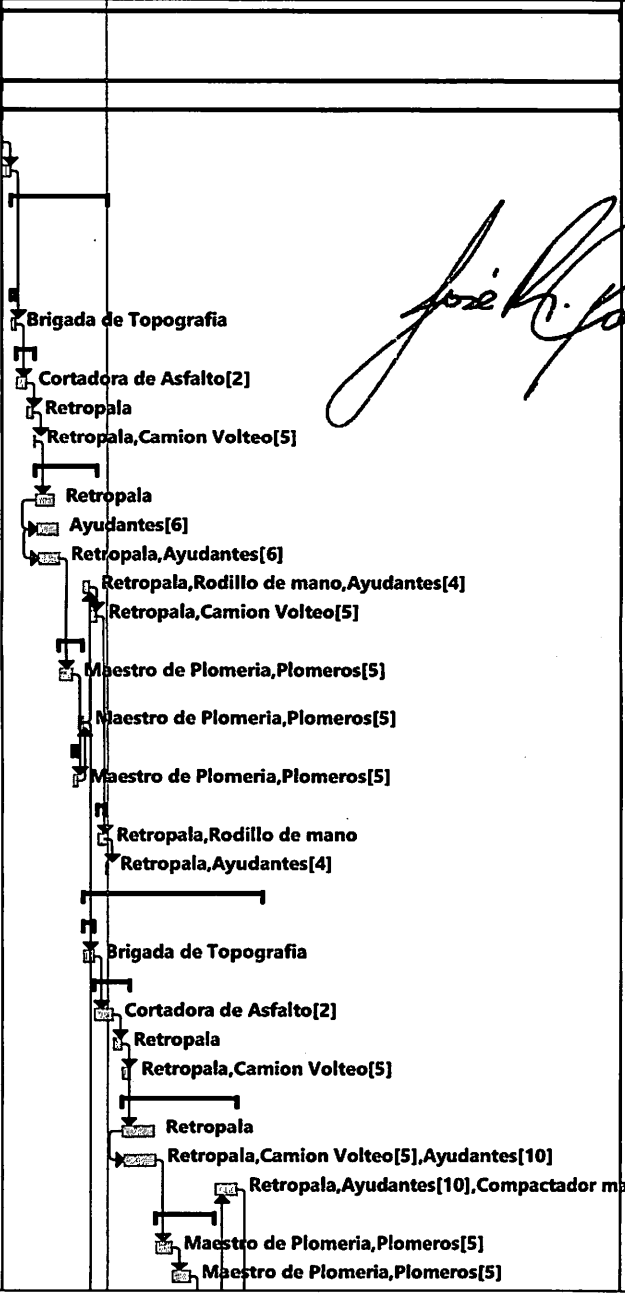

Jose R. Romero



AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO

INAPA-CCC-LPN-2022-0029

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A
41	Suministro y colocación de tuberías Ø3" PV	12 days	02/04/25	16/04/25																						
42	Reposición de Carpeta Asfáltica	8 days	29/04/25	08/05/25																						
43	Imprimación y colocación de asfalto	8 days	29/04/25	08/05/25																						
44	Limpieza Continua y Final	4 days	08/05/25	14/05/25																						
45	C - LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE DE	33 days	28/01/25	10/03/25																						
46	Preliminares	3 days	28/01/25	31/01/25																						
47	Replanteo	3 days	28/01/25	31/01/25																						
48	Movimiento de tierra	28 days	31/01/25	07/03/25																						
49	Excavación material compacto	5 days	31/01/25	06/02/25																						
50	Suministro y coloc. Asiento de arena	5 days	03/02/25	07/02/25																						
51	Relleno compactado	8 days	26/02/25	07/03/25																						
52	Suministro y colocación de tuberías	10 days	08/02/25	20/02/25																						
53	Suministro y colocación de tuberías Ø8" PV	10 days	08/02/25	20/02/25																						
54	Suministro y Colocación de Valvulas	4 days	20/02/25	26/02/25																						
55	Suministro y Colocación de Valvulas	4 days	20/02/25	26/02/25																						
56	Limpieza Continua y Final	2 days	07/03/25	10/03/25																						
57	D - ESTACIÓN DE BOMBEO No.2 (CÁRC)	126 days	07/03/25	12/08/25																						
58	CÁRCAMO DE BOMBEO	71 days	07/03/25	04/06/25																						
59	Preliminares	5 days	07/03/25	13/03/25																						
60	Limpieza del área	3 days	07/03/25	11/03/25																						
61	Replanteo	2 days	11/03/25	13/03/25																						
62	Movimiento de tierra	43 days	13/03/25	06/05/25																						
63	Excavación material compacto	4 days	13/03/25	19/03/25																						
64	Relleno Compactado	2 days	01/05/25	03/05/25																						
65	Bote de Escombros	2 days	03/05/25	06/05/25																						
66	Hormigón Armado	35 days	19/03/25	01/05/25																						
67	Zapatas	7 days	19/03/25	27/03/25																						
68	Losa de Fondo	7 days	05/04/25	14/04/25																						
69	Muros	7 days	27/03/25	04/04/25																						
70	Columnas	7 days	14/04/25	23/04/25																						
71	Vigas y Losas	7 days	23/04/25	01/05/25																						
72	Terminacion de Superficie	20 days	09/05/25	04/06/25																						
73	Fino Losa de fondo	3 days	09/05/25	14/05/25																						
74	Pañete interior	5 days	14/05/25	20/05/25																						
75	Fino de techo	2 days	02/06/25	04/06/25																						
76	CASETA DE BOMBEO SOBRE CISTER	23 days	20/05/25	18/06/25																						
77	Hormigón Armado	6 days	26/05/25	02/06/25																						
78	Muro de Blocks	4 days	20/05/25	24/05/25																						
79	Acera	2 days	09/06/25	11/06/25																						
80	Terminación de Superficie	4 days	04/06/25	09/06/25																						
81	Verja de Malla Ciclónica	3 days	09/06/25	12/06/25																						
82	Portaje	2 days	12/06/25	16/06/25																						
83	Limpieza	2 days	16/06/25	18/06/25																						
84	ELECTRIFICACIÓN ESTACION DE BO	5 days	18/06/25	24/06/25																						
85	GARITA DE VIGILANTE	39 days	24/06/25	12/08/25																						

CONSORCIO ACUEDUCTOS DEL CIBAO



INAPA-CCC-LPN-2022-0029

CONSORCIO ACUEDUCTOS DEL CIBAO

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO

INAPA-CCC-LPN-2022-0029

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	N	D	Half 1, 2025	Half 2, 2025	Half 1, 2026	Half 2, 2026															
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	
131	Suministro y coloc. Asiento de arena	10 days	17/05/25	29/05/25																					
132	Relleno compactado	5 days	03/06/25	09/06/25																					
133	Suministro y colocación de tuberías	12 days	19/05/25	03/06/25																					
134	Suministro y colocación de tuberías Ø8" Ac	7 days	19/05/25	27/05/25																					
135	Suministro y colocación de tuberías Ø6" Ac	5 days	28/05/25	03/06/25																					
136	Reposición de Carpeta Asfáltica	3 days	09/06/25	12/06/25																					
137	Imprimación y colocación de asfalto	3 days	09/06/25	12/06/25																					
138	Limpieza Continua y Final	5 days	12/06/25	19/06/25																					
139	F - DEPÓSITO REGULADOR SUPERFICIE	43 days	09/06/25	01/08/25																					
140	Preliminares	4 days	09/06/25	13/06/25																					
141	Limpieza del área	2 days	09/06/25	11/06/25																					
142	Replanteo	2 days	11/06/25	13/06/25																					
143	Movimiento de tierra	26 days	13/06/25	16/07/25																					
144	Excavación material compacto	1 day	13/06/25	16/06/25																					
145	Relleno Compactado	2 days	11/07/25	14/07/25																					
146	Bote de Escombros	2 days	14/07/25	16/07/25																					
147	Hormigón Armado	21 days	16/06/25	11/07/25																					
148	Zapatas	4 days	16/06/25	20/06/25																					
149	Losa de Fondo	3 days	26/06/25	30/06/25																					
150	Muros	5 days	20/06/25	26/06/25																					
151	Columnas	4 days	30/06/25	04/07/25																					
152	Vigas y Losas	5 days	04/07/25	11/07/25																					
153	Terminación de Superficie	10 days	21/07/25	01/08/25																					
154	Fino Losa de fondo	2 days	21/07/25	22/07/25																					
155	Pañete interior	4 days	23/07/25	28/07/25																					
156	Fino de techo	2 days	28/07/25	30/07/25																					
157	Pintura	2 days	30/07/25	01/08/25																					
158	Suministro e Instalación de Tuberías en Entrad	4 days	26/06/25	01/07/25																					
159	Acera perimetral	2 days	01/07/25	03/07/25																					
160	Verja en Bloques de 6"	21 days	03/07/25	30/07/25																					
161	Replanteo	1 day	03/07/25	04/07/25																					
162	Movimiento de tierra	16 days	04/07/25	24/07/25																					
163	Excavación material compacto	3 days	04/07/25	09/07/25																					
164	Relleno de reposición	1 day	23/07/25	23/07/25																					
165	Bote de material	1 day	24/07/25	24/07/25																					
166	Hormigón Armado	11 days	09/07/25	22/07/25																					
167	Zapatas	3 days	09/07/25	12/07/25																					
168	Viga de Amarre SNP	3 days	18/07/25	22/07/25																					
169	Muros	5 days	12/07/25	18/07/25																					
170	Blocks 8" BNP	1 day	12/07/25	14/07/25																					
171	Blocks 6" SNP	4 days	14/07/25	18/07/25																					
172	Terminación de Superficie	4 days	23/07/25	28/07/25																					
173	Fraguache	1 day	23/07/25	23/07/25																					
174	Pañete en vigas y columnas	3 days	24/07/25	28/07/25																					
175	Pintura	2 days	28/07/25	30/07/25																					

Retropala,Camion Volteo[5],Ayudantes[10]

Retropala,Ayudantes[10],Compactador manual[2],Rodillo de mano

Maestro de Plomeria,Plomeros[5]

Maestro de Plomeria,Plomeros[5]

Retropala,Rodillo de mano

Retropala,Ayudantes[4]

Retropala,Ayudantes[4]

Brigada de Topografia

Retroexcavadora

Retropala,Camion Volteo[5],Ayudantes[10]

Retropala,Ayudantes[10],Compactador manual[2],Rodillo de mano

Albañiles[2],Ayudantes[4],Varilleros[4],Carpinteros[2]

Albañiles[2],Ayudantes[4],Varilleros[4],Carpinteros[2]

Albañiles[2],Ayudantes[4],Varilleros[4],Carpinteros[4]

Albañiles[2],Ayudantes[4],Varilleros[4],Carpinteros[4]

Albañiles[2],Ayudantes[4],Varilleros[4],Carpinteros[4]

Albañiles[2],Ayudantes[4],Varilleros[4],Carpinteros[4]

Albañiles[2],Ayudantes[4]

Albañiles[2],Ayudantes[4]

Albañiles[2],Ayudantes[4]

Pintores[2]

Maestro de Plomeria,Plomeros[2],Ayudantes[2]

Albañiles[2],Ayudantes[4]

Brigada de Topografia

Ayudantes[4]

Ayudantes[2],Compactador manual

Camion de 6 m3

Albañiles[2],Ayudantes[4],Varilleros[2],Carpinteros[2]

Albañiles[2],Ayudantes[4],Varilleros[2],Carpinteros[2]

Albañiles[2],Ayudantes[4]

Albañiles[2],Ayudantes[4]

Albañiles[2],Ayudantes[4]

Pintores[2]

COACI

SANTIAGO, R.D.

CONSORCIO ACUEDUCTOS DEL CIBAO




AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO

INAPA-CCC-LPN-2022-0029

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A
176	G - RED DE DISTRIBUCIÓN DE GUANÁE	30 days	14/07/25	20/08/25																						
177	Preliminares	2 days	14/07/25	16/07/25																						
178	Replanteo y marcado de corte	2 days	14/07/25	16/07/25																						
179	Corte y Extracción de Asfalto	6 days	16/07/25	23/07/25																						
180	Corte de asfalto c=2" (ambos lados)	2 days	16/07/25	18/07/25																						
181	Extracción de asfalto c/equipo c=2"	3 days	18/07/25	22/07/25																						
182	Bote de material c/camión (d= de 5 km)	1 day	23/07/25	23/07/25																						
183	Movimiento de tierra	18 days	24/07/25	15/08/25																						
184	Excavación material compacto	8 days	24/07/25	02/08/25																						
185	Suministro y coloc. Asiento de arena	8 days	25/07/25	04/08/25																						
186	Relleno compactado	5 days	08/08/25	15/08/25																						
187	Suministro y colocación de tuberías	11 days	26/07/25	08/08/25																						
188	Suministro y colocación de tuberías Ø4" PV(4 days	4 days	26/07/25	31/07/25																						
189	Suministro y colocación de tuberías Ø3" PV(7 days	7 days	31/07/25	08/08/25																						
190	Reposición de Carpeta Asfáltica	2 days	15/08/25	18/08/25																						
191	Imprimación y colocación de asfalto	2 days	15/08/25	18/08/25																						
192	Limpieza Continua y Final	2 days	18/08/25	20/08/25																						
193	H - DEPÓSITO REGULADOR H.A. SUPER	47 days	15/08/25	13/10/25																						
194	Preliminares	4 days	15/08/25	20/08/25																						
195	Limpieza del área	2 days	15/08/25	18/08/25																						
196	Replanteo	2 days	18/08/25	20/08/25																						
197	Movimiento de tierra	28 days	20/08/25	24/09/25																						
198	Excavación material compacto	1 day	20/08/25	21/08/25																						
199	Relleno Compactado	2 days	19/09/25	22/09/25																						
200	Bote de Escombros	2 days	22/09/25	24/09/25																						
201	Hormigón Armado	23 days	21/08/25	18/09/25																						
202	Zapatatas	4 days	21/08/25	26/08/25																						
203	Losa de Fondo	3 days	04/09/25	08/09/25																						
204	Muros	7 days	26/08/25	04/09/25																						
205	Columnas	4 days	08/09/25	12/09/25																						
206	Vigas y Losas	5 days	12/09/25	18/09/25																						
207	Terminación de Superficie	10 days	27/09/25	10/10/25																						
208	Fino Losa de fondo	2 days	27/09/25	30/09/25																						
209	Pañete interior	4 days	30/09/25	06/10/25																						
210	Fino de techo	2 days	06/10/25	08/10/25																						
211	Pintura	2 days	08/10/25	10/10/25																						
212	Suministro e Instalación de Tuberías en Entrad:	6 days	04/09/25	11/09/25																						
213	Acera perimetral	2 days	11/09/25	13/09/25																						
214	Verja en Bloques de 6"	23 days	15/09/25	13/10/25																						
215	Replanteo	1 day	15/09/25	15/09/25																						
216	Movimiento de tierra	18 days	16/09/25	08/10/25																						
217	Excavación material compacto	5 days	16/09/25	22/09/25																						
218	Relleno de reposición	1 day	06/10/25	07/10/25																						
219	Bote de material	1 day	07/10/25	08/10/25																						
220	Hormigón Armado	11 days	22/09/25	06/10/25																						

Handwritten signature: José R. Romero



AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO

INAPA-CCC-LPN-2022-0029

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	N	D	J	F	M	A	M	J	Half 1, 2025	Half 2, 2025	J	A	S	O	N	D	Half 1, 2026	Half 2, 2026
221	Zapatas	3 days	22/09/25	25/09/25																		
222	Viga de Amarre SNP	3 days	01/10/25	06/10/25																		
223	Muros	5 days	25/09/25	01/10/25																		
224	Blocks 8" BNP	1 day	25/09/25	26/09/25																		
225	Blocks 6" SNP	4 days	26/09/25	01/10/25																		
226	Terminación de Superficie	4 days	06/10/25	10/10/25																		
227	Fraguache	1 day	06/10/25	07/10/25																		
228	Pañete en vigas y columnas	3 days	07/10/25	10/10/25																		
229	Pintura	2 days	10/10/25	13/10/25																		
230	I - RED DE DISTRIBUCIÓN DE CAÑADA	63 days	03/05/25	21/07/25																		
231	Preliminares	3 days	03/05/25	07/05/25																		
232	Replanteo y marcado de corte	3 days	03/05/25	07/05/25																		
233	Corte y Extracción de Asfalto	14 days	07/05/25	24/05/25																		
234	Corte de asfalto c=2" (ambos lados)	10 days	07/05/25	20/05/25																		
235	Extracción de asfalto c/equipo c=2"	2 days	20/05/25	22/05/25																		
236	Bote de material c/camión (d= 5 km)	2 days	22/05/25	24/05/25																		
237	Movimiento de tierra	41 days	22/05/25	12/07/25																		
238	Excavación material compacto	15 days	22/05/25	10/06/25																		
239	Suministro y coloc. Asiento de arena	15 days	23/05/25	11/06/25																		
240	Relleno compactado	10 days	30/06/25	12/07/25																		
241	Suministro y colocación de tuberías	15 days	11/06/25	30/06/25																		
242	Suministro y colocación de tuberías Ø6" PV	8 days	11/06/25	21/06/25																		
243	Suministro y colocación de tuberías Ø4" PV	2 days	21/06/25	24/06/25																		
244	Suministro y colocación de tuberías Ø3" PV	5 days	24/06/25	30/06/25																		
245	Reposición de Carpeta Asfáltica	4 days	12/07/25	17/07/25																		
246	Imprimación y colocación de asfalto	4 days	12/07/25	17/07/25																		
247	Limpieza Continua y Final	3 days	17/07/25	21/07/25																		
248	J - ESTACIÓN DE RELEVO EN DEPÓSITO	15 days	11/09/25	30/09/25																		
249	Electrificación Primaria y Secundaria	10 days	11/09/25	24/09/25																		
250	Suministro e instalación de bombas y accesorio:	5 days	24/09/25	30/09/25																		
251	K - LÍNEA DE IMPULSIÓN DESDE ESTA	31 days	22/09/25	30/10/25																		
252	Preliminares	2 days	22/09/25	24/09/25																		
253	Replanteo y marcado de corte	2 days	22/09/25	24/09/25																		
254	Corte y Extracción de Asfalto	5 days	24/09/25	30/09/25																		
255	Corte de asfalto c=2" (ambos lados)	2 days	24/09/25	26/09/25																		
256	Extracción de asfalto c/equipo c=2"	2 days	26/09/25	29/09/25																		
257	Bote de material c/camión (d= 5 km)	1 day	29/09/25	30/09/25																		
258	Movimiento de tierra	20 days	30/09/25	24/10/25																		
259	Excavación material compacto	10 days	30/09/25	13/10/25																		
260	Suministro y coloc. Asiento de arena	10 days	01/10/25	14/10/25																		
261	Relleno compactado	5 days	18/10/25	24/10/25																		
262	Suministro y colocación de tuberías	13 days	02/10/25	18/10/25																		
263	Suministro y colocación de tuberías Ø6" Ace	8 days	02/10/25	13/10/25																		
264	Suministro y colocación de tuberías Ø6" PV	5 days	13/10/25	18/10/25																		
265	Reposición de Carpeta Asfáltica	2 days	24/10/25	28/10/25																		

[Handwritten signature]



CONSORCIO ACUEDUCTOS DEL CIBAO

AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO

INAPA-CCC-LPN-2022-0029

ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	N	D	Half 1, 2025	Half 2, 2025	Half 1, 2026	Half 2, 2026
266	Imprimación y colocación de asfalto	2 days	24/10/25	28/10/25						
267	Limpieza Continua y Final	2 days	28/10/25	30/10/25						
268	L - DEPÓSITO REGULADOR H.A. SUPER	53 days	23/07/25	26/09/25						
269	Preliminares	4 days	23/07/25	28/07/25						
270	Limpieza del área	2 days	23/07/25	24/07/25						
271	Replanteo	2 days	25/07/25	28/07/25						
272	Movimiento de tierra	33 days	28/07/25	06/09/25						
273	Excavación material compacto	2 days	28/07/25	30/07/25						
274	Relleno Compactado	2 days	02/09/25	04/09/25						
275	Bote de Escombros	2 days	04/09/25	06/09/25						
276	Hormigón Armado	27 days	30/07/25	02/09/25						
277	Zapatas	5 days	30/07/25	05/08/25						
278	Losa de Fondo	4 days	15/08/25	20/08/25						
279	Muros	8 days	05/08/25	15/08/25						
280	Columnas	5 days	20/08/25	26/08/25						
281	Vigas y Losas	5 days	26/08/25	02/09/25						
282	Terminación de Superficie	13 days	10/09/25	26/09/25						
283	Fino Losa de fondo	3 days	10/09/25	13/09/25						
284	Pañete interior	4 days	15/09/25	18/09/25						
285	Fino de techo	3 days	19/09/25	23/09/25						
286	Pintura	3 days	23/09/25	26/09/25						
287	Suministro e Instalación de Tuberías en Entrad:	6 days	15/08/25	22/08/25						
288	Acera perimetral	2 days	22/08/25	25/08/25						
289	Verja en Bloques de 6"	26 days	25/08/25	26/09/25						
290	Replanteo	1 day	25/08/25	26/08/25						
291	Movimiento de tierra	21 days	26/08/25	22/09/25						
292	Excavación material compacto	5 days	26/08/25	02/09/25						
293	Relleno de reposición	1 day	19/09/25	19/09/25						
294	Bote de material	1 day	20/09/25	22/09/25						
295	Hormigón Armado	14 days	02/09/25	18/09/25						
296	Zapatas	4 days	02/09/25	06/09/25						
297	Viga de Amarre SNP	4 days	15/09/25	18/09/25						
298	Muros	6 days	06/09/25	13/09/25						
299	Blocks 8" BNP	2 days	06/09/25	09/09/25						
300	Blocks 6" SNP	4 days	09/09/25	13/09/25						
301	Terminación de Superficie	4 days	19/09/25	24/09/25						
302	Fraguache	1 day	19/09/25	19/09/25						
303	Pañete en vigas y columnas	3 days	20/09/25	24/09/25						
304	Pintura	2 days	24/09/25	26/09/25						
305	M - RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA SIER	44 days	18/10/25	12/12/25						
306	Preliminares	2 days	18/10/25	21/10/25						
307	Replanteo y marcado de corte	2 days	18/10/25	21/10/25						
308	Corte y Extracción de Asfalto	11 days	21/10/25	04/11/25						
309	Corte de asfalto c=2" (ambos lados)	5 days	21/10/25	28/10/25						
310	Extracción de asfalto c/equipo c=2"	4 days	28/10/25	01/11/25						

Retropala,Rodillo de mano

Retropala,Ayudantes[4]

Brigada de Topografia

Camion Voltec[10],Retroexcavadora

Retropala,Camion Volteo[5],Ayudantes[10]

Retropala,Ayudantes[10],Compactador manual[2],Rodillo de mano

Albañiles[2],Ayudantes[4],Varilleros[2]

Albañiles[2],Ayudantes[4],Varilleros[2],Carpinteros[2]

Albañiles[2],Ayudantes[4],Carpinteros[4],Varilleros[4]

Albañiles[2],Ayudantes[4],Carpinteros[4],Varilleros[4]

Albañiles[2],Ayudantes[4],Carpinteros[4],Varilleros[4]

Albañiles[2],Ayudantes[4]

Albañiles[2],Ayudantes[4]

Albañiles[2],Ayudantes[4]

Pintores[2]

Maestro de Plomeria,Plomeros[2]

Albañiles[2],Ayudantes[4]

Brigada de Topografia

Ayudantes[4]

Ayudantes[2], Compactador manual

Camion de 6 m3

Albañiles[2],Ayudantes[4], Varilleros[2]

Albañiles[2],Ayudantes[4], Varilleros[2],Carpinteros[2]

Albañiles[2],Ayudantes[4]

Albañiles[2],Ayudantes[4]

Albañiles[2],Ayudantes[4]

Albañiles[2],Ayudantes[4]

Pintores[2]

Brigada de Topografia

Cortadora de Asfalto[2]

Retropala

Jose R. Gonzalez

CONSORCIO ACUEDUCTOS DEL CIBAO

COACI

SANTIAGO, R.D.

Jose R. Romero



CONSORCIO ACUEDUCTOS DEL CIBAO

INAPA-CCC-LPN-2022-0029

[illegible]

Joe R. Romano

