


RAAS

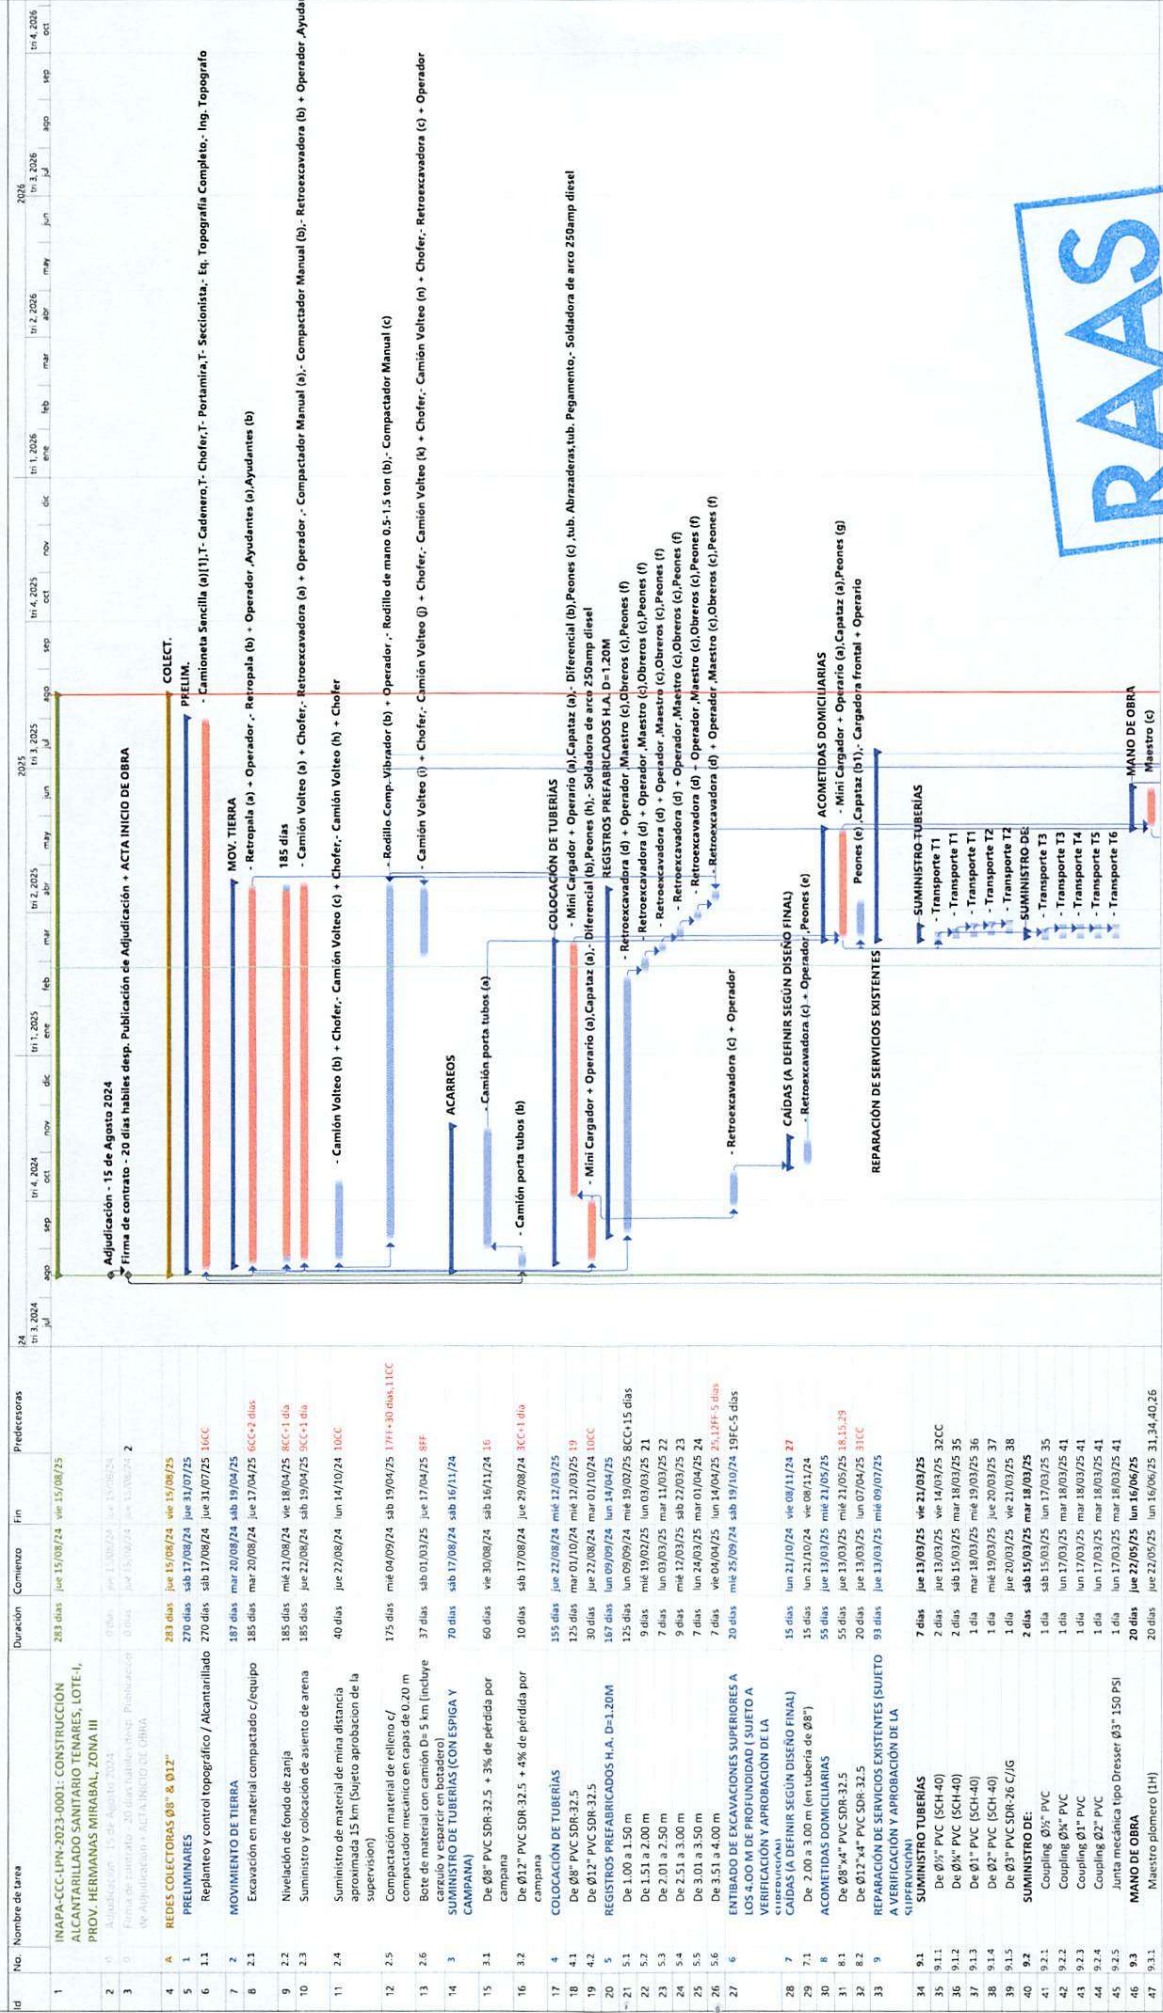

Resumen
Resumen Total
Tareas críticas

Hito

Tarea

[Handwritten signature]

Proyecto: INAPA-CCC-LPN-2023-0001 (LOTE 1)

RAAS

RAAS										2026												
Id	No.	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	24												Tareas críticas	Resumen Total	Resumen	Tarea
							24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4				
48	9.3.2	Prón (2H)	20 días	jun 22/05/25	jun 16/06/25	47CC																
49	9.3.3	Uso de Bomba Achique Ø3" (5.5 HP)	20 días	jun 22/05/25	jun 16/06/25	48CC																
50	9.4	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE (SUJTO A VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CANTIDAD)	93 días	jun 13/03/25	mié 09/07/25																	
51	9.4.1	Demolición y remoción de Aceros c/equipo	3 días	jun 13/03/25	jun 17/03/25	31CC																
52	9.4.2	Demolición y remoción de Contenes	3 días	jun 17/03/25	jun 20/03/25	51																
53	9.4.3	Demolición y remoción de Bañeres c/equipo	25 días	jun 20/03/25	jun 21/04/25	52																
54	9.4.4	Botte de material c/camión dist.5 km	3 días	mar 22/04/25	jun 24/04/25	53																
55	9.4.5	Incluye estacionamiento en botadero	10 días	mar 17/06/25	sub 28/06/25	46,51																
56	9.4.6	Reposición de Aceros en H.S. f c=210kg/cm²	12 días	mar 17/06/25	mar 01/07/25	46,52																
57	9.4.7	Reposición de Bañeres f c=210kg/cm² (Ver diseño en planos)	6 días	mié 02/07/25	mié 09/07/25	46,52,56																
58	10	CARPETA ASFÁLTICA	281 días	jun 19/08/24	vie 15/08/25																	
59	10.1	Corte con disco de Carpeta Asfáltica 2" (ambos lados)	180 días	jun 19/08/24	mié 09/04/25	6CC+1 día																
60	10.2	Extracción c/equipo de Carpeta Asfáltica 2"	180 días	mar 20/08/24	jun 30/04/25	59CC+1 día																
61	10.3	Botte c/camión de Carpeta Asfáltica 2" (incluye esparramiento en botadero)	180 días	mar 20/08/24	jun 30/04/25	60FF																
62	10.4	Impregnación Sencilla	30 días	mar 08/07/25	jun 14/08/25	12,64CC-7 días,56																
63	10.5	Suministro y colocación de Asfalto e=2"	30 días	mié 09/07/25	vie 15/08/25	62CC+1 día																
64	10.6	Incluye Mesio Adherencial	30 días	jun 30/06/25	mié 06/08/25	12,56FC-2 días																
65	11	SEÑALIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE TRÁNSITO. Incluye letreros con base, conos refractarios, cinta de peligro, malla de seguridad naranja, tanques de 55 gls pintados amarillo tráfico con cinta luminica, pasarelas de madera y hombres con banderola, chalecos	273 días	jun 15/08/24	jun 04/08/25	3CC																
66	12	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL. Incluye obreros, Camión y herramientas menores	273 días	jun 15/08/24	jun 04/08/25	3CC																
67	2	VARIOS	271 días	jun 15/08/24	jun 03/08/25																	
68	2.1	VALIA anunciando obra 20' x 10' Impresión Full Color conteniendo logo de NAPA, nombre de proyecto y contratista. Estructura en tubos galvanizados 1½" x 1½" y soportes en tubo	5 días	jun 15/08/24	jun 22/08/24	3CC																
69	2.2	Aquilar de torre para iluminación nocturna para	273 días	jun 15/08/24	jun 04/08/25	3CC																
70	2.3	CAMPAMENTO (incluye alquiler del solar o casa y caseta de materiales)	273 días	jun 15/08/24	jun 04/08/25	3CC																
71	61	GASTOS INDIRECTOS	282 días	jun 15/08/24	jun 14/08/25																	
72	61.1	Honorarios Profesionales	282 días	jun 15/08/24	jun 14/08/25	3CC																
73	61.2	Gastos Administrativos	282 días	jun 15/08/24	jun 14/08/25	3CC																
74	61.3	Seguros, Pólizas y Fianzas	282 días	jun 15/08/24	jun 14/08/25	3CC																
75	61.4	Supervisión de la obra	282 días	jun 15/08/24	jun 14/08/25	3CC																
76	61.5	Gastos de Transporte	282 días	jun 15/08/24	jun 14/08/25	3CC																
77	61.6	Ley 6-86	282 días	jun 15/08/24	jun 14/08/25	3CC																
78	61.7	CODIA	282 días	jun 15/08/24	jun 14/08/25	3CC																
79	61.8	ITBIS Honorarios Profesionales (Ley 07-2007)	282 días	jun 15/08/24	jun 14/08/25	3CC																
80	61.9	Medida de Compensación Ambiental	282 días	jun 15/08/24	jun 14/08/25	3CC																
81	61.10	Imprevistos	282 días	jun 15/08/24	jun 14/08/25	3CC																

Proyecto: INAPA-CCC-LPN-2023-0001 (LOTE 1)
