


	🔍	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28
1		CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR PEDERNALES	365 días	do. 15/10/23 9:00	ma. 15/10/24 10:00	
2	🔍	Limpieza de area (Corte y desbroce)	15 días	do. 15/10/23 9:00	ma. 31/10/23 10:00	
3		Relleno de Material (Terraplen)	15 días	ma. 31/10/23 10:00	mi. 15/11/23 10:00	
4		Replanteo y Control Topografico	165 días	do. 15/10/23 9:00	vi. 29/03/24 10:00	
5		Movimiento de Tierra para Tanque	20 días	mi. 15/11/23 10:00	ma. 05/12/23 10:00	
6		Hormigon Armado en tanque	210 días	ma. 05/12/23 10:00	ma. 02/07/24 10:00	
7		Zapata Muros, Columnas y Losa de Fondo	45 días	ma. 05/12/23 10:00	vi. 19/01/24 10:00	
8		Muros Circulares y Columnas Fase 1	45 días	vi. 19/01/24 10:00	lu. 04/03/24 10:00	
9		Muros Circulares y Columnas Fase 2	45 días	lu. 04/03/24 10:00	ju. 18/04/24 10:00	
10		Muros Circulares y Columnas Fase 3	45 días	ju. 18/04/24 10:00	do. 02/06/24 9:00	
11		Vigas y Losa	30 días	do. 02/06/24 9:00	ma. 02/07/24 10:00	
12		Impermeabilizacion Muro Interior Sikatop Seal 107	30 días	ma. 02/07/24 10:00	ju. 01/08/24 10:00	
13		Panete Interior de Muro	30 días	ma. 02/07/24 10:00	ju. 01/08/24 10:00	
14		Fino Losa de Fondo	15 días	ju. 01/08/24 10:00	vi. 16/08/24 10:00	
15		Fino de Losa de Techo	15 días	ju. 01/08/24 10:00	vi. 16/08/24 10:00	
16		Escalera Exterior	30 días	vi. 16/08/24 10:00	do. 15/09/24 9:00	
17		Escalera Interior	30 días	vi. 16/08/24 10:00	do. 15/09/24 9:00	
18		Baranda de tubos en Losa de Techo	30 días	vi. 16/08/24 10:00	do. 15/09/24 9:00	
19		Tapa de Registro en Acero Inoxidable en Losa de Techo	30 días	vi. 16/08/24 10:00	do. 15/09/24 9:00	
20		Suministro e Instalacion de Tuberias de Entrada, de Salida , de Desague, de Rebose y Bypass	50 días	ma. 02/07/24 10:00	mi. 21/08/24 10:00	
21		Movimiento de Tierra para Tuberias	30 días	ma. 02/07/24 10:00	ju. 01/08/24 10:00	
22		Acera Perimetral	25 días	sá. 31/08/24 9:00	mi. 25/09/24 10:00	
23		Verja Perimetral	60 días	ma. 02/07/24 10:00	sá. 31/08/24 9:00	
24		Embellecimiento con Gravilla	10 días	mi. 25/09/24 10:00	sá. 05/10/24 9:00	
25		Limpieza Final	10 días	sá. 05/10/24 9:00	ma. 15/10/24 10:00	



04 11 18 25 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16



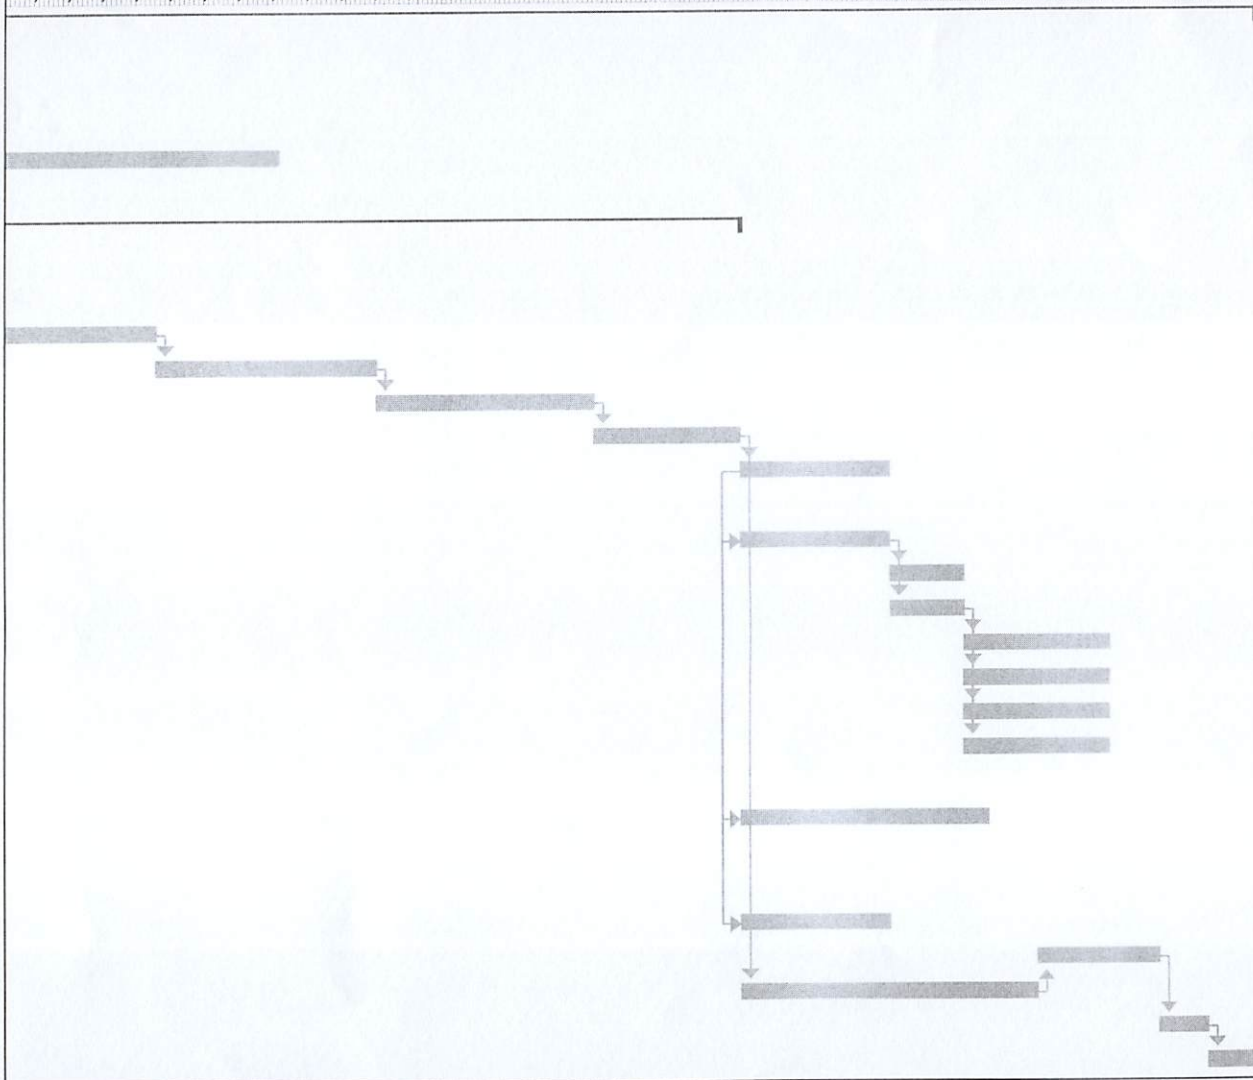

Proyecto: Project1
Fecha: vl. 27/10/23 9:45

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	
