



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)**

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

I. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



INFORMACIÓN	
Nombre del proyecto	REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE 50 L/S, ACUEDUCTO YAMASÁ, PROVINCIA MONTE PLATA
Provincia	Monte Plata
Contrato	006-2006
Contratista	Compresores, Equipos, e Ingeniería (COMPREICA), S.A.S
Monto contratado	RD\$36,970,338.25
Duración del proyecto	2 años
Periodo de ejecución	Trimestre Octubre – Diciembre 2023
Monto ejecutado	RD\$36,812,387.21
% Avance financiero de las obras	99.57%
% Avance físico	97.0%



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)



Imágenes

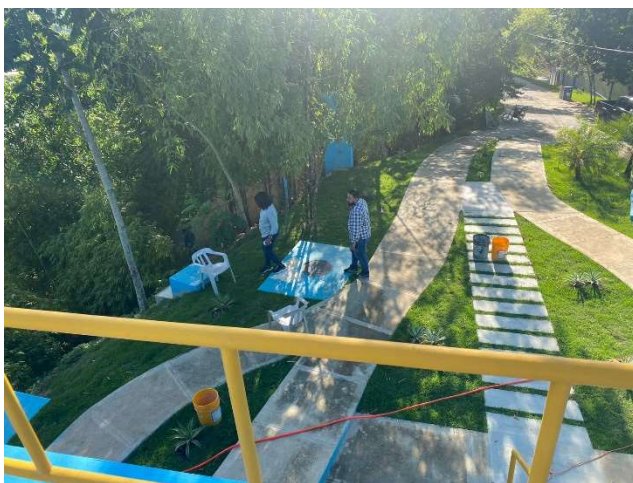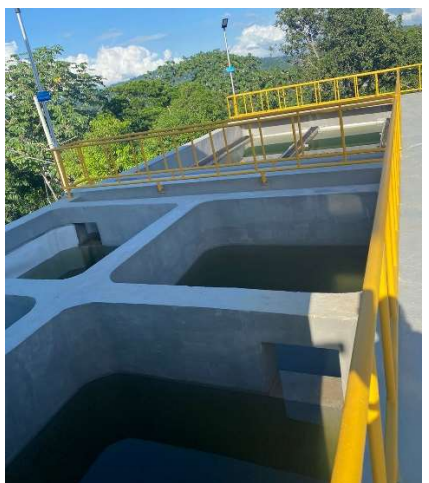

APROBADO POR:

JOSÉ MARTÍNEZ BONETTI

DIRECTOR DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES
