



INAPA | INSTITUTO NACIONAL
DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS

INFORME SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2025

**PROGRAMA SANEAMIENTO UNIVERSAL CIUDADES
TURÍSTICAS Y COSTERAS**

No. 5630/OC-DR y 5638/KI-DR

Periodo: abril a junio de 2025

Ing. Nicolás E. Grullón Valdez
Director de Ejecución de Programas y Proyectos de
Inversión





**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(DEPPI)**

UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA

ÍNDICE

I.- Descripción y Contexto del Programa.	3
II.- Resumen de las actividades, gestión Financiera y Administrativa.	4
2.1 Actividades del segundo trimestre de 2025.	4
2.2 Gestión Financiera y Administrativa del Programa.	5
2.2.1 Gestión Financiera.	5
2.2.2.- Gestión Administrativa y de Planificación del Programa.	6
2.3 Gestión Técnica y Avances de las Actividades.	7
2.3.1.- -Expansión y optimización de la infraestructura de saneamiento.	8
2.3.2.- Fortalecimiento Institucional y mejora de eficiencia en el sector.	10
2.4 Indicadores del Programa y Avances.	13
ANEXO I: Procesos de Adquisiciones y Seguimiento.	14

I.- Descripción y Contexto del Programa.

El “*Programa de Saneamiento Universal de Ciudades Turísticas y Costeras*” de la República Dominicana firmado entre el Gobierno dominicano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el financiamiento de recursos económicos del BID, de la Facilidad de Corea para el Cofinanciamiento del Desarrollo de la Infraestructura de América Latina y el Caribe (KIF) y posteriormente se adicionará un aporte de contrapartida del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE). Este Contrato fue firmado el 23 de diciembre de 2022 y aprobado por el Congreso Nacional mediante la Resolución Núm 50-23 de fecha 02 de agosto de 2023. El Programa está estructurado en dos (2) componentes:

Componente I. Expansión y optimización de la infraestructura de saneamiento y **Componente II.** Fortalecimiento Institucional y Mejoras de Eficiencia en el Sector.

Este Programa se encuentra en el Sistema Nacional de Inversión Pública identificado con el Código SNIP No. 15143.

También incluye el financiamiento para el desarrollo de la gestión administrativa, auditoría, monitoreo y evaluación del Programa.

El Acuerdo para la Gestión del Programa entre INAPA y CORAABO fue firmado el 12 de septiembre de 2023 y el Acuerdo Subsidiario entre el Ministerio de Hacienda y el INAPA fue firmado en fecha 07 de diciembre de 2023.

El BID emite la No Objeción al Reglamento Operativo del Programa en fecha 24 de noviembre de 2023.

El Taller de Arranque del Programa fue realizado el 16 de febrero de 2024, y el primer desembolso del Programa se ejecuta en abril de 2024.

La Unidad Ejecutora del Programa tiene conformado un equipo contratado y del INAPA que realiza las funciones de ejecución del Programa.

En el Programa se reciben trimestralmente las Misiones de Supervisión y Evaluación y se realizan las revisiones de carteras entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), INAPA, MEPyD, Ministerio de Hacienda con los objetivos específicos de: (i) revisar los aspectos fiduciarios y técnicos, y los instrumentos de planificación e implementación con la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), INAPA y las contrapartes de CORAABO, (ii) revisar los aspectos ambientales y sociales del Programa y (iii) se realizan visita técnica a Boca Chica.

El cierre del Programa está indicado en los documentos del Convenio para la fecha del 19 de agosto de 2028; por tanto, el tiempo restante es de **38 meses**.

La implantación del SIGEF es obligatoria para todas las instituciones del gobierno central y las instituciones descentralizadas autónomas que manejan recursos públicos, según el Artículo núm. 3 del Decreto Núm 9-04, de fecha 06 de enero de 2004, que crea el SIGEF, en cumplimiento de esta disposición, la ejecución financiera de los Programas se realiza mediante el módulo de Unidades Ejecutoras de Programas con Recursos Externos (UEPEX). En esta herramienta todas las operaciones están asociada a los Módulos de Tesorería y Contabilidad Nacional.

El control interno de las operaciones es realizado por dos (2) unidades ubicadas en el INAPA, una es el área de Revisión y Control del INAPA y la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Contraloría General de la República Dominicana (CGR) con la responsabilidad de asegurar la gestión de los aspectos financieros y de adquisiciones del Programa.

Asimismo, los pagos son revisados y autorizados por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) que es una dependencia subordinada, normativa, administrativa y financiera de la CGR. bajo el ámbito de la Ley 10-07 y su reglamento de aplicación No. 491-07, a los fines de evidenciar el cumplimiento de los controles previos y la revisión documental del expediente de pago, y los contratos son registrados en el Sistema de Tramite Estructurado (TRE) de la Contraloría General de la República Dominicana (CGR).

Las conciliaciones de cuentas del Programa se realizan mensualmente y los Estados Financieros se elaboran en periodo semestrales, las cuentas e inversiones del Programa son auditadas por una Firma Auditora Externa anualmente conforme lo indica el documento del Convenio de Préstamo.

Actualmente la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) elabora la versión final del Convenio que complementa este Programa con el Ministerio de Hacienda para su aprobación, el documento de borrador inicial fue compartido al INAPA en diciembre de 2023.

Este informe resumen los avances de las actividades técnicas, de indicadores, gestión ambiental y social, y la gestión financiera del Programa para el trimestre abril a junio de 2025.

II.- Resumen de las actividades, gestión Financiera y Administrativa.

2.1 Actividades del segundo trimestre de 2025.

- ✓ Se realizan las reuniones semanales de seguimiento entre el equipo del BID y la UCP.
- ✓ El 03 de enero de 2025 se somete a la Cámara de Diputados de la República Dominicana el Convenio con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) por USD50,000,000.0 para el financiamiento de contrapartida del Programa Saneamiento Universal de Ciudades Turísticas y Costeras Fase I, aprobado en la Gaceta Oficial el 30 de mayo de 2025 (Resolución núm. 31-25)
- ✓ El 24 de enero de 2025, fue realizada la publicación para la Precalificación del proceso INAPA-LPI-O-002-2024: Macro Infraestructura de Saneamiento de La Romana: Diseño y construcción de redes colectoras, estaciones de bombeo, líneas de impulsión, planta de tratamiento y emisario submarino, así como la Operación durante 18 meses. **El acto de recepción de los documentos para la precalificación fue realizado el 12 de mayo de 2025.**
- ✓ Se presentan la actualización **No. 7 y aprobadas por el BID en fecha 29 de mayo de 2025** referente al Plan de Adquisiciones del Programa para las actualizaciones de procesos de contratación de personal para la UCP y otros procesos menores de adquisiciones, tales como: Adquisición de Bienes y contrataciones de especialistas individuales.
- ✓ Se realizó la cuarta fase de contratación de los ingenieros junior (2 U) para continuar con el levantamiento de información referente al Catastro de las ciudades de Higüey, San Pedro de Macorís, La Romana y Boca Chica, en fecha 15 de junio de 2025 **con periodo de vigencia hasta el 14 de febrero de 2026.**
- ✓ De marzo a junio de 2025, se presentan las justificaciones/Desembolsos de fondos al BID No. 7 y 8; y de los Fondos Corea el No. 1; para el inicio de la contratación de las Obras del Proyecto.

- ✓ En febrero de 2025, se evalúan los expertos del equipo *Dispute Avoidance and Adjudication Board (DAAB)* (para abordar disputa y arbitraje) del Programa. Se elegirá un equipo de tres personas para asistir a la UCP en la ejecución de las obras de macroinfraestructuras de Boca Chica, tal y como lo especifica el Pliego de las Obras, actualmente en proceso de confirmación.
- ✓ Se remitió al BID, en fecha 04 de marzo de 2025, el informe de Expresión de Interés y Lista Corta de los Servicios de Monitoreo de Datos Oceanográficos Asociado al Proyecto de Ingeniería del Emisario Submarino, así como el documento de Solicitud de Propuesta (SBCC-001-2024-INAPA-CORAABO-BID), los documentos de ofertas fueron recibidos en fecha 22 de mayo de 2025 y el informe de evaluación técnico fue elaborado por el Comité en fecha 16 de junio de 2025.
- ✓ El 20 de mayo de 2025 fue enviado al BID el Informe de Evaluación de Género e inclusión de INAPA.
- ✓ Del 01 al 08 de mayo de 2025 se obtuvieron los SNIP para los proyectos formulados de la Segunda Fase de Ciudades Turísticas y Costeras para los proyectos: i) Ampliación del Alcantarillado Sanitario de Higüey, Prov. La Altagracia; ii) Construcción Alcantarillado Sanitario municipio La Romana y Villa Hermosa, Prov. La Altagracia y iii) Ampliación Alcantarillado Sanitario municipio y Provincia de San Pedro de Macorís.
- ✓ El proceso para la precalificación de las obras de saneamiento y rehabilitación de la Planta de Aguas Residuales (PTAR) en San Pedro de Macorís fue publicado el 24 de abril de 2025, con fecha límite de entrega el 09 de junio de 2025.

2.2 Gestión Financiera y Administrativa del Programa.

Los Datos Financieros Generales del Programa se muestran a continuación:

- ✓ **Monto Actual total Aprobado del Programa:** USD 140,000,000
- ✓ **Monto Desembolsado a junio, 2025:** USD **22,340,825**
- ✓ **Monto desembolsado en segundo trimestre, 2025:** USD 22,000,000
- ✓ **Monto Comprometido a junio, 2025:** USD 95,291,998
- ✓ **Monto Pagado a junio 2025:** USD **516,539.00**
- ✓ **Avance Desembolsados:** 15.96% con relación al monto total.

2.2.1 Gestión Financiera.

El presupuesto del Programa y los avances de la Ejecución a la fecha se describen a continuación:

- **El componente 1** no presentan ejecución financiera, mientras que el componente 2 y los gastos de Administración presentan una ejecución de **USD 516,539.46**, lo que representa un 0.37% del monto en relación al monto total del Programa.
- Del total ejecutado (**USD 516,539.46**), corresponde al trimestre abril a junio de 2025 el monto de la ejecución es de **USD 191,003.**
- El porcentaje de la ejecución acumulada (**USD 516,536.46**) es de 2.3% con relación al monto total desembolsado al Programa (**USD 22,340,825.0**).

El siguiente cuadro muestra los resultados de inversiones a la fecha:

Cuadro No. 1: Presupuesto y avances de la ejecución a junio de 2025.

Componentes	Valores en USD				% Ejecución acumulada
	Presupuesto Actual	Monto Comprometido/ Contratado	Ejecutado acumulado	Por ejecutar	
Componente 1 - Expansión y optimización de la infraestructura de saneamiento	127,212,000	94,112,131	-	127,212,000	0.00%
Componente 2 - Fortalecimiento Institucional y mejora de eficiencia en el sector	7,288,000	111,799	87,663	7,200,337	1.20%
Administración u otros gastos contingentes	5,000,000	843,849	417,041	4,582,959	8.34%
Auditoría, monitoreo y evaluación	500,000	224,220	11,835	488,165	2.37%
TOTAL	140,000,000	95,291,998	516,539	139,483,461	0.37%

El detalle de los ingresos y egresos del Programa a junio de 2025, se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro no. 2: Ingresos y egresos del Programa hasta junio, 2025 en USD.

Semestre/Trimestre	Ingresos Acumulado al periodo (USD) (a)	Egresos acumulados (USD) (b)	Por ejecutar (USD) (a-b)
Año 2024	340,825	240,509	100,316
Enero a marzo, 2025	22,340,825	352,638	21,988,187
Abril a junio, 2025	22,340,825	516,539	21,824,286
Total a la fecha	22,340,825	516,539	21,824,286

2.2.2.- Gestión Administrativa y de Planificación del Programa.

Las principales actividades se describen a continuación:

- ✓ Los avances en la elaboración de Términos de Referencias, solicitudes y aprobaciones de No Objeción de procesos, se detallan a continuación:
 - **CCIN-013-2024-INAPA-CORAABO-BID: Coordinador Componente I y División Técnica Componente II.-** TDR remitido al BID en fecha: 23 de agosto de 2024. El 27 de enero de 2025 se realizó la evaluación del proceso. Publicado en una segunda convocatoria el 04 y 06 de junio de 2025.

- **Especialista Agua Potable (CCIN-014-2024-INAPA-CORAABO-BID)**. Remitido al BID en fecha 19 de agosto de 2024. El 04 de febrero de 2025 se remitió la Evaluación del proceso para la contratación de una Especialista. Periodo de contratación de 01 de marzo de 2025 al 28 de febrero de 2026.
 - **Analista Financiero (CCIN-012-2024-INAPA-CORAABO-BID)**, remitido al BID en fecha 20 de septiembre de 2024. Se realizó el informe de evaluación. El 21 de febrero de 2025, se remite la Evaluación y el contrato negociado al BID. Fecha de contrato 12 de marzo de 2025. Periodo de contratación de 01 de abril de 2025 al 31 de marzo de 2026. Registro de contrato en el BID en fecha 16 de abril de 2025.
 - **Analistas Ambientales del Programa (CCIN-001-2025-INAPA-CORAABO-BID)**, en enero de 2025 se elaboran los TDR, al finalizar marzo de 2025 se encuentran en revisión en el BID. Publicado 04 y 05 de junio de 2025.
 - **SBMC-001-2024 INAPA CORAABO BID, Servicios de Auditoría Externa del Programa**. El 13 de marzo de 2025, se remitió para la No Objeción del BID, por la plataforma del BID (Portal del Cliente) la evaluación final y el contrato negociado del Proceso. No Objeción del BID recibida en fecha 18 de marzo de 2025, a través del Portal del Cliente. Contratado para el periodo de vigencia del Contrato 2025 a 2028.
- ✓ El BID preparó con el INAPA la Segunda Fase de este Programa para las ciudades de Higüey, San Pedro de Macorís y La Romana; por tanto, con los fondos de Cooperación Técnica elabora los documentos Ambientales y Sociales de la Nueva Operación, el INAPA a través de la DEPPI ha revisado los documentos y se encuentran publicados en la página WEB del INAPA: <https://www.inapa.gob.do/transparencia/portal-institucional/proyectos/2da-fase-ciudades-turisticas-y-costeras>

Procesos de adquisiciones contratados en el presente periodo del Programa:

- 1.- **CCIN-004-2024-INAPA-CORAABO-BID: *Contratación de Especialista Encargado de Planificación***, No Objeción del BID en fecha 10 de abril de 2025 con vigencia hasta el 30 de abril de 2026.
- 2.- **CCIN-002-2024-INAPA-CORAABO-BID: *Consultor Especialista en finanzas del Programa*** El Plazo de vigencia es del 01 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026.
- 3.- **CCIN-001-2023-INAPA-CORAABO-BID: *Contratación del Coordinador General*** No Objeción del BID en fecha 10 de junio de 2025 con vigencia hasta el 20 de diciembre de 2025.
- 4.- **CCIN-005-2024-INAPA-CORAABO-BID: *Consultoría supervisión de Obras Junior***- Dos (2) contratos (recontrataciones) para continuar el levantamiento de información para el Catastro. Cuarta Contratación. Periodo del 15 de junio de 2025 a 14 febrero de 2026.
- 5.- **El Contrato de la LPI-O-001-2024: Macro Infraestructura de Saneamiento de Boca Chica: Diseño y Construcción de Obras de Alcantarillado Sanitario; Diseño y Construcción de Microtunelación; Diseño y Construcción de Emisario**, firmado en fecha del 02 de abril de 2025.

2.3 Gestión Técnica y Avances de las Actividades.

A finalizar el año, el Plan de Adquisiciones en su versión No. 7 contempla un total de 42 procesos activos de Adquisiciones con un monto aproximado de **140.0** millones de dólares norteamericanos (sin incluir los procesos declarados desiertos) de los cuáles al finalizar el mes de junio de 2025 se encuentra contratado el

monto de **95,291,998 dólares americanos**, y en el tercer trimestre de 2025, se espera realizar la contratación del proceso de obras de las Redes Secundarias y el proceso de Firma Supervisora para el seguimiento técnico del Diseño y construcción del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de la ciudad de Boca Chica.

Los procesos de selección y contratación del presente año corresponden a la conformación de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), consultorías individuales para el Componente II, gastos operativos y de operación de la Unidad, el siguiente cuadro muestra el detalle de las cantidades.

El cronograma del Programa se resume a continuación:

Cuadro No. 3: Programación estimada de avance del Programa.

Componente	Descripción	2024		2025		2026		2027		2028
		1er S	2do S	1er S	2do S	1er S	2do S	1er S	2do S	1er S
Componente 1 - Expansión y optimización de la infraestructura de saneamiento	Programado	D-50%	D-40%	D-10%	E-20%	E-25%	E-45%	E-10%	OPE R	OPER
	Avance	D-100%- Contrato Finalizado								
Componente 2 - Fortalecimiento Institucional y mejora de eficiencia en el sector	Programado	0%	D-20%	D-0%	D-30%	E-55%	E-25%	E-25%	E-25%	E-25%
	Avance	D-20% Procesos en planificación								

D: Proceso de contratación de Diseño y construcción (% de actividades de contratación).

E: Ejecución- % de avance Físico (Contratos) a la fecha y Programado.

El detalle para cada uno de los componentes es el siguiente:

2.3.1.- -Expansión y optimización de la infraestructura de saneamiento.

El diseño conceptual del sistema de saneamiento para la zona de Boca Chica, Andrés y La Caleta fue preparado de manera conjunta con el BID. Está formado por los siguientes componentes:

- Red Alcantarillado Sanitario
- Colectoras
- Líneas de Impulsión
- Estaciones de Bombeo
- Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
- Emisario Submarino

El proyecto está dividido en doce (12) cuencas de drenajes que descargan en los colectores maestros, con una longitud total proyectada de 23,770 m, de los cuales 11,220 m se tienen considerados para colocar con metodología no destructiva (MND). De igual forma, se tiene una longitud proyectada de redes secundarias de 250,000 m.

Se contará con un total de siete (7) estaciones de bombeo ubicadas en áreas estratégicas, para poder impulsar las aguas negras hacia la nueva planta de tratamiento y emisario submarino. La longitud proyectada de la línea de impulsión es de 6,740 m.

En el proceso de tratamiento de las aguas residuales, se tienen 3 etapas o fases:

- Pretratamiento (PTAR): Pozo de gruesos, desbaste de sólidos, desarenado, desengrasado (aireado), medición (Aforador Parshall) y desinfección.
- Transporte.
- Tratamiento Biológico Submarino: Emisario en Punta Caucedo.

Estas obras se han diseñado para un periodo de 50 años para el proyecto, con inicio del plan Maestro en 2022 (211,610 habitantes) y fin de plan en 2072 (388,811 habitantes). Para las demás macroestructuras (EBs, líneas de impulsión, pretratamiento y emisario submarino) se adoptó un período de 30 años, con el fin de plan en el año de 2052 (318,454 habitantes).

En el **Componente 1** se espera completar los procesos de selección y contratación de obras, y la supervisión de los proyectos en los próximos meses.

- El Diseño de detalle se encuentra incluido en el Proceso de **LPI-O-001-2023 INAPA-CORAABO-BID: Licitación Macro Infraestructura de Saneamiento de Boca Chica: Diseño y Construcción de Obras de Alcantarillado Sanitario; Diseño y Construcción de Microtunelación; Diseño y Construcción de Emisario Submarino y la operación de Instalaciones de bombeo y tratamiento de aguas residuales**. La apertura de la oferta financiera fue realizada el 07 de octubre de 2024. El 28 de febrero de 2025, fue realizada la notificación del Proceso de licitación. El proceso de formalización y posterior registro de contrato se encuentra en proceso, al finalizar el mes de marzo de 2025. Los trabajos iniciarán en el tercer trimestre de 2025.
- Se realizó la publicación del proceso para la selección y contratación de proveedores para el Proceso **LPI-O-001-2024: Construcción de Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias por Resultados del Alcantarillado Sanitario de Boca Chica**, publicado el Llamado a licitación el 16 de julio de 2024 a través de la prensa escrita y en las páginas del INAPA y la ONU. Las ofertas para cuatro (4) Lotes se recibieron en fecha 23 de septiembre de 2024. Se remite al BID, en fecha 14 de marzo de 2025 el informe de evaluación técnico. El 28 de abril de 2025 fue realizado el acto de apertura de este proceso. El informe de evaluación combinado fue elaborado a la espera del borrador de contrato negociado para someter al BID a la No Objeción.
- El proceso para la Selección y Contratación de una Firma Supervisora para los diseños y construcción de las obras de Macroinfraestructuras y Redes Secundarias: **SBCC-001-2023 INAPA-CORAABO-BID Supervisión de Obras de Diseño + Construcción + Operación y Redes Secundarias por Resultados**, se encuentra en proceso de evaluación de las ofertas técnicas y económicas al finalizar el mes de diciembre de 2024. En fecha 14 de marzo de 2025, el BID emite la No Objeción al Informe Técnico de evaluación del proceso. El 28 de abril 2025 se realizó el Acta de Comprobación Notarial Apertura Ofertas Financieras, y el acta de negociación se encuentra en proceso de revisión para la solicitud de no objeción al BID.

2.3.2.- Fortalecimiento Institucional y mejora de eficiencia en el sector.

En el componente 2 se preparan los levantamientos de información, para determinar los procesos de Adquisiciones, determinación y preparación de Especificaciones Técnicas y Términos de referencia que se incluirán en este Componente tanto para la CORAABO como para el INAPA.

Los levantamientos de las infraestructuras de agua potable se realizan para: Boca Chica, San Pedro de Macorís, La Romana y la ciudad de Higüey. (ver gráficos anexos a este informe).

Además, se preparan los perfiles, EIAS y PGAS del Proyecto Agua Potable, Saneamiento y reúso en Bávaro-Punta Cana (DR-L1172), y apoyo en a la implementación del Enfoque de Género e Inclusión en el INAPA.

Las principales actividades realizadas entre abril a junio de 2025, son las siguientes:

2.3.2.1 Gestión Ambiental y Social.

A. Análisis y Revisión Documental

- **Políticas internas del INAPA:** Análisis crítico de los documentos institucionales relacionados con género e inclusión, con recomendaciones para su alineación con estándares internacionales.
- **Normativas de organismos multilaterales (BID/WBG):** Revisión de documentos clave como NDAS 9, guías sobre prevención de discriminación y notas de buenas prácticas sobre gestión de riesgos de abuso sexual, para propuesta de protocolo de prevención de VSG del INAPA.
- **Publicaciones especializadas:** Consulta de recursos para ampliar el análisis.
- **Revisión técnica del EIAS del Proyecto Bávaro –Verón - Punta Cana (DR–L1172):** Análisis y observaciones al primer borrador del estudio.
- **Revisión Técnica del EIAS y el PGAS del Proyecto Bávaro – Verón - Punta Cana (DR-L1172):** Análisis y recomendaciones. (informe final)

B. Planificación Estratégica y Desarrollo de Herramientas Ambientales y Sociales

- **Informe de Evaluación sobre Género e Inclusión del INAPA:** Remitido al BID en mayo de 2025, este informe presenta un diagnóstico institucional detallado, identifica las principales barreras para la equidad de género y la inclusión, y formula recomendaciones estratégicas. El documento incluye anexos técnicos como el plan de capacitación, el compendio normativo institucional y la propuesta de encuesta para la autoevaluación sobre violencia sexual y de género.
- **Perfiles básicos SNIP:** Elaboración de los borradores de los perfiles para el Acueducto Múltiple y el Alcantarillado Sanitario Verón–Punta Cana–Macao.
- **Misión ESG (24-27 junio):** Participación en visitas a campo, talleres con comunidades y actores del sector turístico para validar estudios y socializar el enfoque ambiental, social y de gobernanza (ESG) del Proyecto de Agua Potable, Saneamiento y Reúso en Bávaro Punta Cana (DR-L1172).

C. Coordinación Interinstitucional y Seguimiento Técnico

- **Reuniones claves:**
 - Con equipos del INAPA, BID y consultores para coordinar el diseño de herramientas, seguimiento de estudios, y cumplimiento de normativa NDAS.
 - Con el Consultor Jurídico del INAPA para integrar el componente social en procesos de adquisición de tierras y reasentamiento involuntario (NDAS5) y dar seguimiento al informe de tasación de los terrenos realizados en Boca Chica. (primera visita de evaluación)
 - Con el MEPYD y la Dirección de Planificación y Desarrollo de INAPA, para articular esfuerzos orientados a apoyar el cumplimiento de las metas del Plan de Acción de Género (PAG) de INAPA. (Reuniones realizadas el 13 y 20 de junio de 2025)
- **Visitas Técnicas (7-8 abril) Bávaro-Verón-Punta Cana:**
 - Acompañamiento a la firma contratada en la Investigación Social en levantamientos de información socioeconómica. (DR-L1172)
 - Contacto con actores comunitarios clave y fortalecimiento de legitimidad institucional. (DR-L1172)
- **Comunicación institucional:**
 - Envío y seguimiento de oficios a entidades locales para coordinación y apoyo en evaluaciones. (DR-L1172)
 - Apoyo al BID en el envío y seguimiento de invitaciones a los talleres con organizaciones sociales y sector turístico (DR-L1172)).
- **Participación en reuniones nacionales:**
 - Revisión del EIAS del Proyecto DR-L1172 (20 de mayo de 2025).
 - Reactivación de SIASAR 3.0 (8 abril de 2025).
 - Avance del Proyecto de Rehabilitación Boca Chica del MIVHED (2 junio de 2025).
 - Reuniones preparatorias para Misión ESG (3 y 17 junio de 2025).

D. Fortalecimiento de Capacidades y Gestión del Conocimiento

Participación en diversas actividades formativas orientadas a consolidar capacidades técnicas y estratégicas:

- **Normas de Desempeño Ambiental y Social (NDAS – BID):**
 - Cursos NDAS 1, 2, 9 y 10, incluyendo sesión presencial en el BID (27 de mayo de 2025).
- **Talleres y cursos BID:**
 - “Ejecutar para Impactar” (22-24 abril de 2025).
 - “Proyectos BID: del diseño al cierre”. (abril de 2025)
 - Curso Inspecciones de Cumplimiento Ambiental y Social - SECI – Etapa 1 (30 mayo de 2025).
 - Curso Inspecciones de Cumplimiento Ambiental y Social - SECI –Etapa 2 (16 junio de 2025)
 - Taller de Fortalecimiento en el Marco de Política Ambiental y Social del Equipo de INAPA (24 de junio de 2025)

2.3.2.2 Fortalecimiento Tecnológico para la UCP, INAPA y CORAA´s

El Programa realizó la contratación de un Especialista en Tecnología para la planificación, desarrollo e implementación del Fortalecimiento tecnológico para la UCP, INAPA y las CORAA´s, preparar estrategias

enfocadas en el cumplimiento normativo y estándares de calidad del sector agua y saneamiento mediante la optimización de procesos operativos para la automatización tecnológica, que permitan ser replicadas a nivel de sector agua y saneamiento, las actividades realizadas se detallan a continuación:

- a) Levantamiento de las necesidades para la implementación de un sistema de información y el fortalecimiento de INAPA y CORAABO. Este diagnóstico permitirá a establecer las bases tecnológicas sólidas para identificar las oportunidades de mejora e implementación de soluciones innovadoras que beneficien directamente los objetivos estratégicos del sector. Para estos fines se realizan reuniones de coordinación con cada una de las áreas.
- b) Apoyo a la UCP en la definición de Términos de Referencia referentes a equipos móviles para trabajo en campo del Programa.
- c) Supervisión Técnica de dos (2) consultorías del INAPA relacionadas con sistema de información comercial y la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales.
- d) Seguimiento y Asesoría en la implementación del Sistema de Información para la Gestión Comercial (SIC) que incluye:
 - i. Dos (2) módulos adicionales en INAPA Central: i) Módulos de Pagos vía WEB y ii) Módulo satélite para reportes.
 - ii. Diseño de Datamart para Migración de base de datos histórica (período 2015-2024), principalmente del ERP legacy.
 - iii. Realizar capacitaciones a 10 usuarios a nuevas funcionalidades, incluyendo personal técnico para la instalación, así mismo también la elaboración de un manual de uso para futuro nuevos usuarios.
- e) Realizar actividades de Soporte y Mantenimiento:
 - a. Mantenimiento preventivo a 15 equipos informáticos
 - b. Actualizaciones de sistemas operativos y software de seguridad
 - c. Administración de Licencias del Programa
 - d. Implementación de Seguridad y Respaldos
- f) Participar en Evento de capacitación Especializada del Programa: *"Taller "Potenciando el Saneamiento y Agua Potable con Herramientas Abiertas"* del 18 al 21 de marzo de 2025.
- g) Realizar asignaciones Especiales y complementarias, tales como:
 - a. Apoyo Técnico de Microsoft Project al Programa
 - b. Extracción y Análisis de Datos PostgreSQL, Gestión y análisis de base de datos
 - c. Apoyo para Indicadores de Desempeño Comercial: Obtención y Procesamiento de datos para la obtención de indicadores, tales como; i) índice de eficiencia de cobranza mensual y trimestral, ii) porcentaje de usuarios con medición vs usuarios con tarifa fija, iii) Tiempo promedio de respuesta a solicitudes comerciales, iv) Indicadores de satisfacción del cliente basados en encuestas digitales.
- h) Implementación de NORTIC para CORAABO:** Normativa, documentación y procedimientos.
 - a. Evaluación del estado actual de cumplimiento de NORTIC en CORAABO, creación de manual de procedimientos y el cronograma de cumplimiento de auditorías internas.
 - b. Desarrollo de plan de implementación de normativas aplicables al sector agua potable y saneamiento.

- c. Se estableció un canal de comunicación con el personal TIC de INAPA para el apoyo en la elaboración de políticas internas alineadas con NORTIC-A2 (Seguridad de la Información).
- d. Asesoría para Implementación de NORTIC-A3 (Gestión de Tecnologías de Información)
- e. Capacitación a personal directivo y técnico sobre requisitos normativos.

2.4 Indicadores del Programa y Avances.

Los avances en los indicadores del Programa iniciarán su medición una vez realizada las contrataciones de las Firmas Consultoras y los procesos de obras que se encuentran programados en el marco de desarrollo de este Programa.

Cuadro no. 4: Lista de Indicadores y valores metas.

Descripción	Valores Metas	2026-2027
1.1 Hogares con acceso a saneamiento gestionando de forma segura	40,000	-
2.1 Tasa de micro-medición de las localidades intervenidas	40%	-
2.2 Porcentaje de clientes facturados en las localidades intervenidas	80%	-
2.3 Consumo de energía en los sistemas electromecánicos (bombeo de agua potable en las localidades intervenidas	85	-


ANEXO I: Procesos de Adquisiciones y Seguimiento.

Descripción	Detalles del Avance
<p>LPI-O-001-2023-INAPA-CORAABO-BID: Licitación Macro Infraestructura de Saneamiento de Boca Chica: Diseño y Construcción de Obras de Alcantarillado Sanitario; Diseño y Construcción de Microtunelación; Diseño y Construcción de Emisario Submarino y la operación de Instalaciones de bombeo y tratamiento de aguas residuales</p>	<p>El 11 de julio de 2024 fueron recibidas las ofertas técnicas y económicas.</p> <p><i>Firmado en fecha del 02 de abril de 2025.</i></p> <p><i>En fase de emisión de la Garantía Bancaria para el Anticipo.</i></p>
<p>SBCC-001-2023-INAPA-CORAABO-BID: Supervisión de Obras de Diseño + Construcción + Operación y Redes Secundarias por Resultados</p>	<p>El 27 de junio de 2024 fueron recibidas las ofertas técnicas y económicas. Se elaboró el informe Técnico y el BID emitió la No Objeción en fecha 14 de marzo de 2025, y se remitió la Notificación a los seleccionados en la Lista Corta, El Acto de apertura Financiera fue realizado el 26 de marzo de 2025.</p> <p><i>Actualmente en fase de revisión y negociación del Contrato.</i></p>
<p>LPI- O-001-2024: Construcción de Redes Secundarias y conexión de domiciliarias por Resultados del Alcantarillado Sanitario de Boca Chica</p>	<p>Proceso publicado el 16 de julio de 2024. Las ofertas fueron recibidas en fecha 23 de septiembre de 2024.</p> <p><i>Se remite al BID en fecha 14 de marzo de 2025 el reporte de evaluación de estas obras.</i></p> <p><i>El 28 de abril de 2025 fue realizado el acto de apertura de este proceso.</i></p> <p><i>Actualmente en fase de adjudicación de la oferta.</i></p>
<p>SBCC-001-2024-INAPA-CORAABO-BID: Servicios de Monitoreo de datos oceanográfico emisario La Romana (Expresión de Interés)</p>	<p>Expresión de interés publicada en fecha 13 y 16 de septiembre de 2024. Está programa la recepción de documentos para el 14 de octubre de 2024.</p> <p>El BID emite la No Objeción en fecha 14 de marzo de 2025 al informe de evaluación de la SEI y lista corta/SDP. El informe de evaluación Técnica fue realizado el 16 de junio de 2025.</p> <p><i>Se recibieron las propuestas y se espera realizar la apertura económica en el mes de julio de 2025.</i></p>
<p>CP-BS-001-2024-INAPA-CORAABO-BID: Adquisición de seis (6) Plotters y consumibles.</p>	<p>Remisión de invitación el 04 de diciembre de 2024. Evaluado el 14 de marzo de 2025.</p> <p><i>Las ofertas y los bienes fueron entregados en junio de 2025.</i></p>
<p>INAPA-LPI-O-001-2024: Obras de Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Higüey</p>	<p>El 20 de noviembre de 2024, fue publicado el proceso. En enero de 2025, se elaboran las respuestas a enmiendas y preguntas del proceso Precalificación- No Objeción CID/CDR-5/2025. El 10 de marzo de 2025 se realizó la recepción de los documentos de precalificación.</p> <p><i>Se encuentra actualmente en fase de evaluación de los documentos de precalificación.</i></p>
<p>i. Gestor de Contratos (CCIN-006-2025-INAPA-CORAABO-BID)</p>	<p>Publicación del proceso en fecha 04 y 05 de junio de 2025, con fecha de entrega el 25 de junio de 2025.</p>


Descripción	Detalles del Avance
<p>ii. TDR de Analista Ambiental (CCIN-001-2025-INAPA-CORAABO-BID).</p> <p>iii. CCIN-002-2025-INAPA-CORAABO-BID – Consultor (a) Individual Analista en Diversidad y Género</p> <p>iv. Coordinador/a del Componente 1 (AP) y División Técnica Componente 2. (CCIN-013-2024-INAPA-CORAABO-BID),</p>	
<p>Proceso <i>No. INAPA-LPI-0-001-2025 II Obra Ampliación del Sistema de Alcantarillados Sanitario:</i> a) Construcción Colectores con Zanjas y Métodos No Destructivos (MND), Línea de Impulsión y estaciones de bombeo, (b) Diseño Estructural de la Planta de Tratamiento y la Construcción de una planta de Tratamiento Secundario Biológico junto con la Operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales por 18 meses- San Pedro de Macorís.</p>	<p>Publicado el 24 de abril de 2025, para recibir los documentos el 09 de junio de 2025</p>

Levantamiento de información georeferenciada


Esquema de Sistemas de Geolocalización CORAABO (Boca Chica)

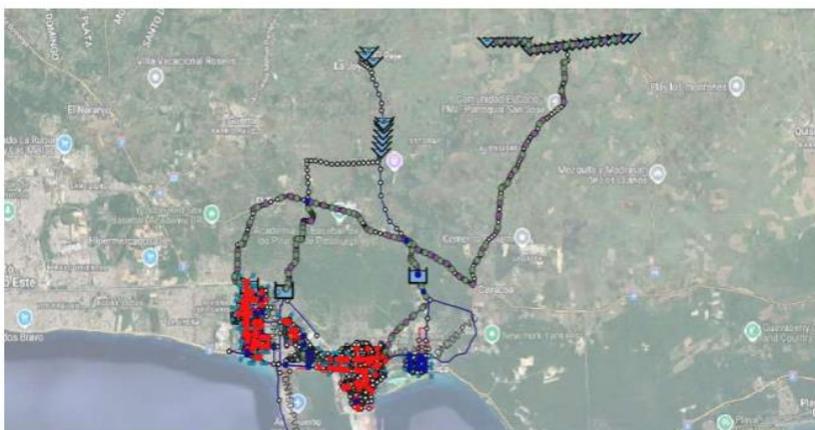

Esquema de Sistemas de Geolocalización CORAAROM (La Romana)

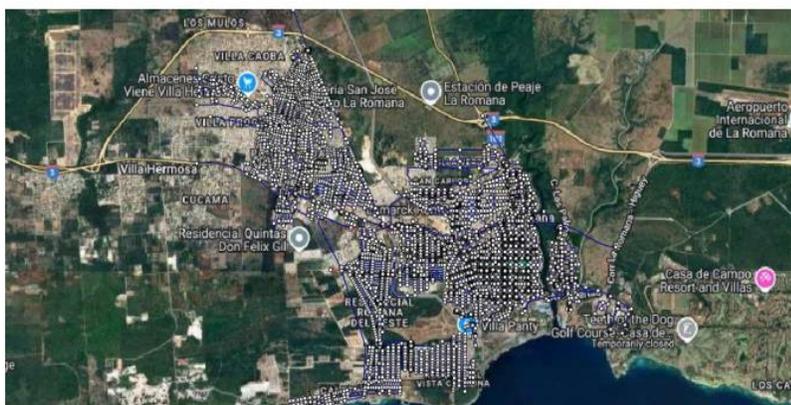

Esquema de Sistemas de Geolocalización INAPA-Higüey

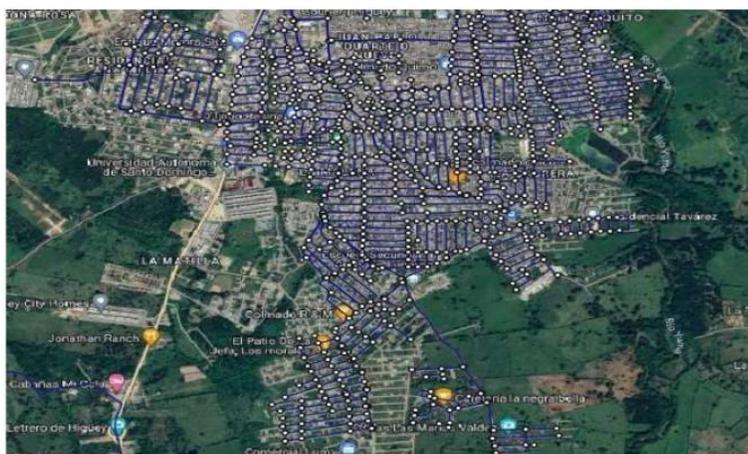

Publicaciones realizadas.

Cristina Diaris SANTO DOMINGO, RD. JUEVES, 24 DE ABRIL DE 2025 **7**

La República



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Programa de Saneamiento Universal en Ciudades Costeras y Turísticas II

ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES
Llamado a la precalificación
No. INAPA-LPI-0-001-2025 II

País: República Dominicana
Proyecto: Programa de Saneamiento Universal en Ciudades Costeras y Turísticas II
No. De Préstamo: N° 5915/OC-DR

Obras: Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario de San Pedro de Macorís: (a) Construcción colectores con zanja y Métodos No Destructivos (MND), líneas de impulsión y estaciones de bombeo, (b) Diseño estructural de la Planta de Tratamiento y la Construcción de una Planta de Tratamiento Secundario Biológico junto con la Operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales por 18 meses (promogables).

El Gobierno de la República Dominicana ha solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo un préstamo para financiar el costo del Programa de Saneamiento Universal en Ciudades Costeras y Turísticas II, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos estipulados en los Contratos de construcción colectores, Diseño y Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y la Operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) se propone precalificar contratistas y/o firmas para el Diseño y Construcción de Obras de Alcantarillado para Aguas Residuales, Diseño de la Planta de Tratamiento y la Construcción de una Planta de Tratamiento Secundario Biológico, y la Operación de Instalaciones Sanitarias con bombeo y tratamiento de aguas residuales en la ciudad de San Pedro de Macorís, Prov. San Pedro de Macorís.

La precalificación se efectuará conforme al procedimiento de precalificación estipulado en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada *Políticas para Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15* de julio 2019 y vigente en enero 2020, podrán participar en ella todos los oferentes de origen de países elegibles, según se definen en dichas Políticas.

Los potenciales solicitantes elegibles que estén interesados podrán solicitar información adicional e inspeccionar los documentos de precalificación en: Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) en la dirección que se indica al final de este formulario, de 8:00 A.M. a 4:00 P.M. (Hora local).

Los oferentes interesados podrán solicitar un juego completo de documentos de precalificación en español, solicitándolo por escrito a la dirección que se indica al final de este formulario. El documento será enviado por correo electrónico.

Las Solicitudes de precalificación deberán hacerse llegar a la dirección que se indica al final de este formulario a más tardar el **lunes 9 de junio de 2025, a las 10:00 A.M.**, hora local de la República Dominicana en un sobre cerrado en forma inviolable y marcado claramente de la siguiente manera: "Solicitud de precalificación para las Obras: Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario de San Pedro de Macorís: (a) Construcción colectores con zanja y Métodos No Destructivos (MND), líneas de impulsión y estaciones de bombeo, (b) Diseño estructural de la Planta de Tratamiento y la Construcción de una Planta de Tratamiento Secundario Biológico junto con la Operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales por 18 meses (promogables)".

Para fines de solicitud de información del proceso deben escribir al correo electrónico: inapa.dpps@inapa.gob.do con copia: Jose.martinez@inapa.gob.do y nicolas.grullon@inapa.gob.do.

Los documentos de Solicitudes de precalificación deben ser depositados en la siguiente dirección: Calle Guaracuya, Edif. INAPA, 2do piso, Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos de Inversión (DEPPI), Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Centro Comercial El Millón, Código postal 10142, Santo Domingo, República Dominicana.

Wellington A. Arnaud Bisonó
Director Ejecutivo



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Programa de Saneamiento Universal de Ciudades Turísticas y Costeras
Convenio de Préstamo Núm. 5637/OC-DR y 5638/03-DR

**INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIÓN DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL**

Selección de Consultor Individual No. CCIN-013-2024-INAPA-CORAABO-BID (segunda convocatoria), CCIN-001-2025-INAPA-CORAABO-BID, CCIN-002-2025-INAPA-CORAABO-BID y CCIN-006-2025-INAPA-CORAABO-BID

El Gobierno de la República Dominicana ha recibido financiamiento mediante el Contrato de Préstamo Núm. 5637/OC-DR y 5638/03-DR suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la ejecución del Programa de Saneamiento Universal de Ciudades Turísticas y Costeras (DR-L1158) (el "Programa") a través del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), que en calidad de organismo ejecutor, emite el presente llamado para contratación de servicios de consultoría individual para Coordinador/a del Componente 1 y División Técnica Componente 2 (CCIN-013-2024-INAPA-CORAABO-BID), Analistas Ambientales (CCIN-001-2025-INAPA-CORAABO-BID), un/a Analista en Diversidad y Género (CCIN-002-2025-INAPA-CORAABO-BID) y un/a Experto en Gestor de Contratos (CCIN-006-2025-INAPA-CORAABO-BID).

- 1- **CCIN-013-2024-INAPA-CORAABO-BID** – Consultor (a) Individual Coordinador/a del Componente 1 y División Técnica Componente 2 (segunda convocatoria) para realizar la coordinación del Componente 1. Expansión y optimización de la infraestructura de Saneamiento conforme a los diseños y normativa nacional; y a la normativa ambientales y sociales establecidos en el Programa; así como el Reglamento Operativo y el Contrato de Préstamo, y los aspectos técnicos relacionados a construcciones de obras de abastecimiento de agua potable del Componente 2.
- 2- **CCIN-001-2025-INAPA-CORAABO-BID** – Consultor (a) Individual Analista Ambiental para realizar el seguimiento para el cumplimiento de las estipulaciones relativas a la Gestión Ambiental establecidas en los contratos de obras de infraestructuras y de servicios de consultorías, conforme a los planes ambientales y sociales elaborados para el Programa con el fin de asegurar la reducción de los riesgos ambientales y sociales durante el desarrollo de los proyectos del Programa de conformidad a lo indicado en el Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del Banco (GN-2965-23), sus Normas de Desempeño Ambientales y Sociales, así como con sus respectivas guías de implementación, el plan de acción ambiental y social del Programa (PAAAS).
- 3- **CCIN-002-2025-INAPA-CORAABO-BID** – Consultor (a) Individual Analista en Diversidad y Género para brindar asistencia técnica en la incorporación del enfoque de género e inclusión social en los proyectos financiados por el BID y en los temas de conectividad y de comportamiento para los contratos de agua, tanto con el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), como para la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, en la República Dominicana, asegurando el cumplimiento de normativas y promoviendo el impacto positivo en la equidad social.
- 4- **CCIN-006-2025-INAPA-CORAABO-BID** – Consultor (a) Individual Experto en Gestor de Contratos para supervisar y realizar el control integral de los contratos incluyendo el contrato bajo modalidad FIDIC, asegurando el cumplimiento de los objetivos del proyecto en términos de calidad, tiempo y costo, y de las cláusulas contractuales relativas a seguros, y aspectos legales vinculados al ambiente, seguridad y salud durante la construcción de las obras.

El perfil para estas funciones requiere, según aplique: i) Profesionales con título universitario con experiencia laboral mayor a tres (3), ocho (8) años y diez (10) años, ii) evidenciar al menos ocho (8) años de experiencia en diseño de obras civiles, cinco (5) años o cinco (5) proyectos en gestión de proyectos de construcción, preferentemente FIDIC, tres (3) años en proyectos de género, diversidad e inclusión, iii) al menos cuatro (4) años de experiencia en diseño de sistemas de alcantarillados sanitarios y/o plantas de tratamiento de aguas residuales, dos (2) años en dirección/supervisión de proyectos desarrollados para organismos internacionales, iv) familiaridad con las normativas del BID en igualdad de género y diversidad, certificación PMP, FIDIC o similar, conocimiento de normativas nacionales e internacionales ambientales, de riesgos y/o de seguridad y salud y v) Al menos cuatro (4) años de experiencia en diseño de sistemas de alcantarillados sanitarios y/o plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros.

Términos de Referencia disponibles en el siguiente enlace: <https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/69-inapa-coraabo-bid>.

La selección y contratación del consultor se llevará a cabo conforme al procedimiento estipulado para Consultorías Individuales, establecido en la Sección V de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-15), edición de mayo 2019, y podrán participar en ella todos los consultores individuales elegibles de los países miembros del BID.

Las expresiones de interés o postulaciones deberán dirigirse al **Ing. José Martínez Bonetti** a más tardar el día **veinticinco (25) del mes de junio del año 2025**, en sobre cerrado indicando en la portada el nombre de la Consultoría a la cual aplica, a la dirección: Unidad Coordinadora del Programa (UCP)/Dirección de Programas y Proyectos Especiales (DPPE).

Dirección: Edificio INAPA, segundo piso, calle Guarocuya, Centro Comercial El Millón, Santo Domingo, D.N., República Dominicana.

Teléfono: (809) 567-1241 hasta el 49; Exts. 11250, 11236 o bien vía correo electrónico, a la dirección inapa.dppe@inapa.gob.do, con copia a jose.martinez@inapa.gob.do y nicolas.grullon@inapa.gob.do.

Wellington A. Arnaud Bisonó
Director Ejecutivo
