

INAPA | INSTITUTO NACIONAL
DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS

INFORME SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2024

PROGRAMA SANEAMIENTO UNIVERSAL CIUDADES TURÍSTICAS Y COSTERAS

No. 5630/OC-DR y 5638/KI-DR

Periodo: Julio a septiembre de 2024.




Ing. Nicolás E Grullón Valdez

**Director Interino de Programas y Proyectos
Especiales**



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

INAPA

DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROGRAMAS ESPECIALES

UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA

ÍNDICE

<u>I.- Descripción y Contexto del Programa.</u>	3
<u>II.- Resumen de las actividades, gestión Financiera y Administrativa.</u>	4
<u>ANEXO I: Procesos de Adquisiciones y Seguimiento.</u>	9
<u>ANEXO II: Fotos de Actividad.</u>	10

I.- Descripción y Contexto del Programa.

El “*Programa de Saneamiento Universal de Ciudades Turísticas y Costeras*” de la República Dominicana firmado entre el Gobierno dominicano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el financiamiento de recursos económicos del BID, de la Facilidad de Corea para el Cofinanciamiento del Desarrollo de la Infraestructura de América Latina y el Caribe (KIF) y posteriormente se adicionará un aporte de contrapartida del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE). Este Contrato fue firmado el 23 de diciembre de 2022 y aprobado por el Congreso Nacional mediante la Resolución Núm 50-23 de fecha 02 de agosto de 2023. El Programa está estructurado en dos (2) componentes:

Componente I. Expansión y optimización de la infraestructura de saneamiento y **Componente II.** Fortalecimiento Institucional y Mejoras de Eficiencia en el Sector.

También incluye el financiamiento para el desarrollo de la gestión administrativa, auditoría, monitoreo y evaluación del Programa.

El Acuerdo para la Gestión del Programa entre INAPA y CORAABO fue firmado el 12 de septiembre de 2023 y el Acuerdo Subsidiario entre el Ministerio de Hacienda y el INAPA fue firmado en fecha 07 de diciembre de 2023.

El BID emite la No Objeción al Reglamento Operativo del Programa en fecha 24 de noviembre de 2023.

El Taller de Arranque del Programa fue realizado el 16 de febrero de 2024, y el primer desembolso del Programa se ejecuta en abril de 2024.

La Unidad Ejecutora del Programa tiene conformado un equipo contratado y del INAPA que realiza las funciones de ejecución del Programa, entre ellos: i) Coordinador del Programa, ii) Encargado de Planificación del Programa, iii) Especialista Financiera y personal adicional de la Dirección de Programas y Programas Especiales (DPPE).

En el Programa se reciben trimestralmente las Misiones de Supervisión y Evaluación y se realizan las revisiones de carteras entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), INAPA, MEPyD, Ministerio de Hacienda con los objetivos específicos de: (i) revisar los aspectos fiduciarios y técnicos, y los instrumentos de planificación e implementación con la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), INAPA y las contrapartes de CORAABO, (ii) revisar los aspectos ambientales y sociales del Programa y (iii) se realizan visita técnica a Boca Chica.

El cierre del Programa está indicado en los documentos del Convenio para la fecha del 19 de agosto de 2028 por tanto el tiempo restante es de 50 meses.

La ejecución financiera de los Programas se realiza mediante el módulo de Unidades Ejecutoras de Programas con Recursos Externos (UEPEX). En esta herramienta todas las operaciones están asociada a los Módulos de Tesorería y Contabilidad Nacional. La implantación del SIGEF es obligatoria para todas las instituciones del gobierno central y las instituciones descentralizadas autónomas que manejan recursos públicos, según el Artículo núm. 3 del Decreto Núm 9-04, de fecha 06 de enero de 2004, que crea el SIGEF.

El control interno de las operaciones es realizado por dos (2) unidades ubicadas en el INAPA, una es el área de Revisión y Control del INAPA y la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Contraloría General de la República Dominicana (CGR) con la responsabilidad de asegurar la gestión de los aspectos financieros y de adquisiciones del Programa.

Asimismo, los pagos son revisados y autorizados por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) que es una dependencia subordinada, normativa, administrativa y financiera de la CGR. bajo el ámbito de la Ley 10-07 y su reglamento de aplicación No. 491-07, a los fines de evidenciar el cumplimiento de los controles previos y la revisión documental del expediente de pago, y los contratos son registrados en el Sistema de Trámite Estructurado (TRE) de la Contraloría General de la República Dominicana (CGR).

Las conciliaciones de cuentas del Programa se realizan mensualmente y los Estados Financieros se elaboran en periodo semestrales, las cuentas e inversiones del Programa son auditadas por una Firma Auditora Externa anualmente conforme lo indica el documento del Convenio de Préstamo.

Actualmente la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) elabora la versión final del Convenio que complementa este Programa con el Ministerio de Hacienda para su aprobación, el documento de borrador inicial fue compartido al INAPA en diciembre de 2023.

Este informe resume los avances de las actividades, indicadores, gestión ambiental y social, y la gestión financiera del Programa para el trimestre julio a septiembre de 2024.

II.- Resumen de las actividades, gestión Financiera y Administrativa.

2.1 Gestión Administrativa y Financiera del Programa.

Los Datos Generales del Programa se distribuyen en:

- ✓ **Monto Actual total Aprobado del Programa:** USD 140,000,000
- ✓ **Monto Desembolsado a junio, 2024:** USD 156,825
- ✓ **Monto Desembolsado tercer trimestre, 2024:** USD 0.00
- ✓ **Monto Comprometido a septiembre, 2024:** USD 285,969
- ✓ **Monto Pagado a septiembre 2024:** USD 154,265
- ✓ **Avance Desembolsados:** 0.11% con relación al monto total del Programa

El presupuesto del Programa y los avances de la Ejecución a la fecha por componente se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 1: Presupuesto y avances de la ejecución a septiembre de 2024.

Componentes	Valores en USD				% Ejecución acumulada
	Presupuesto Actual	Monto Comprometido/ Contratado	Ejecutado acumulado	Por ejecutar	
Componente 1 -Expansión y optimización de la infraestructura de saneamiento	119,000,000	-	-	119,000,000	0.00%

Componentes	Valores en USD				% Ejecución acumulada
	Presupuesto Actual	Monto Comprometido/ Contratado	Ejecutado acumulado	Por ejecutar	
Componente 2 - Fortalecimiento Institucional y mejora de eficiencia en el sector	15,500,000	-	-	15,500,000	0.00%
Administración u otros gastos contingentes	5,000,000	285,969	154,265	4,845,735	3.09%
Auditoría, monitoreo y evaluación	500,000	-	-	500,000	0.00%
TOTAL	140,000,000	285,969	154,265	139,845,735	0.11%

Los componentes 1 y 2, no presentan ejecución financiera, mientras que los gastos de Administración, presenta un movimiento de USD 154,265, lo que representa un 3.09% del monto asignado al mismo. La ejecución acumulada del Programa respecto al monto total corresponde a un 0.11%.


Del total ejecutado (USD154,265) corresponde al presente trimestre la suma de USD 117,987, para un porcentaje de avance financiero de 75.23% con relación al monto total desembolsado al Programa.

El detalle por semestre de los ingresos y egresos del Programa a septiembre 2024, se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro no. 2: Ingresos y egresos del Programa por semestre y trimestre en USD.

Semestre/Trimestre	Ingresos Acumulado al periodo (USD) (a)	Egresos acumulados (USD) (b)	Por ejecutar (USD) (a-b)
Enero a junio, 2024	156,825	36,278	120,547
Julio a septiembre, 2024	156,825	154,265	2,547
Total a la fecha	156,825	154,265	2,547

Programación de Desembolsos para el Programa, actualizada a septiembre de 2024:

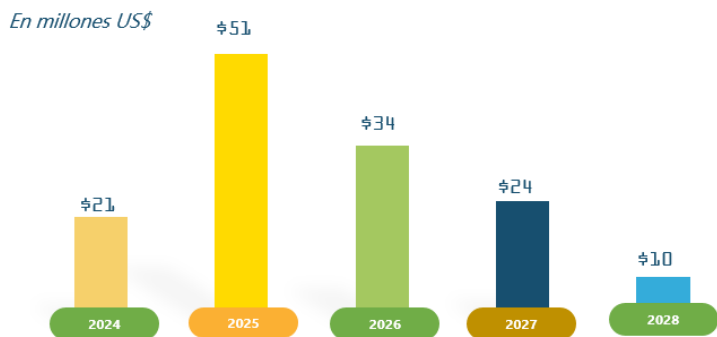

2.2 Gestión Técnica y Avances de las Actividades.

El cronograma del Programa se resume a continuación:

Cuadro No. 3: Programación estimada de avance del Programa.

Componente	Descripción	2024		2025		2026		2027	
		1er S	2do S	1er S	2do S	1er S	2do S	1er S	2do S
Componente 1 -Expansión y optimización de la infraestructura de saneamiento	Programado	D-50%	D-50%	E-15%	E-25%	E-25%	E-25%	E-10%	OPE R
	Avance	D-25%							
Componente 2 - Fortalecimiento Institucional y mejora de eficiencia en el sector	Programado	0%	D-50%	D-75%	E-15%	E-25%	E-25%	E-25%	E-10%
	Avance								

D: Proceso de contratación de Diseño y construcción (% de actividades de contratación y diseño).

E: Ejecución- % de avance Físico (Contratos) a la fecha y Programado.

El detalle para cada uno de los componentes es el siguiente:

1.- Expansión y optimización de la infraestructura de saneamiento.

En el componente 1 se espera completar los procesos de selección y contratación de obras, y la supervisión de los proyectos durante el 3er trimestre de 2024.

- El Diseño de detalle se encuentra incluido en el Proceso de LPI-O-2023 INAPA-CORAABO-BID: *Licitación Macro Infraestructura de Saneamiento de Boca Chica: Diseño y Construcción de Obras de Alcantarillado Sanitario; Diseño y Construcción de Microtunelación; Diseño y Construcción de Emisario Submarino y la operación de Instalaciones de bombeo y tratamiento de aguas residuales.*
- La Publicación de cuatro (4) Lotes, **LPI-O-001-2024 INAPA-CORAABO-BID: Construcción de Redes Secundarias para el municipio de Boca Chica** fue publicado en fecha 16 de julio de 2024, las ofertas se recibieron en fecha 23 de septiembre de 2024. Las evaluaciones están programadas para el 4to. Trimestre de 2024. Se programa contratar estos procesos antes de finalizar el año 2024.
- El proceso para la Selección y Contratación de una Firma Supervisora para los diseños y construcción de las obras de Macroinfraestructuras y Redes Secundarias: **SBCC-001-2023 INAPA-CORAABO-BID Supervisión de Obras de Diseño + Construcción + Operación y Redes Secundarias por Resultados, se encuentra en proceso de evaluación de las ofertas técnicas y económicas.** Se programa contratar estos servicios antes de finalizar el año 2024.

2.- Fortalecimiento Institucional y mejora de eficiencia en el sector.

En el componente 2 se preparan los levantamientos de información, para determinar los procesos de Adquisiciones, determinación y preparación de Especificaciones Técnicas y Términos de referencia que se incluirán en este Componente tanto para la CORAABO como para el INAPA.

Las principales actividades realizadas entre julio a septiembre de 2024, son las siguientes:

- ✓ El Comité Evaluador realiza el análisis de los documentos entregados por los proveedores que participaron en el proceso de licitación de: i) ***LPI-001-2023-INAPA-CORAABO-BID: Licitación Macro Infraestructura de Saneamiento de Boca Chica: Diseño y Construcción de Obras de Alcantarillado Sanitario; Diseño y Construcción de Microtunelación; Diseño y Construcción de Emisario Submarino y la operación de Instalaciones de bombeo y tratamiento de aguas residuales*** y ii) ***SBCC-001-2023-INAPA-CORAABO-BID: Supervisión de Obras de Diseño + Construcción + Operación y Redes Secundarias por Resultados***. Las Recepciones de estos procesos se realizaron en la fecha: 11 de julio (LPI-O-001-2023) y 27 de junio de 2024 (SBCC-001-2023).
- ✓ En fecha 6, 7 y 8 de agosto de 2024, se realizaron talleres con proveedores de las Redes Secundarias “Talleres de herramientas digitales y modelo de contrato por Resultados”, con la participación de los proveedores interesados.
- ✓ Se publica en fecha 22 y 23 de julio de 2024, la expresión de interés para la contratación de servicios de consultoría individual para un/a Asesor en Tecnología de la Información y Comunicación del Programa (**CCIN-006-2024-INAPA-CORAABO-BID**), un/a Especialista para la Gestión Social y Género (**CCIN-007-2024-INAPA-CORAABO-BID**), y un/a Especialista para la Gestión Ambiental del Programa (**CCIN-008-2024-INAPA-CORAABO-BID**).
- ✓ Se realizó la publicación del proceso para la selección y contratación de proveedores para el Proceso **LPI-O-001-2024: Construcción de Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias por Resultados del Alcantarillado Sanitario de Boca Chica**, publicado el Llamado a licitación el 16 de julio de 2024 a través de la prensa escrita y en las páginas del INAPA y la ONU. Las ofertas para cuatro (4) Lotes se entregaron en fecha 23 de septiembre de 2024.
- ✓ Los avances en la elaboración de Términos de Referencias y las aprobaciones de No Objeción de procesos no contratados en proceso de revisión, se detallan a continuación:
 - **Coordinador del Componente 1 y DT 2- TDR remitido al BID en fecha: 23/08/2024.**
 - **Especialista Legal**-remitido al BID en fecha 15/02/2024. --- Personal de INAPA-Compensación julio de 2024.
 - **Especialista Gestión Ambiental**— No Objeción del BID en fecha 18/07/2024- Publicado en fecha 22/07/2024
 - **Especialista Monitoreo y Evaluación**- remitido al BID en fecha 15/02/2024. Personal de INAPA-Compensación julio de 2024.
 - **Especialista Gestión Social y de Género**--- No Objeción del BID en fecha 18/07/2024- Publicado en fecha 22/07/2024
 - **Especialista en Tecnología y Comunicación** – No Objeción en fecha 18/07/2024. Publicado en fecha 22/07/2024.

- **Especialista en Electromecánica**- No Objeción del BID en fecha 03/04/2024. Personal de INAPA-Compensación julio de 2024.
 - **Especialista Agua Potable**, remitido al BID en fecha 19 de agosto de 2024.
 - **Especialista Recursos Humanos**, remitido al BID en fecha 19 de agosto de 2024.
 - **Analista Financiero**, remitido al BID en fecha 20 de septiembre de 2024.
 - **Especialista en Comunicaciones**, remitido al BID en fecha 20 de septiembre de 2024.
- ✓ El BID prepara con el INAPA la Segunda Fase de este Programa para las ciudades de Higüey, San Pedro de Macorís y La Romana; por tanto, con los fondos de Cooperación Técnica elabora los documentos Ambientales y Sociales de la Nueva Operación, el INAPA a través de la DPPE ha revisado los documentos y se encuentran publicados en la página WEB del INAPA:
<https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/106-programa-saneamiento-universal-localidades-costeras-y-turisticas-ii>
 - ✓ Visitas técnicas a Higüey, San Pedro de Macorís y La Romana durante los meses de julio y agosto de 2024.
 - ✓ Reuniones semanales con el BID para el seguimiento técnico del Programa.
 - ✓ Continúa el proceso de catastro de redes de acueductos en las ciudades de Higüey, San Pedro de Macorís, La Romana y Boca Chica.
 - ✓ Se publica en fecha 13 y 16 de septiembre de 2024, la Solicitud de Expresión de Interés para los “*Servicios de Monitoreo de datos oceanográfico emisario La Romana, SBCC-001-2024- INAPA-CORAABO-BID*”. La entrega de los documentos está programada **para el 14 de octubre de 2024.**

2.3 Indicadores del Programa y Avances.

Los avances en los indicadores del Programa iniciarán su medición una vez realizada las contrataciones de las Firmas Consultoras y los procesos de obras que se encuentran programados en el marco de desarrollo de este Programa.

Cuadro no. 4: Lista de Indicadores y valores metas.

Descripción	Valores Metas	2026-2027
1.1 Hogares con acceso a saneamiento gestionando de forma segura	40,000	-
2.1 Tasa de micro-medición de las localidades intervenidas	40%	-
2.2 Porcentaje de clientes facturados en las localidades intervenidas	80%	-
2.3 Consumo de energía en los sistemas electromecánicos (bombeo de agua potable en las localidades intervenidas)	85	-

ANEXO I: Procesos de Adquisiciones y Seguimiento.

Descripción	Detalles del Avance	Monto de los Servicios USD
LPI-O-001-2023-INAPA-CORAABO-BID: Licitación Macro Infraestructura de Saneamiento de Boca Chica: Diseño y Construcción de Obras de Alcantarillado Sanitario; Diseño y Construcción de Microtunelación; Diseño y Construcción de Emisario Submarino y la operación de Instalaciones de bombeo y tratamiento de aguas residuales	El 11 de julio de 2024 fueron recibidas las ofertas técnicas y económicas. Este proceso se encuentra en evaluación en el tercer trimestre de 2024.	N/A
SBCC-001-2023-INAPA-CORAABO-BID: Supervisión de Obras de Diseño + Construcción + Operación y Redes Secundarias por Resultados	El 27 de junio de 2024 fueron recibidas las ofertas técnicas y económicas. Este proceso se encuentra en evaluación en el tercer trimestre de 2024.	N/A
LPI- O-001-2024: Construcción de Redes Secundarias y conexión de domiciliarias por Resultados del Alcantarillado Sanitario de Boca Chica	Proceso publicado el 16 de julio de 2024. Las ofertas fueron recibidas en fecha 23 de septiembre de 2024.	N/A
SBCC-001-2024-INAPA-CORAABO-BID: Servicios de Monitoreo de datos oceanográfico emisario La Romana	Expresión de interés publicada en fecha 13 y 16 de septiembre de 2024. Está programa la recepción de documentos para el 14 de octubre de 2024.	N/A
SBMC-001-2024-INAPA-CORAABO-BID: Licitación Nacional Restringida para contratación de firma de Auditores Externos Independientes del Programa	Solicitudes de propuestas enviadas a las firmas el 17 de septiembre de 2024. Fecha límite de entrega el 08 de octubre de 2024.	N/A

N/A: No tienen contrato a la fecha.

Otros procesos de adquisiciones contratados del Programa:

- 1.- Selección y Contratación de la [CCIN-001-2024-INAPA-CORAABO-BID:](#) **Especialista en Adquisiciones y Gestión de contratos** – Fecha de inicio el 01 de agosto de 2024.
- 2.- Selección y Contratación de [CCIN-00-2024-INAPA-CORAABO-BID:](#) **Coordinador General del Programa** con fecha de inicio 10 de junio de 2024.
- 3.- Selección y Contratación de la [CCIN-002-2024-INAPA-CORAABO-BID:](#) **Especialista Financiera del Programa** (UCP-INAPA-CORAABO-BID/003-2024) en fecha 01 de junio de 2024.
- 4.- Selección y Contratación de la [CCIN-004-2024-INAPA-CORAABO-BID:](#) **Especialista en Planificación** (UCP-INAPA-CORAABO-BID/004-2024) en fecha 01 de mayo de 2024.
- 5.- Selección y Contratación de [CCIN-005-2024-INAPA-CORAABO-BID:](#) Ingenieros junior de obras con fecha de inicio 1 de junio de 2024- Siete (7) Ingenieros.

ANEXO II: Fotos de Actividades.

Visitas Técnicas a las ciudades de La Romana, Higüey y San Pedro de Macorís.



Expresiones de Interés publicadas.



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Programa de Saneamiento Universal de Ciudades Turísticas y Costeras

Convenio de Préstamo Núm. 5637/OC-DR y 5638/KI-DR

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIÓN DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL

Selección de Consultor Individual No. CCIN-006-2024-INAPA-CORAABO-BID, CCIN-007-2024-INAPA-CORAABO-BID y CCIN-008-2024-INAPA-CORAABO-BID

El Gobierno de la República Dominicana ha recibido financiamiento mediante el Contrato de Préstamo Núm. 5637/OC-DR y 5638/KI-DR, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la ejecución del Programa de Saneamiento Universal de Ciudades Turísticas y Costeras (DR-L1158) (el "Programa") a través del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), que en calidad de organismo ejecutor, emite el presente llamado para contratación de servicios de consultoría individual para un/a Asesor en Tecnología de la Información y Comunicación del Programa (CCIN-006-2024-INAPA-CORAABO-BID), un/a Especialista para la Gestión Social y Género (CCIN-007-2024-INAPA-CORAABO-BID), y un/a Especialista para la Gestión Ambiental del Programa (CCIN-008-2024-INAPA-CORAABO-BID).

1- CCIN-006-2024-INAPA-CORAABO-BID – Consultor (a) Individual Asesor en Tecnología de la Información y Comunicación del Programa para realizar la planificación, programación, dirección, supervisión y control del desarrollo e implementación de sistemas informáticos para eficientar las labores relacionadas a la unidad y a las instituciones del programa, velando porque las aplicaciones simplifiquen los procesos operacionales de la institución.

2- CCIN-007-2024-INAPA-CORAABO-BID – Consultor (a) Individual Especialista para la Gestión Social y Género para realizar la gestión social y de género del Programa que incluye la implementación de las políticas e instrumentos del Programa, de conformidad con el Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del Banco (GN-2965-23), sus Normas de Desempeño Ambientales y Sociales, así como las respectivas guías de implementación, el Plan de acción ambiental y social del Programa (PAAS) y las disposiciones ambientales y sociales específicas que se incluyan en las condiciones especiales de estos servicios.

3- CCIN-008-2024-INAPA-CORAABO-BID – Consultor (a) Individual Especialista para la Gestión Ambiental del Programa para realizar la Gestión Ambiental de conformidad con el Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del Banco (GN-2965-23), sus Normas de Desempeño Ambientales y Sociales, así como con sus respectivas guías de implementación, el plan de acción ambiental y social del Programa (PAAS) y de acuerdo con las disposiciones ambientales y sociales específicas que se incluyan en las Estipulaciones Especiales de este Contrato.

El perfil para estas funciones requiere, según aplique: i) Profesionales con título universitario con experiencia laboral mayor a cinco (5) y diez (10) años, ii) más de tres (3) años relacionada a la Gestión Ambiental y/o Social y cinco (5) años en la gestión de proyectos tecnológicos, iii) presentar evidencias de contrataciones en sus respectivas áreas en proyectos con financiamiento externo que sumen al menos tres (3) años, implementando los instrumentos del Marco de Política Ambiental y Social, iv) capacidad de comunicación y gestión a nivel de comunitario, y v) conocimiento de la normativa relacionada con el sector de agua y saneamiento; y con la organización local y comunitaria, entre otros.

Términos de Referencia disponibles en el siguiente enlace:
<https://www.inapa.gob.do/index.php/proyectos/category/69-inapa-coraabo-bid>

La selección y contratación del consultor se llevará a cabo conforme al procedimiento estipulado para Consultorías Individuales, establecido en la Sección V de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-15), edición de mayo 2019, y podrán participar en ella todos los consultores individuales elegibles de los países miembros del BID.

Las expresiones de interés o postulaciones deberán dirigirse al Ing. José Martínez Bonetti a más tardar el día doce (12) del mes de agosto del año 2024, en sobre cerrado indicando en la portada el nombre de la Consultoría a la cual aplica, a la dirección: Unidad Coordinadora del Programa (UCP)/Dirección de Programas y Proyectos Especiales (DPPE).

Dirección: Edificio INAPA, Segundo Piso, Calle Guarocuya, Centro Comercial El Millón, Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Teléfono: (809) 567-1241 hasta el 49; ext. 11286, 11236, 11287
o bien vía correo electrónico, a la dirección inapa.dppe@inapa.gob.do con copia a jose.martinez@inapa.gob.do.

Wellington A. Arnaud Bisonó
Director Ejecutivo



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
Dirección de Programas y Proyectos Especiales
Programa de Saneamiento Universal de Ciudades Turísticas y Costeras

Aviso de Expresión de Interés para la conformación de lista corta para la selección de Firma Consultora para realizar los servicios de monitoreo de datos oceanográficos asociados al proyecto de ingeniería del Emisario Submarino de La Romana en República Dominicana, SBCC-001-2024-INAPA-CORAABO-BID

Organismo Ejecutor: INAPA
Proyecto: Programa de Saneamiento Universal de Ciudades Turísticas y Costeras
Sector: Agua y Saneamiento
Préstamo N° 5637/OC-DR y 5638/KI-DR
Fecha límite de entrega: 14 de octubre del 2024

El Gobierno de la República Dominicana ha solicitado un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Facultad de Cofinanciamiento de Corea para el Desarrollo de Infraestructura para América Latina y el Caribe, para financiar el costo del Programa de Saneamiento Universal de Ciudades Turísticas y Costeras, el cual se propone utilizar, en parte, para llevar a cabo los servicios de monitoreo de datos oceanográficos asociados al proyecto de ingeniería del Emisario Submarino de La Romana en República Dominicana.

Este llamado tiene como propósito conformar una lista corta de firmas consultoras con capacidad y experiencia de diez (10) o más años para brindar servicios de consultoría realizando los servicios de monitoreo de datos oceanográficos asociados al proyecto de ingeniería del Emisario Submarino de La Romana en República Dominicana con experiencia previa en levantamientos topobatemétricos georreferenciados de cuerpos de agua sujetos a mareas, instalación de mareógrafos temporarios o permanentes, levantamientos de datos de salinidad, temperatura y densidad de aguas marinas y levantamientos de correntometría, así como el proceso de modelado computacional de la calidad del agua, cuya función es prever el desempeño medioambiental de este sistema.

Para tales efectos, el Gobierno de la República Dominicana, a través del Instituto de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) invita a las firmas consultoras interesadas a acreditar su experiencia en las actividades arriba descritas.

Las firmas consultoras serán seleccionadas conforme a los procedimientos indicados en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2350-15, y podrán participar en ella todos los concursantes de países de origen que sean elegibles, según se especifica en dichas políticas.

El objetivo es conformar una lista corta en la que se incluyan como mínimo cinco (5) y como máximo ocho (8) firmas elegibles con una amplia representación geográfica. Las firmas consultoras serán seleccionadas con base en el método de Selección Basada en la Calidad y el Costo (SBCC), descrito en las Políticas del BID para contratación de servicios de Consultoría. Las firmas consultoras se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en participación (Joint Venture) o subcontratistas, instituciones universitarias de investigación u otros, con el fin de mejorar sus calificaciones, en este caso deberán indicar cuál es la empresa líder. A los efectos de establecer la lista corta, la nacionalidad de la firma será la del país en que se encuentre legalmente constituida o incorporada y en el caso de asociación en participación, será la nacionalidad de la firma que se designe como representante. Los interesados deberán indicar el país de nacionalidad de la firma.

Las expresiones de interés y toda la información de las firmas interesadas deberán confeccionarse en idioma español.

La información, así como cualquier consulta que tuvieren, puede ser enviada a inapa.dppe@inapa.gob.do con copia a jose.martinez@inapa.gob.do y nicolas.grillon@inapa.gob.do, a más tardar hasta las 12:00 horas (hora local de la República Dominicana) del catorce (14) de octubre 2024.

La información recibida después de esa hora y fecha no será considerada.

Favor indicar en el asunto: "Expresión de Interés Estudios Oceanográficos Emisario Submarino de La Romana".

Wellington A. Arnaud Bisonó
Director Ejecutivo
