INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS INAPA

Id	Task Name	Notas	Duración	Comienzo	Fin
0	**Obra: CONST CRUCE TUBERIA DE 20" ACERO EN LINEA ESTACION PSPI Y REPARACION CRUCE EXISTENTE AFECTADO POR VAGUADA ABRIL 2017. ACUEDUCTO DE SAN CRISTOBAL**		105 días	lun 02/07/18	vie 23/11/18
1	COMIENZO DE OBRA		0 días	lun 02/07/18	lun 02/07/18
2	**PRELIMINARES**		**100 días**	**lun 02/07/18**	**vie 16/11/18**
3	LETRERO		4 días	lun 02/07/18	jue 05/07/18
4	CAMPAMENTO		10 días	vie 06/07/18	jue 19/07/18
5	ESTUDIO Y DISEÑO DE PLANOS		15 días	lun 02/07/18	vie 20/07/18
6	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE SISTEMAS INAPA		100 días	lun 02/07/18	vie 16/11/18
7	TRANSPORTE DE TUBERIA DESDE DE ACOPIO HASTA LA PLANTA DE TRAT DE INAPA EN S CRISTOBAL		30 días	lun 02/07/18	vie 10/08/18
8	TRANSPORTE DE EQUIPO DESDE SANTO DOMINGO HASTA SAN CRISTOBAL (EXCAVADORA DE 80 HP Y 128 HP)		15 días	lun 02/07/18	vie 20/07/18
9	REPLANTEO		60 días	lun 23/07/18	vie 12/10/18
10	**CONEXION TRAMO OESTE EN LÍNEA DE CONDUCCION DE Ø20" ACERO EXISTENTE**		**75 días**	**lun 23/07/18**	**vie 02/11/18**
11	MOVIMIENTO DE TIERRA		60 días	lun 23/07/18	vie 12/10/18
12	SUMINISTRO DE TUBERIA		15 días	lun 23/07/18	vie 10/08/18
13	COLOCACION DE TUBERIA		70 días	lun 23/07/18	vie 26/10/18
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES		30 días	lun 13/08/18	vie 21/09/18
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS Y VALVULAS		30 días	lun 24/09/18	vie 02/11/18
16	**CONEXION TRAMO ESTE EN LÍNEA DE CONDUCCION DE Ø20" ACERO EXISTENTE**		**80 días**	**lun 06/08/18**	**vie 23/11/18**
17	MOVIMIENTO DE TIERRA		60 días	lun 06/08/18	vie 26/10/18
18	SUMINISTRO DE TUBERIA		15 días	lun 06/08/18	vie 24/08/18
19	COLOCACION DE TUBERIA		80 días	lun 06/08/18	vie 23/11/18
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES		30 días	lun 03/09/18	vie 12/10/18
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS Y VALVULAS		30 días	lun 15/10/18	vie 23/11/18
22	**CRUCE DE PUENTE LÍNEA DE IMPULSIÓN Ø20" - ACERO SCH 20 (EN CRUCE RÍO NIGUA)**		**40 días**	**lun 01/10/18**	**vie 23/11/18**
23	DESMONTE DE LA TUBERIA DE 20" PVC SDR-21 C/J.G.		10 días	lun 01/10/18	vie 12/10/18
24	CRUCE DE PUENTE DE 20" ACERO		20 días	lun 15/10/18	vie 09/11/18
25	USO DE GRUA PARA COLOCAR TUBERIA DE 20"		20 días	lun 15/10/18	vie 09/11/18
26	USO DEL MARTILLO DE PERCUSION PARA PERFORAR ACERA		20 días	lun 15/10/18	vie 09/11/18
27	AMPLIACION DEL PASO PEATONAL L=155.00 M		30 días	lun 15/10/18	vie 23/11/18
28	**CORRECCION DE AVERIAS EN LINEA DE IMPULSION EXISTENTE DE Ø28" HIERRO-DUCTIL (EN CRUCE RÍO NIGUA)**		**30 días**	**lun 01/10/18**	**vie 09/11/18**
29	PRELIMINARES		30 días	lun 01/10/18	vie 09/11/18
30	USO DE COMPRESOR PARA DEMOLER BLOQUE DE ANCLAJE DE HORMIGON ARMADO EN CAUCE DE RIO L=18.30 M		20 días	lun 01/10/18	vie 26/10/18
31	ACHIQUE CON BOMBA		30 días	lun 01/10/18	vie 09/11/18
32	SUMINISTRO DE TUBERIA		30 días	lun 01/10/18	vie 09/11/18
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS Y BLOQUE DE ANCLAJE		30 días	lun 01/10/18	vie 09/11/18
34	**LIMPIEZA FINAL Y CONTINUA**		90 días	vie 20/07/18	jue 22/11/18
35	**PLANOS FINALES COMO CONSTRUIDO ASBUILT**		25 días	lun 15/10/18	vie 16/11/18

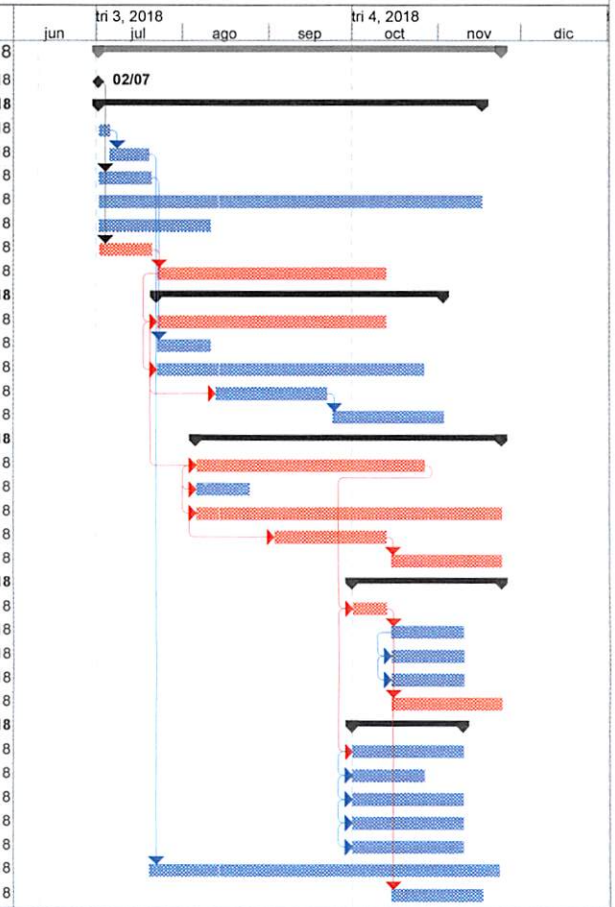

Project:INAPA

Task	Rolled Up Progress	Hito inactivo	solo fin		
Critical Task	Split	Resumen inactivo	Tareas externas		
Milestone	External Tasks	Tarea manual	Hito externo		
Summary	Project Summary	solo duración	Progress		
Rolled Up Task	Group By Summary	Informe de resumen manual	Deadline		
Rolled Up Critical Task	Tarea inactiva	Resumen manual			
Rolled Up Milestone	Hito inactivo	solo el comienzo			

CRONOGRAMA DE TRABAJO

INGENIERO JOSE DOLORES ESPINOSA FELIZ

LIC. OLGA ALTAGRACIA ROJAS ROSARIO
Abogado - Notario Público
MAT 3539
Santo Domingo, R.D
