ALBA IRIS VASQUEZ BRITO
INGENIERA CIVIL - AGRIMENSORA - TASADORA
albairisvasquezbrito1@hotmail.com / TEL: 829-261-9656.
RNC: 04701557003 – CODIA: 18985 – CATACODIA: 948-18985-2006.

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1	**FASE A: LÍNEA MATRIZ Y RED DE DISTRIBUCIÓN AMIAMA GÓMEZ -**	**314 días**	**mar 12/12/23**	**mié 11/12/24**		**$19,085,304.71**
2	POSICIONAMIENTO E INICIO DE PROYECTO	0 días	lun 11/12/23	lun 11/12/23		$0.00
3	**PRELIMINARES**	**2 días**	**mar 19/12/23**	**mié 20/12/23**		**$230,347.05**
4	REPLANTEO	2 días	mar 19/12/23	mié 20/12/23	2CC+7 días	$230,347.05
5	**CORTE, EXTRACCIÓN Y BOTE DE CARPETA ASFÁLTICA (L=1,022.89**	**7 días**	**jue 21/12/23**	**jue 28/12/23**		**$703,549.94**
6	CORTE DE ASFALTO CON DISCO (AMBOS LADOS)	3 días	jue 21/12/23	sáb 23/12/23	4	$273,176.46
7	REMOCIÓN DE ASFALTO	2 días	lun 25/12/23	mar 26/12/23	6	$310,335.98
8	BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN (D= 5 KM) INCLUYE	2 días	mié 27/12/23	jue 28/12/23	7	$120,037.50
9	**MOVIMIENTO DE TIERRA**	**135 días**	**vie 29/12/23**	**lun 3/6/24**		**$3,765,288.64**
10	EXCAVACIÓN MATERIAL COMPACTADO CON EQUIPO	60 días	vie 29/12/23	jue 7/3/24	8	$1,198,695.45
11	ASIENTO DE ARENA, E=10 CM (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	65 días	mié 10/1/24	lun 25/3/24	10CC+10 días	$709,457.32
12	SUMINISTRO DE MATERIAL DE MINA DE BASE PARA RELLENO,	70 días	vie 2/2/24	mar 23/4/24	11CC+20 días	$648,588.42
13	RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO EN	50 días	mar 20/2/24	mié 17/4/24	12CC+15 días	$655,021.14
14	BOTE DE MATERIAL CON CAMIÓN (D= 5 KM) INCLUYE	40 días	jue 18/4/24	lun 3/6/24	13	$553,526.31
15	**SUMINISTRO Y COLOCACION DE TI**	**120 días**	**lun 22/1/24**	**sáb 8/6/24**		**$7,035,981.54**
16	DE Ø3" PVC (SDR-26) CON J/G +2% DE PÉRDIDA POR CAMPANA,	30 días	sáb 6/4/24	vie 10/5/24	17CC+15 días	$570,233.38
17	DE Ø4" PVC (SDR-26) CON J/G +2% DE PÉRDIDA POR CAMPANA,	20 días	mié 20/3/24	jue 11/4/24	18CC+50 días	$1,027,196.68
18	DE Ø8" PVC (SDR-26) CON J/G +3% DE PÉRDIDA POR CAMPANA,	120 días	lun 22/1/24	sáb 8/6/24	11CC+10 días	$5,438,551.48
19	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES**	**150 días**	**mar 12/12/23**	**lun 3/6/24**		**$836,055.99**
20	DE PVC CON CEMENTO SOLVENTE TIPO TANGIT ROJO	80 días	lun 26/2/24	mar 28/5/24	18CC+30 días	$118,765.12
21	DE ACERO C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA	60 días	mar 26/3/24	lun 3/6/24	20CC+25 días	$325,415.74
22	JUNTAS MECÁMNICA TIPO DRESSER	80 días	jue 8/2/24	vie 10/5/24	18CC+15 días	$275,264.05
23	ANCLAJES	80 días	mar 12/12/23	mié 13/3/24		$116,611.08
24	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE V/**	**62 días**	**vie 12/4/24**	**sáb 22/6/24**		**$1,354,745.46**
25	VÁLVULA DE COMPUERTA DE Ø3" H.F. DE 150 PSI, PLATILLADA,	5 días	sáb 11/5/24	jue 16/5/24	16	$169,172.47
26	VÁLVULA DE COMPUERTA DE Ø4" H.F. DE 150 PSI, PLATILLADA,	7 días	vie 12/4/24	vie 19/4/24	17	$141,935.35
27	CÁMARA ROMPEDORA DE PRESIÓN EN TUBERÍA DE Ø8"	7 días	lun 10/6/24	lun 17/6/24	18	$925,762.53
28	CAJA TELESCÓPICA PARA VÁLVULA DE COMPUERTA	5 días	mar 18/6/24	sáb 22/6/24	27	$117,875.11
29	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE A(**	**51 días**	**vie 10/5/24**	**lun 8/7/24**		**$539,740.69**
30	URBANAS, CON POLIETILENO	50 días	sáb 11/5/24	lun 8/7/24	16	$226,056.45
31	RURALES, CON POLIETILENO	50 días	vie 10/5/24	sáb 6/7/24	16CC+29 días	$313,684.24
32	**PRUEBA HIDROSTÁTICA**	**21 días**	**mar 9/7/24**	**jue 1/8/24**		**$457,164.57**
33	DE Ø3" PVC (SDR-26) C/J.G.	7 días	mar 9/7/24	mar 16/7/24	30	$110,770.75
34	DE Ø4" PVC (SDR-26) C/J.G.	7 días	mié 17/7/24	mié 24/7/24	33	$139,164.88
35	DE Ø8" PVC (SDR-26) C/J.G.	7 días	jue 25/7/24	jue 1/8/24	34	$207,228.94
36	**REPOSICIÓN CARPETA ASFÁLTICA L**	**21 días**	**vie 2/8/24**	**lun 26/8/24**		**$2,081,898.31**
37	IMPRIMACIÓN SENCILLA	7 días	vie 2/8/24	vie 9/8/24	35	$251,781.15

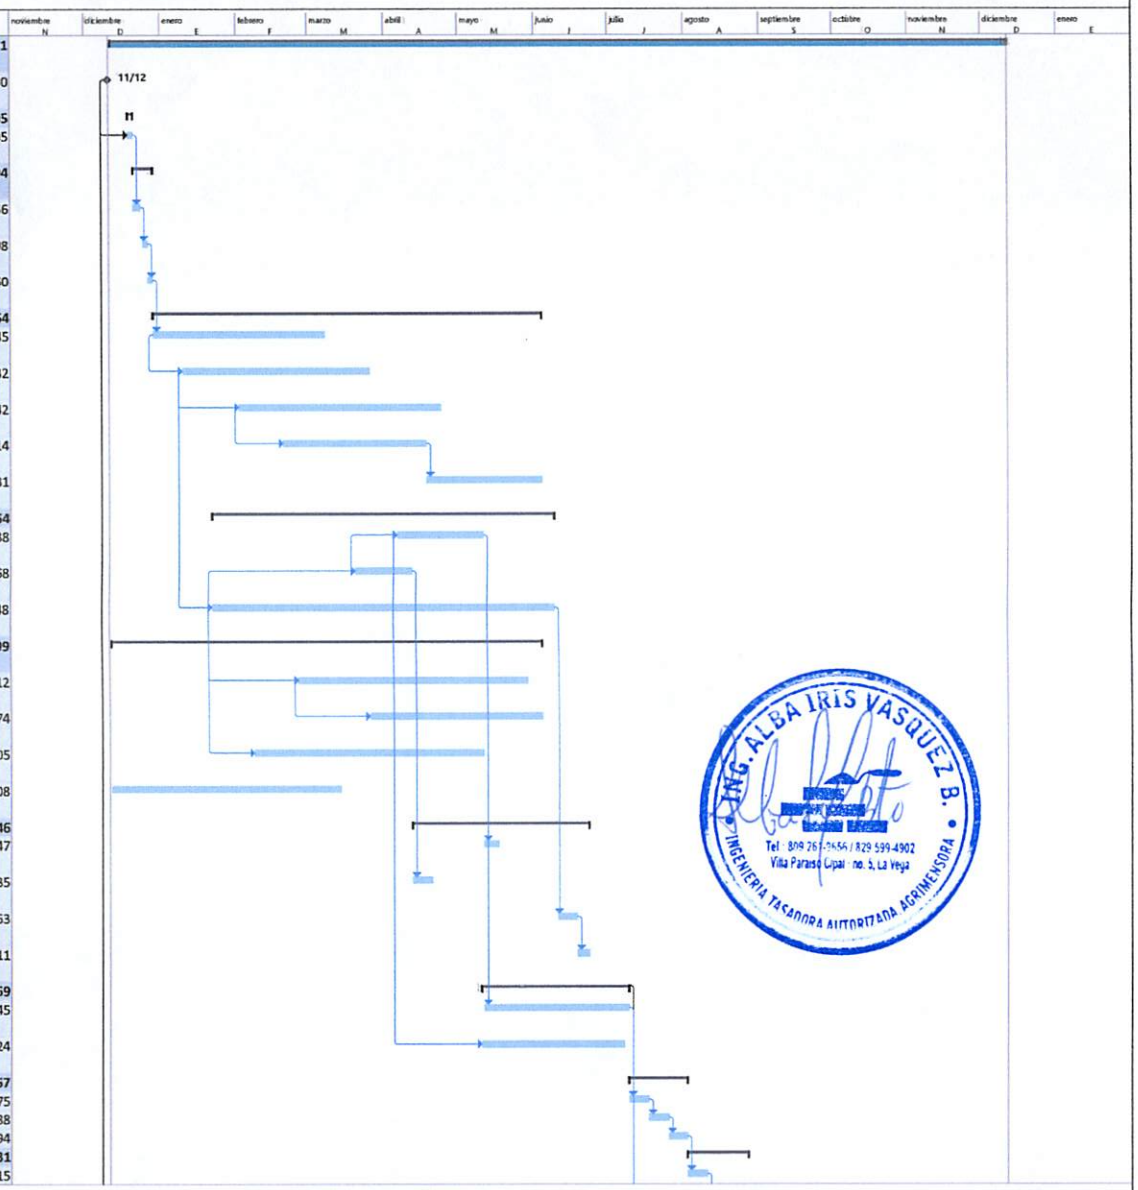

ING. ALBA IRIS VASQUEZ B.
Tel.: 809 261-9656 / 829 599-4902
Villa Paraíso Cpal. no. 5, La Vega
INGENIERIA TASADORA AUTORIZADA AGRIMENSORA

Proyecto: DRIAGRAMA DE GAM INAPA2
Fecha: mar 31/10/23

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual
