Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**RECONSTRUCCIÓN DE REDES ACUEDUCTO POSTRER RÍO**	**315.13 días**	**jue 9/3/23**	**sáb 9/3/24**
2		**REDES DISTRIBUCIÓN**	**326 días**	**lun 5/9/22**	**mié 20/9/23**
3		**PRELIMINARES**	**169.5 días**	**mar 6/9/22**	**mié 22/3/23**
4		Replanteo	15 días	mar 6/9/22	mié 22/3/23
5		**MOVIMIENTO DE TIERRA:**	**281.1 días**	**jue 6/10/22**	**mié 30/8/23**
6		Excavación material compacto c/equipo	98 días	jue 6/10/22	sáb 27/5/23
7		Nivelación de fondo de zanja	96 días	jue 6/10/22	sáb 27/5/23
8		Asento de arena	96 días	jue 6/10/22	lun 29/5/23
9		Compactado de relleno con compactador mecánico en capa de 0.20 m (incluida la	93 días	mié 1/2/23	mié 30/8/23
10		Bote de material c/camión (dist= 5.00 km) (inc. esparcimiento	1 día	jue 6/10/22	jue 9/3/23
11		**SUMINISTRO DE TUBERÍAS**	**160 días**	**mar 6/9/22**	**sáb 11/3/23**
12		Tubería de Ø4 PVC (SDR-26) C/J.G. + 2%	2 días	jue 9/3/23	sáb 11/3/23
13	✓	Tubería de Ø3 PVC (SDR-26) C/J.G. + 2%	2 días	mar 6/9/22	mié 7/9/22
14		**COLOCACIÓN DE TUBERIAS**	**215 días**	**jue 6/10/22**	**mié 14/6/23**
15		Tubería de Ø4 PVC (SDR-26) C/J.G.	83 días	jue 9/3/23	mié 14/6/23
16		Tubería de Ø3 PVC (SDR-26) C/J.G.	83 días	jue 6/10/22	lun 1/5/23
17		**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS**	**215 días**	**jue 6/10/22**	**mié 14/6/23**
18		Codo de 4x90º PVC SCH-40	83 días	jue 9/3/23	mié 14/6/23
19		Codo de 4x45º PVC SCH-	83 días	jue 9/3/23	mié 14/6/23
20		Codo de 3x90º PVC SCH-	83 días	jue 6/10/22	mié 26/4/23
21		Codo de 3x45º PVC SCH	83 días	jue 9/3/23	mié 14/6/23
22		Tee de 4x4 PVC SCH-40	83 días	jue 9/3/23	mié 14/6/23
23		Tee de 3x3 PVC SCH-40	83 días	jue 6/10/22	mié 26/4/23
24		Yee de 4x3 PVC SCH-40	83 días	jue 9/3/23	mié 14/6/23
25		Yee de 3x3 PVC SCH-40	83 días	jue 9/3/23	mié 14/6/23
26		Cruz de 4x4 PVC SCH-40	83 días	jue 9/3/23	mié 14/6/23
27		Cruz de 3x3 PVC SCH-40	83 días	jue 9/3/23	mié 14/6/23
28		Reducción 4x3 PVC SCH-	83 días	jue 9/3/23	mié 14/6/23
29		Tapón Ø4 PVC SCH-40	83 días	jue 9/3/23	mié 14/6/23
30		Tapón Ø3 PVC SCH-40	83 días	jue 9/3/23	mié 14/6/23
31		Anclaje H.S. p/piezas	83 días	jue 9/3/23	mié 14/6/23
32		**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS**	**1 día**	**jue 9/3/23**	**vie 10/3/23**
33		De compuerta Ø4 H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y	1 día	jue 9/3/23	vie 10/3/23
34		De compuerta Ø3 H.F 150 PSI (incluye cuerpo de la válvula, junta de goma, tornillos, niples, junta mecánica tipo Dresser, Tee de acero, movimiento de tierra y	1 día	jue 9/3/23	vie 10/3/23
35		Cajas telescópicos p/valvulas de H.F.	1 día	jue 9/3/23	vie 10/3/23
36		**ACOMETIDAS EN POLIETILENO**	**215 días**	**jue 6/10/22**	**mié 14/6/23**

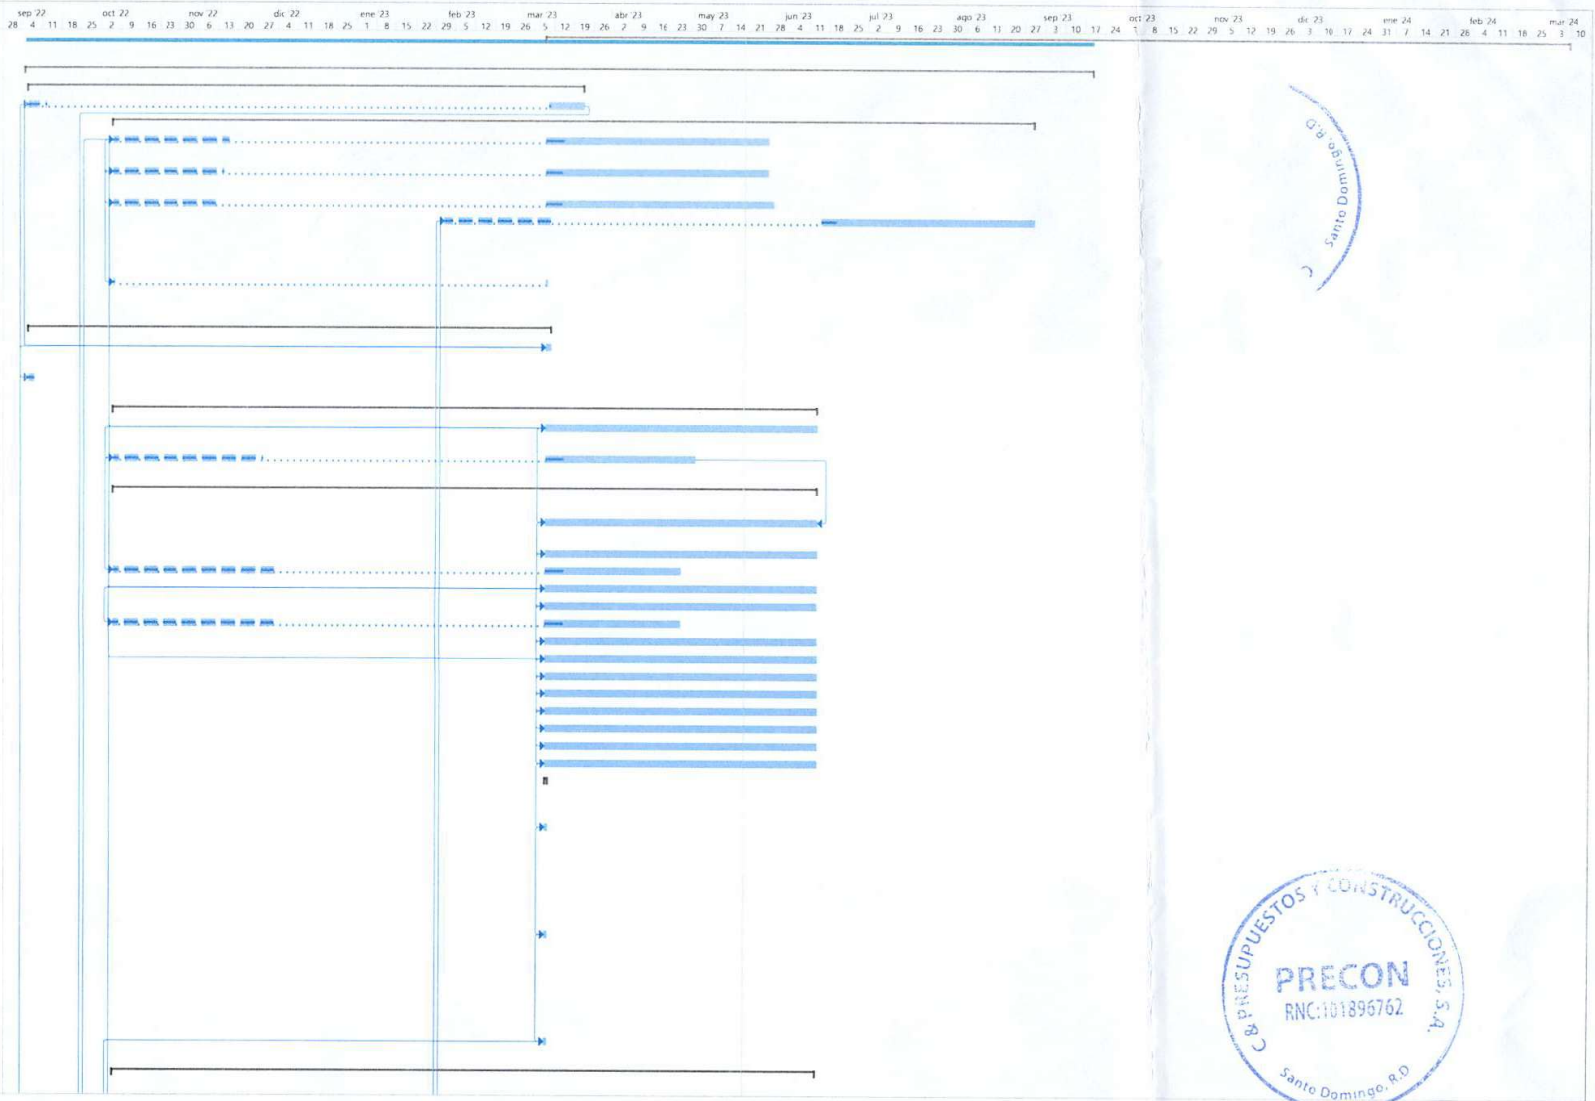

Santo Domingo, R.D

C & PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
PRECON
RNC:101896762
Santo Domingo, R.D

Proyecto: Cronograma PosterR
Fecha: vie 19/5/23

Tarea		Resumen		Hito inactivo		solo duración		solo el comienzo		Hito externo		Progreso manual	
División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		Informe de resumen manual		solo fin		Fecha límite			
Hito		Tarea inactiva		Tarea manual		Resumen manual		Tareas externas		Progreso			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
37		Acometida urbanas Ø3 X 1/2 en tuberia de polietieno inclida la valvula de paso y el registro de inspeción en	83 días	jue 6/10/22	mar 2/5/23
38		Rurales Ø3	83 días	jue 9/3/23	mié 14/6/23
39		**PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS DE:**	**1 día**	**mié 14/6/23**	**jue 15/6/23**
40		Tuberia de Ø4 PVC (SDR-26) C/J.G.	1 día	mié 14/6/23	jue 15/6/23
41		Tuberia de Ø3 PVC (SDR-26) C/J.G.	1 día	mié 14/6/23	jue 15/6/23
42		**DEMOLICIONES**	**83 días**	**jue 9/3/23**	**mié 14/6/23**
43		Demolicón de acera y contenes	83 días	jue 9/3/23	mié 14/6/23
44		Bote de escombros	83 días	jue 9/3/23	mié 14/6/23
45		**REPOSICIÓN DE**	**83 días**	**jue 15/6/23**	**mié 20/9/23**
46		Acera e=0.10	83 días	jue 15/6/23	mié 20/9/23
47		Contenes	83 días	jue 15/6/23	mié 20/9/23
48		**ASFALTO**	**178.8 días**	**mar 27/9/22**	**sáb 22/4/23**
49		Corte de asfalto	91 días	mar 27/9/22	sáb 22/4/23
50		Remocion de asfalto	91 días	mar 27/9/22	mié 12/4/23
51		Bote de carpeta asfalto c/ camión (dist= 5.00 km) (inc. esparcimiento	1 día	mar 27/9/22	jue 9/3/23
52		Suministro y colocación de imprimación con	9 días	jue 9/3/23	lun 20/3/23
53		Suministro y colocacion de asfalto caliente + 25% desp e= 2 (Inc. Riego de adherencia)	9 días	lun 20/3/23	jue 30/3/23
54		Transporte de asfalto caliente (31.00 km)	3 días	jue 9/3/23	lun 13/3/23
55		**SEÑALIZACIÓN, CONTROL, SEGURIDAD EN LA OBRA Y MANEJO DEL TRANSITO**	**160 días**	**lun 5/9/22**	**vie 10/3/23**
56		Suministro e instalacion de pasarelas, letreros pequeños con base en angulares, postes para cintas refractaria,luces intermitentes color ambar y barreras de	1 día	lun 5/9/22	jue 9/3/23
57		Suministro e instalacion de letreros, uso de conos refractarios y hombres con	1 día	jue 9/3/23	vie 10/3/23
58		LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1 día	mié 29/3/23	jue 30/3/23
59		**VARIOS**	**159.6 días**	**lun 5/9/22**	**jue 9/3/23**
60		Valla anunciando la obra 20"x 10" impresión full color, conteniendo logo de inapa, nombre del proyecto y contratista .estructura en tubos galvanizados 1 ½ x 1 ½ y soporte en tubos	1 día	lun 5/9/22	jue 9/3/23
61		Campamento casa o solar y 2 baños portatiles	1 día	lun 5/9/22	jue 9/3/23

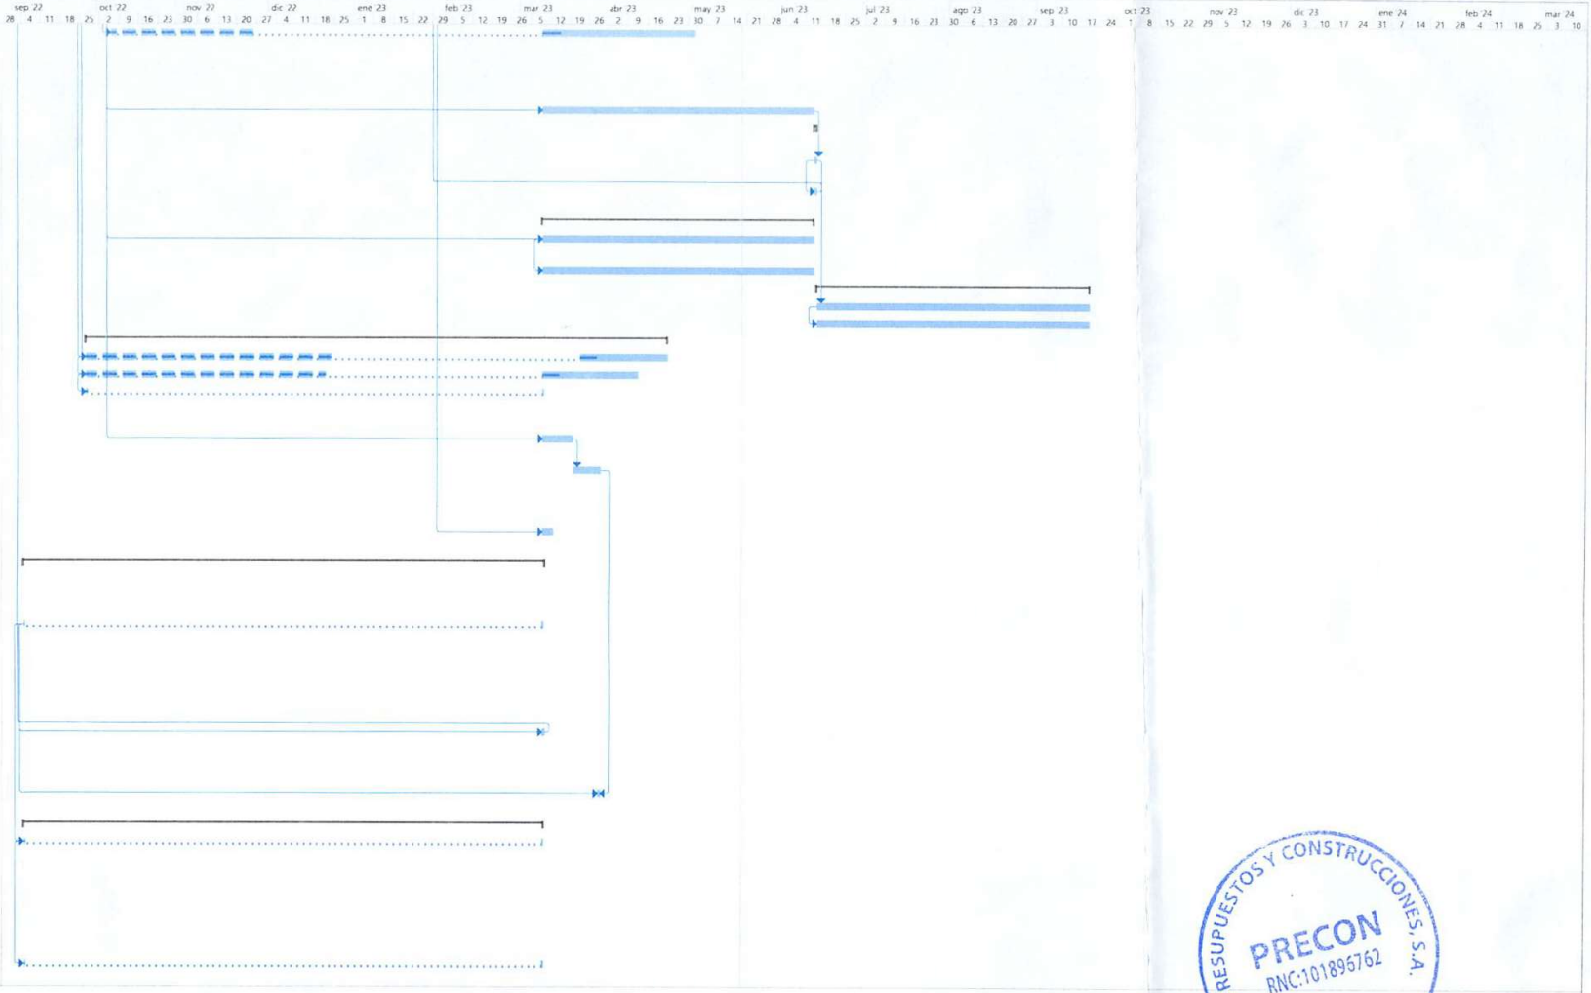

C & PRESUPUESTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
PRECON
RNC:101896762
Santo Domingo, R.D

Proyecto: Cronograma PosterR
Fecha: vie 19/5/23

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual
