CRONOGRAMA ADENDUM REHABILITACION ACUEDUCTO EL LIMON. PROVINCIA JIMANI

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**REHABILITACION AC. EL LIMON, JIMANI**	**395.25 días?**	**lun 09/03/15**	**mié 16/11/16**
2	**DEPOSITO REGULADOR**	**49 días**	**lun 09/03/15**	**mar 21/04/15**
3	ENCOFRADO 2DA. MOLDEADA	9 días	mar 10/03/15	mié 18/03/15
4	ACERO ESTRUCTURAL	10 días	lun 09/03/15	mar 17/03/15
5	HORMIGON FINAL EN MUROS Y LOSAS F'C=240 KG/C	1 día	mié 18/03/15	jue 19/03/15
6	FINO TECHO E IMPERMEABILIZACION	1 día	vie 20/03/15	sáb 21/03/15
7	DESENCOFRADO MUROS	1 día	sáb 21/03/15	dom 22/03/15
8	DESENCOFRADO TECHO	1 día	mié 01/04/15	jue 02/04/15
9	DESENCOFRADO VIGAS	1 día	mié 08/04/15	jue 09/04/15
10	IMPERMEABILIZACION MUROS Y LOSA DE FONDO	18 días	jue 26/03/15	vie 10/04/15
11	CARETEO Y FRAGUACHE MUROS Y LOSAS	20 días	jue 26/03/15	lun 13/04/15
12	FINO LOSA DE FONDO Y ZABALETA	2 días	lun 13/04/15	mié 15/04/15
13	PANETES MUROS Y LOSA	20 días	jue 26/03/15	dom 12/04/15
14	CONEXIONES ENTRADA, SALIDA Y REBOSE	8 días	sáb 21/03/15	sáb 28/03/15
15	VERJA PERIMETRAL	15 días	dom 22/03/15	sáb 04/04/15
16	CASETA DE CLORO	10 días	dom 12/04/15	mar 21/04/15
17	ACERA PERIMETRAL EN DR Y CASETA	3 días	mar 21/04/15	vie 24/04/15
18	CAMINO DE ACCESO: TERMINACION: CUNETAS E IMPRIN	15 días	sáb 04/04/15	sáb 18/04/15
19	PINTURA Y REMOZAMIENTO (COLOCACION DE GRAVA)	216.88 días	vie 24/04/15	mar 03/11/15
20	**POZOS**	**30 días**	**lun 16/03/15**	**sáb 11/04/15**
21	CONSTRUCCION Y AFORO	12 días	lun 16/03/15	jue 26/03/15
22	CONSTRUCCION CASETA TIPO TECHO DESLIZABLE	12 días	jue 26/03/15	lun 06/04/15
23	ELECTRIFICACION POZOS	12 días	mar 31/03/15	vie 10/04/15
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS	5 días	mar 07/04/15	sáb 11/04/15
25	**LINEA DE IMPULSION 8"**	**19 días**	**sáb 04/04/15**	**mar 21/04/15**
26	SUMINISTRO DE TUBERIA	3 días	sáb 04/04/15	mar 07/04/15
27	COLOCACION DE TUBERIAS	9 días	mar 07/04/15	mié 15/04/15
28	CONEXIONES Y VALVULAS	7 días	mié 15/04/15	mar 21/04/15
29	**CRUCES EN REDES Y LINEA DE CONDUCCION**	**10 días**	**mar 07/04/15**	**jue 16/04/15**
30	SUMINISTRO TUBERIAS PARA CRUCES	1 día	mar 07/04/15	mié 08/04/15
31	CONFECCION E INSTALACION CRUCES	9 días	mié 08/04/15	jue 16/04/15
32	**PIEZAS ESPECIALES Y VALVULAS**	**21 días**	**mié 08/04/15**	**dom 26/04/15**
33	SUMINISTRO	1 día	mié 08/04/15	jue 09/04/15
34	INSTALACION	7 días	mié 15/04/15	mar 21/04/15
35	REGISTROS	6 días	mar 21/04/15	dom 26/04/15
36	**ACOMETIDAS**	**37 días**	**jue 09/04/15**	**mar 12/05/15**
37	CONFECCION BASTONES (696 UDS)	9 días	jue 09/04/15	vie 17/04/15
38	SUMINISTRO E INSTALACION BASTONES (696 UDS)	14 días	vie 17/04/15	mié 29/04/15
39	ANCLAJE BASTONES (696 UDS)	14 días	mié 29/04/15	mar 12/05/15
40	**ILUMINACION Y ELECTRIFICACION EN: AREA DEPOSITO**	**350.25 días?**	**sáb 18/04/15**	**mié 16/11/16**
41	SUMINISTRO POSTES E INSTALACION	3 días	sáb 18/04/15	lun 20/04/15
42	CABLEADO Y ELECTRIFICACION	590 días	lun 20/04/15	lun 26/09/16
43	REPARACION DE AVERIAS	1 día?	mar 12/05/15	mar 12/05/15
44	PRE-RECEPCION	2 días	vie 07/10/16	sáb 08/10/16
45	TERMINACION Y REPARACIONES	30 días	sáb 08/10/16	vie 04/11/16
46	PRUEBAS GENERALES DEL ACUEDUCTO	12 días	vie 04/11/16	mar 15/11/16
47	RECEPCION FINAL	1 día?	mar 15/11/16	mié 16/11/16

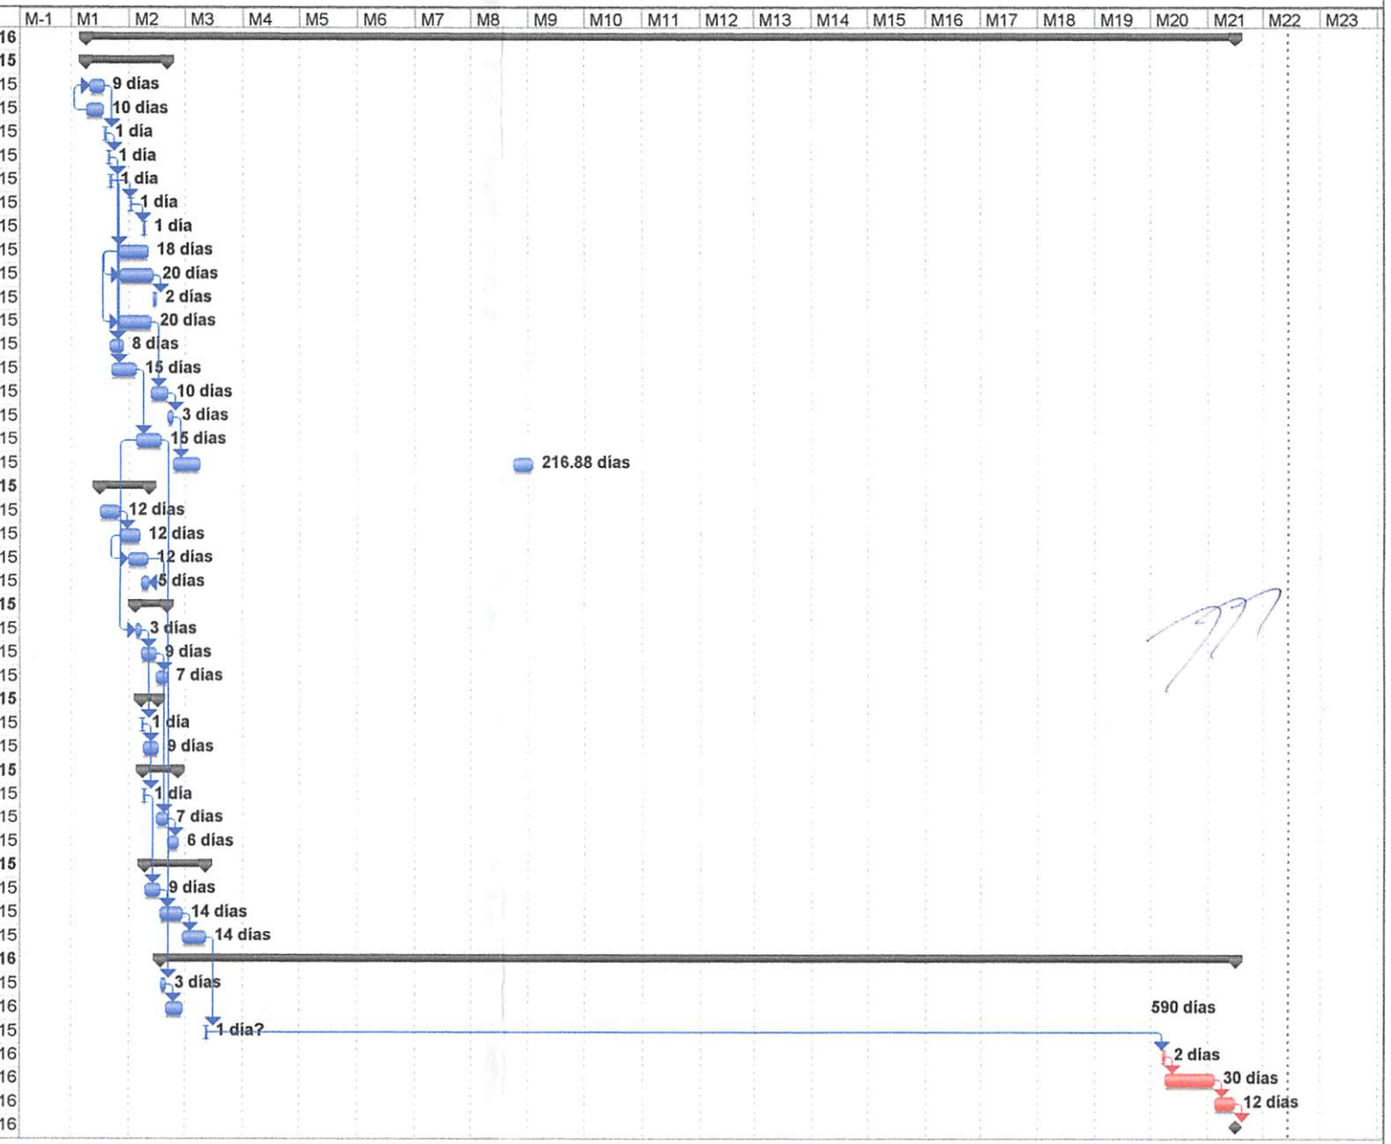

Proyecto: ALMONTE
Fecha: mié 14/12/16

Tarea | Tarea crítica | Progreso | Hito | Resumen
