Id		Nombre de tareas	Duración	Comienzo	Fin	% completado
1		INAPA EL CORBANO YABONICO	780 días	mar 8/2/22	lun 3/2/25	96%
2	✓	PRELIMINARES	132 días	mar 8/2/22	mié 10/8/22	100%
3	✓	FIRMA DE ACTA DE INICIO	1 día	mar 8/2/22	mar 8/2/22	100%
4	✓	PROCURA	118 días	mié 16/2/22	vie 29/7/22	100%
12	✓	MOVILIZACION	79 días	lun 14/3/22	mié 10/8/22	100%
13	✓	CORBANO	204.54 días	lun 21/3/22	vie 30/12/22	100%
14	✓	INSTALACION D ETUBERIA DE 20"	51.84 días	lun 21/3/22	mié 1/6/22	100%
15	✓	INSTALACION D ETUBERIA DE 16"	41.67 días	jue 5/5/22	lun 11/7/22	100%
16	✓	CONSTRUCCION DE REGISTROS E INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE	45 días	mar 12/7/22	lun 12/9/22	100%
17	✓	EMPALME A RED EXISTENTE	8 días	mié 19/10/22	dom 30/10/22	100%
18	✓	PRUEBA FUNCIONAMIENTO DE TUBERIA DE 20"	9 días	mar 1/11/22	vie 11/11/22	100%
19	✓	PRUEBA FUNCIONAMIENTO DE TUBERIA DE 16"	9 días	mar 1/11/22	vie 11/11/22	100%
20	✓	ASFALTADO SOBRE LINEA DE 20"	16 días	lun 7/11/22	lun 28/11/22	100%
21	✓	ASFALTADO SOBRE LINEA DE 16"	33 días	lun 7/11/22	mié 28/12/22	100%
22	✓	IMPACTOS	151 días	vie 3/6/22	vie 30/12/22	100%
23	✓	CRUCES DE ALCANTARILLAS	60 días	vie 3/6/22	mar 4/10/22	100%
24	✓	CONECCION AL DEPOSITO EXISTENTES	10 días	mié 5/10/22	mar 18/10/22	100%
25	✓	DESAGUES EN LINEA DE 20" CON SU REGISTRO	10 días	mar 13/9/22	lun 26/9/22	100%
26	✓	COSTRUCION DE REGISTRO Y ADECUACION DEL AREAS DEL DEPOSITO	35 días	lun 14/11/22	vie 30/12/22	100%
27		YABONICO	761 días	lun 7/3/22	lun 3/2/25	93%
28		CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA	20 días	vie 25/11/22	mar 31/12/24	80%
29	✓	INSTALACION DE TUBERIAS DE PE DR9 4"	15 días	lun 12/12/22	mié 18/1/23	100%
30	✓	INSTALACION DE TUBERIA PVC SDR 26 /JG 4"	29 días	mar 30/8/22	vie 7/10/22	100%
31	✓	INSTALACION DE TUBERIA PVC SDR 26 /JG 3"	56 días	jue 22/9/22	jue 8/12/22	100%
32	✓	PRUEBA DE FUNCIONANMIENTO DE TUBERIA	5 días	lun 23/1/23	vie 27/1/23	100%
33	✓	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES	10 días	lun 2/1/23	vie 13/1/23	100%
34	✓	CONSTRUCCIONNDE REGISTRO Y VALVULAS DE AIRE	15 días	lun 2/1/23	vie 20/1/23	100%
35	✓	INSTALACION DE ACOMETIDAS RURALES	31 días	lun 19/12/22	lun 30/1/23	100%
36	✓	CERRAMIENTO DE DEPOSITOS EXISTENTES	[illegible] días	vie 20/1/23	lun 20/3/23	100%
37	✓	INSTALACION DE SISTEMA DE CLORADO	[illegible] días	jue 12/1/23	jue 12/1/23	100%
38		IMPREVISTOS	28 días	jue 26/12/24	lun 3/2/25	0%
39	✓	IMPACTOS	230 días	lun 7/3/22	vie 20/1/23	100%
40	✓	AUTORIZACION DE INICIO DE CONSTRUCCION POR INAPA	120 días	lun 7/3/22	vie 19/8/22	100%
41	✓	EVALUACION DIFERENCIA DE COTA EN OBRA DE TOMA QUE AFECTA A TUBERIA DE DR9 4"	5 días	vie 16/9/22	vie 28/10/22	100%
42	✓	EXCAVACION EN ROCA POR LA MONTAÑA PARA INSTALAR TUBERIA DE POLIETILENO	50 días	jue 3/11/22	mié 11/1/23	100%
43	✓	CRUCES DE RIO Y CRUCES DE PUESTE	15 días	lun 2/1/23	vie 20/1/23	100%
44		FIN DE YABONICO	0 días	lun 3/2/25	lun 3/2/25	0%

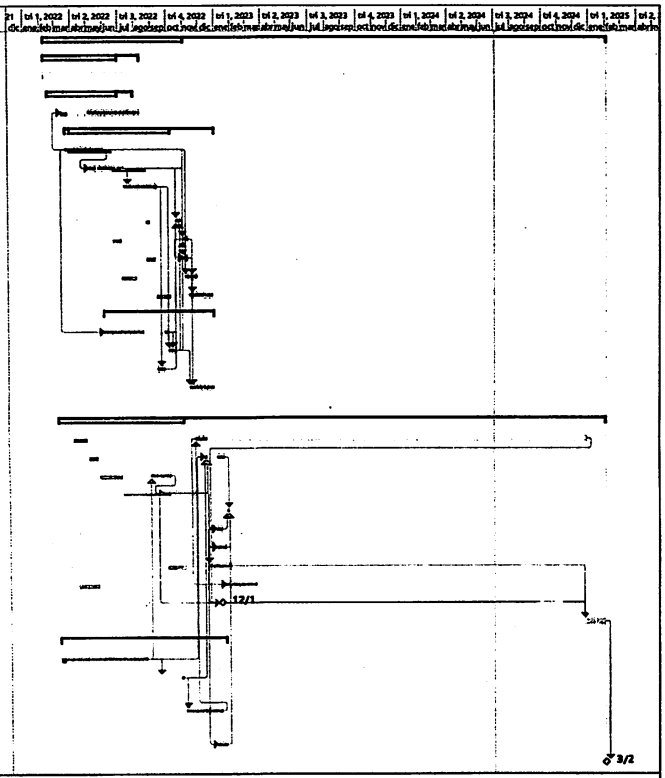

Proyecto: Cronograma Lote I y
Fecha: jue 4/7/24

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite		Hito de línea base	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Tareas críticas		Resumen de línea base	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		División crítica		Progreso	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo		Línea base		Progreso manual	
